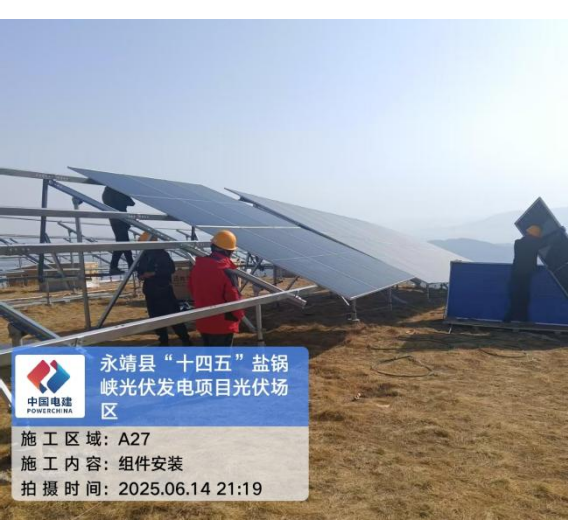


监 理 日 志

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 14 星期 六	气候	多云	气温	8-20℃
监理人员 动态: 6 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求	材料进场:				
施工方人员动态: 主要管理人员: 10 人, 施工人员: 236 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求。					
施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 2 台, 洒水车 1 台, 夯实机 1 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工: 光伏区: 1. A11-1 (585) 组件安装 5 组, A11-2 (585) 组件安装 5 组, A23 (580) 组件安装 5 组, A24 (580) 组件安装 5 组, A10 电缆沟开挖 800 米: 焊接地 36 组: 放线 40 组: 背拉筋 30 组, A30 — 2 组件加固, A34-2 回填电缆沟 2000 米, A30-4、5、6 安装背拉筋 40 组, 接地扁铁刷漆完成, 做逆变器电缆头 5 个, 做 MC4 插头 26 组, 回填电缆沟 500 米, A27 支架安装 5 组, A27 (585) 组件安装 9 组, A27 逆变器安装 2 台, A27 电缆敷设 200m, A37 电缆敷设 100m, A28 低压电缆沟开挖 200m, A24-1 围栏立柱浇筑 268 个。 二、汇集站工程及储能工程: 1. 消缺。 三、送出线路: 1. 消缺。 四、集电线路: 1. 消缺。 五、对策间隔: 消缺				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 光伏区组件、支架安装、电缆敷设、高低压电缆沟开挖监理人员巡视检查。 2. 汇集站、送出线路、集电线路消缺巡视检查。 3. 逆变器至箱变接线、电缆敷设; 箱变电缆防火封堵, 电缆刷防火涂料监理人员巡视检查。 4. 围栏施工巡视检查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	

 永靖县“十四五”光代 伏发电项目 施工区域: 36-1 施工内容: 放线, 接电, 埋电缆沟 拍摄时间: 2025.06.14 14:29 天气: 地点: 我在这里 海拔:	 永靖县“十四五”光伏 发电项目 施工区域: 光伏区A30-4 施工内容: 88号箱变防火封堵 拍摄时间: 2025.06.14 16:01 天气: 地点: 未授权位置 海拔:
箱变电缆防火封堵	电缆刷防火涂料
 永靖县“十四五”盐锅 峡光伏发电项目光伏场 区 施工区域: A27 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2025.06.14 21:19	 永靖县“十四五”盐锅 峡光伏发电项目光伏场 区 施工区域: A27 施工内容: 组件安装 拍摄时间: 2025.06.14 21:19
支架安装	组件安装
