

监 理 日 志

工程名称：甘肃浩博永靖 330kV 汇集站 4#主变扩建项目


日期	2025 年 07 月 15 星期 二	气候	晴	气温	15-33℃
监理人员 动态：5 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求			材料进场：		
施工方人员动态：主要管理人员:10 人, 施工人员:15 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求。					
施工机械动态：挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 2 台, 洒水车 1 台, 夯实机 1 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	今日施工： 1. 330kv 构架基础钢筋累计完成 100%；35kv4 # 主变基础开挖累计完成 100%；35kv 防火墙基础开挖累计完成 100%；35kv4 构架基础开挖累计完成 100%；防火墙基础垫层浇筑完成 100%；4#主变基础垫层浇筑完成 100%；4#主变构架基础垫层浇筑累计完成 100%；防火墙基础开挖累计完成 100%；4#主变基础开挖累计完成 100%；4#主变构架基础开挖累计完成 100%；110kv 构架基础开挖累计完成 70%；330kv 构架承台模板累计完成 80%；330kv 构架基础开挖累计完成 90%；330kv 构架基础垫层浇筑累计完成 80%；330kv 构架基础钢筋累计完成 70%。 2. 110kv 构架基础开挖完成 20%；330kv 构架承台模板完成 20%。				
监理今日工作内容	1. 梳理监理资料；查看施工现场图纸。 2. 110kv 构架基础开挖巡视检查旁站，灰土回填检查、基准点复测巡视。 3. 330kv 构架基础承台钢筋绑扎巡视检查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



330kv 构架基础承台钢筋、模板检查



330kv 构架基础承台钢筋、模板检查

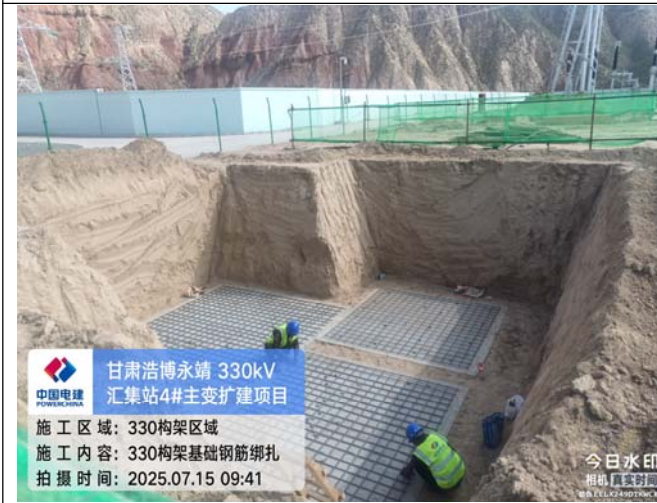

构架基础钢筋绑扎



110kv 构架基础基坑开挖



110kv 构架基础灰土回填
