

监理日报

项目名称		江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目							
建设单位		上饶申曜新能源科技有限公司			项目负责人		陈伟林		
承包单位		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			项目经理		高涛		
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监		张献兵	记录员	杨铃铃
填报日期		2024. 06. 30（星期日）		天气	阵雨 温度：26~35℃ 风力：3~4 级				
当日进度	人员安排		管理人员： 5 人；施工人员： 2 人；监理： 1 人						
	机械车辆		无						
	材料到货								
	施工进展		无						
	安全工作		防暑物资落实、材料区警示带、宣传牌、五牌一图安装						
明日计划	人员安排		管理人员： 5 人；施工人员： 11 人；						
	材料到货		预计防水卷材进场						
	安全工作		防坠网、防坠器未到场采购中						
	施工内容		无						
主要材料到货情况									
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家	
1	混凝土墩子	400*300mm	块	650	0	650	100%	安徽金地	
2	BIPV 主水槽	220*55*1.0	米	14697.08	0	3359.06	22.86%	安徽宇信	
3	支撑线槽	40*55*0.8	米	12813.34	0	3462.41	27.02%	安徽宇信	
4	副水槽	73*25*0.8	米	21568.186	0	3736	17.32%	安徽宇信	
5	一体化盖条	55*15*1.0	个	11758.097	0	3134.4	26.66%	安徽宇信	
6	拉钩	200*2.0	个	21199	0	4000	18.87%	安徽宇信	
7	几字型主水槽底座	380*50*50*5	个	10245	0	2388	23.31%	安徽宇信	
8	几字型支撑线槽底座	90*32*50*2.0	个	8937	0	1503	16.82%	安徽宇信	
9	常规支架	常规 0.428	MW	0.428	0	0.428	100%	安徽宇信	
10	直流电缆	1X4mm²	m		0				
11	组件	695w	块	8632	0	1287	14.9%	天合	
12	逆变器	300KW/196KW	台	15/2	0	0/2	11.7	华为	

监理日报

13	接地扁铁		m		0			
14	桥架	2102	m		0			
15	直流电缆	60000	m		0			
16	低压交流电 缆	3097	m		0			
17	高压交流电 缆	1905	m		0			
18	箱变		台		0			
19	一二次设备		套		0			
20								
工程建设施工进度情况								
序号	部位	工作内容	单位	总 工程量	当日 完成量	累计 累计量	完成 比率	
1	水泥屋面 (宿舍楼、 接待楼、办 公楼)	混凝土墩子安装	块	650	-	650	100%	
		支架安装	MW	0.42812	-	0.31124	72.7%	
		桥架安装	MW	0.42812				
		组件安装	块	616				
		直流电缆敷设	MW					
		逆变器安装	台	2				
		防雷接地	m					
		清洗洗系统安装	MW					
		交流电缆敷设	m	353				
2	闽海 1 分厂	支架安装	MW	3.24982				
		桥架安装	MW	3.24982				
		组件安装	块	4676				
		直流电缆敷设	MW					
		逆变器安装	台	8				
		防雷接地	m					
		清洗洗系统安装	MW					
		交流电缆敷设	m	1594				

监理日报

3	13#厂房	支架安装	MW	0.11398			
		桥架安装	MW	0.11398			
		组件安装	块	164			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	1			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	256			
4	15-16#厂房	支架安装	MW	1.31077			
		桥架安装	MW	1.31077			
		组件安装	块	1886			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	4			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	449			
5	17-18#厂房	支架安装	MW	0.89655			
		桥架安装	MW	0.89655			
		组件安装	块	1290			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	2			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	445			
6	箱变	箱变基础					
		箱变安装	台	3			
7	一二次设备	一二次设备基础					
		一二次设备安装	套	1			

监理日报

监理情况						
1、工程整体进度：						
工程总体进度完成量： 其主要分项工程完成量如下：						
序号	工作内容	单位	总工程量	累计完成量	完成比率	
1	混凝土墩子	块	650	650	100%	
2	支架	MW	5.999	0.31124	5.2%	
3	直流电缆	MW	5.999			
4	组件	块	8632	1287	14.9%	
5	逆变器	台	17	2	11.7%	
6	接地扁铁	MW	5.999			
7	桥架	MW	5.999			
8	交流电缆	m	3097			
9	箱变	台	3			
10	一二次设备	套	1			
11						
2、工程施工安全：防暑物资采购藿香正气丸、藿香正气水，药品、碘伏、纱布、棉签、绷带，材料区警示带、宣传牌、五牌一图安装。						
3、工程施工质量：常规檩条图纸设计及合同 2.0mm 实际 2.25mm，斜梁合同 2.5mm 图纸 2.0 实际 2.25mm，檩条连接件高度图纸 50mm 实际 35mm 厚度图纸 2.5mm 实际 2.26mm，底座立柱合同要求 2.5mm 图纸 2.0mm 实际 2.25mm。						
4、问题：						
施工报审类资料审查个别处错误整改中。						
5、其他：						
无						

监理日报

附一：施工过程及监督检查图片



BIPV 支架检查准备



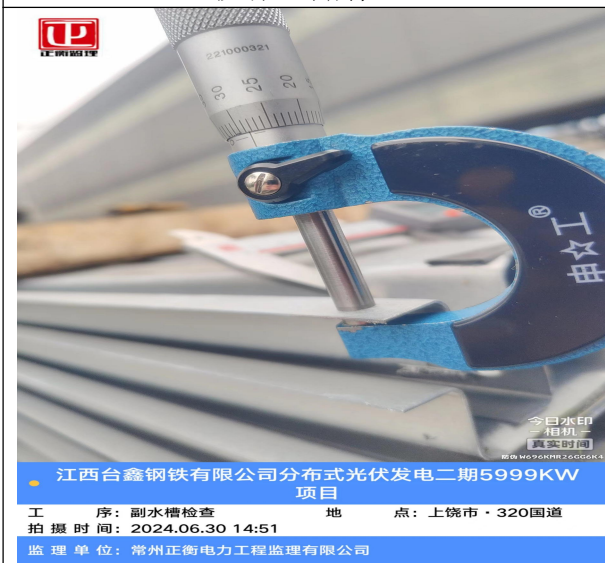
彩钢瓦厚度检查符合图纸设计



彩钢瓦涂层检查



副水槽高度检查

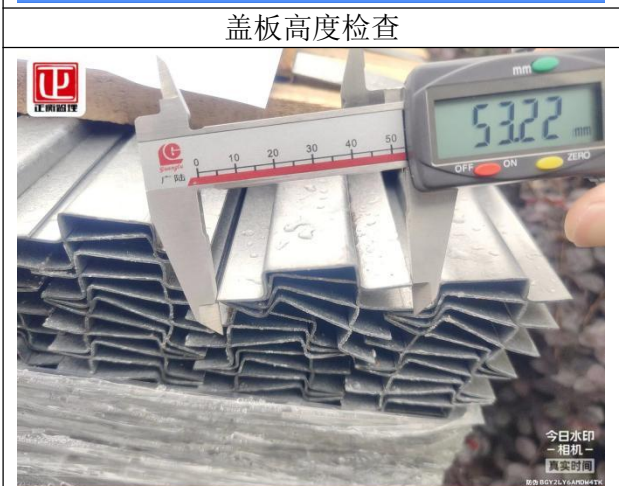


副水槽厚度检查



副水槽宽度检查

监理日报

 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：副水槽检查 拍 摄 时 间：2024.06.30 14:52 地 点：上饶市·320国道 监 理 单 位：常州正泰电力工程监理有限公司	 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：副水槽检查 拍 摄 时 间：2024.06.30 14:53 地 点：上饶市·320国道 监 理 单 位：常州正泰电力工程监理有限公司
副水槽涂层检查  江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：一体化盖板检查 拍 摄 时 间：2024.06.30 14:36 地 点：上饶市·320国道 监 理 单 位：常州正泰电力工程监理有限公司	副水槽长度检查  江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：一体化盖板检查 拍 摄 时 间：2024.06.30 14:37 地 点：上饶市·320国道 监 理 单 位：常州正泰电力工程监理有限公司
盖板高度检查  江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：一体化盖板检查 拍 摄 时 间：2024.06.30 14:36 地 点：上饶市·320国道 监 理 单 位：常州正泰电力工程监理有限公司	盖板厚度检查  江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：一体化盖板检查 拍 摄 时 间：2024.06.30 14:37 地 点：上饶市·320国道 监 理 单 位：常州正泰电力工程监理有限公司
盖板长度检查	盖板涂层检查

监理日报

  今日水印相机 真实时间 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：一体化盖板检查 地 点：上饶市·320国道 拍 摄 时 间：2024.06.30 14:39 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司	  今日水印相机 真实时间 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：拉勾检查 地 点：上饶市·320国道 拍 摄 时 间：2024.06.30 14:48 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司
盖板长度检查   今日水印相机 真实时间 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：拉勾检查 地 点：上饶市·320国道 拍 摄 时 间：2024.06.30 14:49 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司	拉钩厚度检查   今日水印相机 真实时间 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：拉勾检查 地 点：上饶市·320国道 拍 摄 时 间：2024.06.30 14:48 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司
拉钩涂层检查   今日水印相机 真实时间 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：支撑线槽 地 点：上饶市·320国道 拍 摄 时 间：2024.06.30 14:42 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司	拉钩长度检查   今日水印相机 真实时间 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：支撑线槽 地 点：上饶市·320国道 拍 摄 时 间：2024.06.30 14:42 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司
支撑线槽高度检查	支撑线槽厚度检查

监理日报



支撑线槽宽度检查

支撑线槽涂层检查



线槽支架高度检查

厚度检查



线槽支架涂层检查

支架长度检查

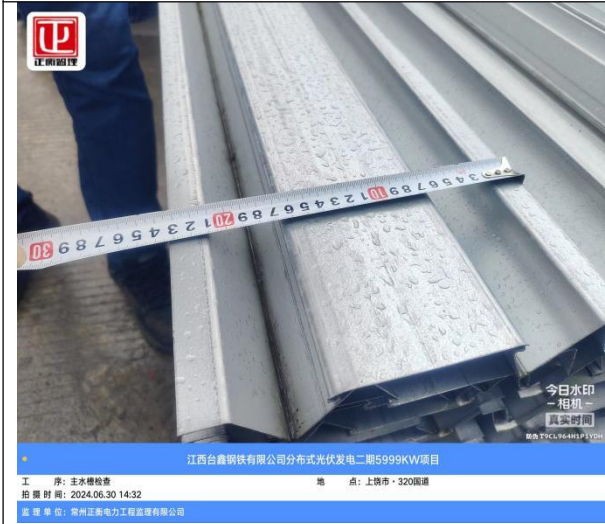
监理日报



主水槽高度检查



主水槽厚度检查



主水槽宽度检查



主水槽涂层检查



主水槽支架高度检查



厚度检查

监理日报



主水槽宽度检查



主水槽涂层检查



主水槽长度检查

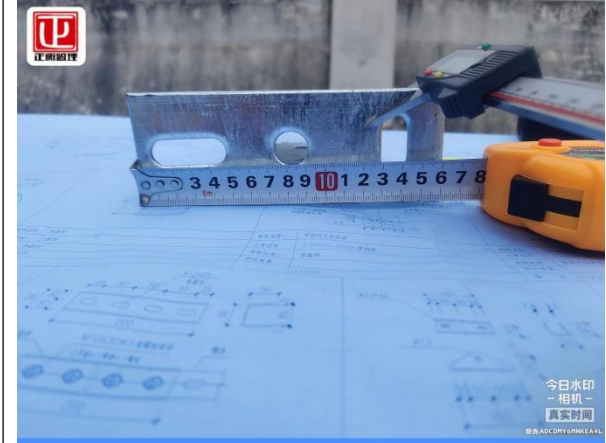


底座涂层检查

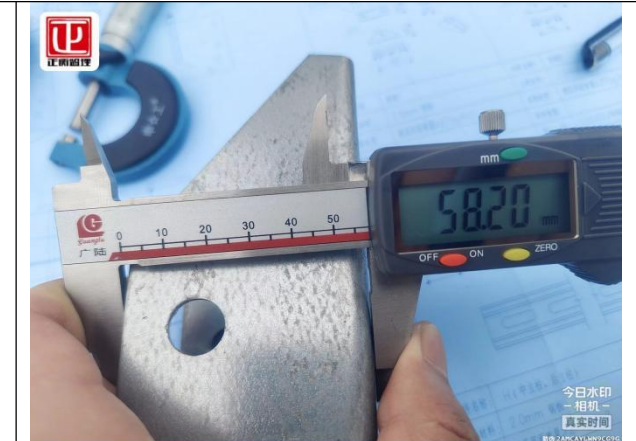



常规支架检查准备

监理日报

 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：常规底座检查 地 点：上饶市·工业大道 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:31 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司	 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：常规底座检查 地 点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:33 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司
底座厚度	底座宽度
 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：常规底座检查 地 点：上饶市·工业大道 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:31 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司	 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：斜梁检查 地 点：上饶市·工业大道 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:38 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司
底座长度	斜梁涂层检查
 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：斜梁检查 地 点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:35 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司	 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：斜梁检查 地 点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:34 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司
斜梁宽度检查	斜梁高度检查

监理日报

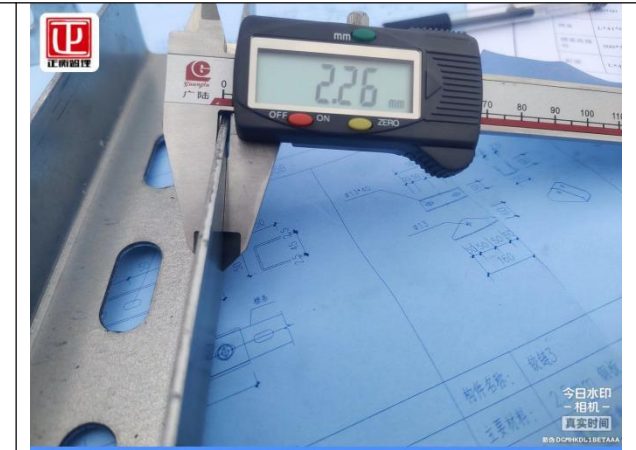
 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序: 铰链检查 拍 摄 时 间: 2024.06.30 15:41 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序: 铰链检查 拍 摄 时 间: 2024.06.30 15:41 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司
铰链长度检查  江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序: 铰链检查 拍 摄 时 间: 2024.06.30 15:41 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	铰链高度检查  江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序: 铰链检查 拍 摄 时 间: 2024.06.30 15:42 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司
铰链宽度检查  江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序: 铰链检查 拍 摄 时 间: 2024.06.30 15:42 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	铰链厚度检查  江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序: 铰链检查 拍 摄 时 间: 2024.06.30 15:42 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司
铰链涂层检查	

监理日报

 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：檩条连接件 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:43 地 点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司	 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：檩条连接件 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:46 地 点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司
连接件宽度检查	连接件涂层检查
 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：檩条检查 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:48 地 点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司	 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：檩条检查 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:48 地 点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司
檩条高度检查	檩条厚度高图纸及合同
 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：檩条检查 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:47 地 点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司	 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：檩条检查 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:49 地 点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司
檩条宽度检查	檩条涂层检查

附二：存在问题图片

监理日报

 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：檩条连接件 地 点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:44 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司	 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：檩条连接件 地 点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:45 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司
连接件高度与图偏差 15mm	连接件厚度图 2.5mm 偏差 0.24mm
 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：斜梁检查 地 点：上饶市·工业大道 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:36 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司	 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序：常规底座检查 地 点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司 拍 摄 时 间：2024.06.30 15:33 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司
斜梁合同 2.5mm 图纸 2.0mm 实际 2.28mm	底座立柱图 2.0mm 实际 2.25 合同 2.5mm
