

监理日报

项目名称	江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目									
建设单位	上饶申曜新能源科技有限公司				项目负责人	陈伟林				
承包单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司				项目经理	高涛				
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司				项目总监	张献兵	项目总代	杨铃铃	记录员	苏航
填报日期	2024. 07. 13（星期六）			天气	阴 温度：26~36℃ 风力：1~2 级					
当日进度	人员安排		管理人员： 0 人； 施工人员： 0 人； 监理： 2 人							
	机械车辆		无							
	材料到货		无							
	施工进展		现场暂无人施工							
	安全工作		现场安全巡视。							
明日计划	人员安排		管理人员： 0 人； 施工人员： 0 人；							
	材料到货									
	安全工作									
	施工内容		无							
主要材料到货情况										
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家		
1	混凝土墩子	400*300mm	块	650	0	650	100%	安徽金地		
2	BIPV 主水槽	220*55*1.0	米	14697.08	0	3359.06	22.86%	安徽宇信		
3	支撑线槽	40*55*0.8	米	12813.34	0	3462.41	27.02%	安徽宇信		
4	副水槽	73*25*0.8	米	21568.186	0	3736	17.32%	安徽宇信		
5	一体化盖条	55*15*1.0	个	11758.097	0	3134.4	26.66%	安徽宇信		
6	拉钩	200*2.0	个	21199	0	4000	18.87%	安徽宇信		
7	几字型主水槽底座	380*50*50*5	个	10245	0	2388	23.31%	安徽宇信		
8	几字型支撑线槽底座	90*32*50*2.0	个	8937	0	1503	16.82%	安徽宇信		
9	常规支架	常规 0.428	MW	0.428	0	0.428	100%	安徽宇信		

监理日报

10	直流电缆	1X4mm ²	m		0			
11	组件	695w	块	8632	0	1287	14.9%	天合
12	逆变器	300KW/196KW	台	15/2	0	0/2	11.7	华为
13	接地扁铁		m		0			
14	桥架	100*50、150*100、200*100、300*100	m	2356	2081	2081	88.33	安徽钢毅
15	直流电缆	60000	m		0			
16	低压交流电缆	3097	m		0			
17	高压交流电缆	1905	m		0			
18	箱变		台		0			
19	一二次设备		套		0			
20								

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计累计量	完成比率
1	水泥屋面（宿舍楼、接待楼、办公楼）	混凝土墩子安装	块	650	-	650	100%
		支架安装	MW	0.42812	-	0.42812	100%
		桥架安装	MW	0.42812			
		组件安装	块	616			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	2			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	353			
		监控系统	台	5			
2	闽海1分厂	支架安装	MW	3.24982			
		桥架安装	MW	3.24982			
		组件安装	块	4676			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	8			
		防雷接地	m				

监理日报

		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	1594			
		监控系统	台	2			
3	13#厂房	支架安装	MW	0.11398			
		桥架安装	MW	0.11398			
		组件安装	块	164			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	1			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	256			
		监控系统	台	1			
		檩条	条	48			
		檩条连接件	个	43			
		隅撑	个	137			
4	15-16#厂房	支架安装	MW	1.31077			
		桥架安装	MW	1.31077			
		组件安装	块	1886			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	4			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	449			
		监控系统	台	2			
		加固檩条	条	480			
		加固隅撑	个	484			
5	17-18#厂房	支架安装	MW	0.89655			
		桥架安装	MW	0.89655			
		组件安装	块	1290			
		直流电缆敷设	MW				

监理日报

		逆变器安装	台	2			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	445			
		监控系统	台	2			
		加固檩条	条	432			
6	箱变	箱变基础					
		箱变安装	台	3			
7	一二次设备	一二次设备基础					
		一二次设备安装	套	1			

监理情况

1、工程整体进度：

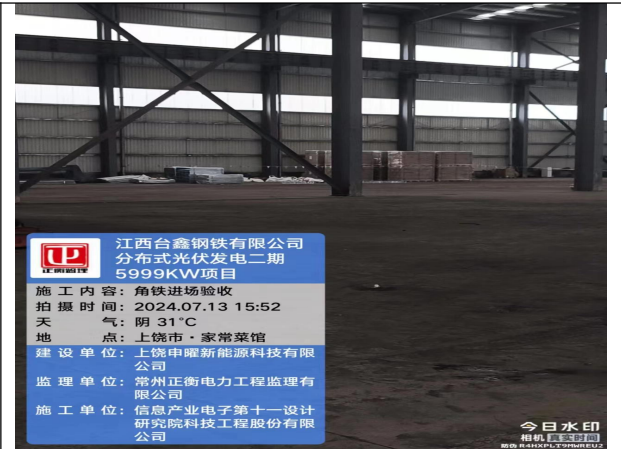
工程总体进度完成量： 其主要分项工程完成量如下：

序号	工作内容	单位	总工程量	累计完成量	完成比率
1	混凝土墩子	块	650	650	100%
2	支架	MW	5.999	0.42812	7.1%
3	直流电缆	MW	5.999		
4	组件	块	8632		
5	逆变器	台	17		
6	接地扁铁	MW	5.999		
7	桥架	MW	5.999		
8	交流电缆	m	3097		
9	箱变	台	3		
10	一二次设备	套	1		
11					

监理日报

2、工程施工安全：现场无人施工，加固车间临时用电已关，施工现场已做好安全防护警示带围挡。
3、工程施工质量：现场巡视，加固车未动，材料摆放整齐，现场暂时停工。
4、问题：
5、其他：

附一：施工过程及监督检查图片

	
现场巡视	现场巡视

附一：存在的问题照片

无	
