

监理日报

|          |           |                               |                           |           |       |                      |        |      |     |     |    |
|----------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------|----------------------|--------|------|-----|-----|----|
| 项目名称     |           | 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 |                           |           |       |                      |        |      |     |     |    |
| 建设单位     |           | 上饶申曜新能源科技有限公司                 |                           |           |       | 项目负责人                | 陈伟林    |      |     |     |    |
| 承包单位     |           | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司      |                           |           |       | 项目经理                 | 高涛     |      |     |     |    |
| 监理单位     |           | 常州正衡电力工程监理有限公司                |                           |           |       | 项目总监                 | 张献兵    | 项目总代 | 杨铃铃 | 记录员 | 苏航 |
| 填报日期     |           | 2024. 07. 19（星期五）             |                           |           | 天气    | 晴 温度：28~38℃ 风力：1~2 级 |        |      |     |     |    |
| 当日进度     | 人员安排      |                               | 管理人员：3 人；施工人员：12 人；监理：2 人 |           |       |                      |        |      |     |     |    |
|          | 机械车辆      |                               | 无                         |           |       |                      |        |      |     |     |    |
|          | 材料到货      |                               | 无                         |           |       |                      |        |      |     |     |    |
|          | 施工进展      |                               | 水泥屋面支架安装。                 |           |       |                      |        |      |     |     |    |
|          | 安全工作      |                               | 现场安全巡视。                   |           |       |                      |        |      |     |     |    |
| 明日计划     | 人员安排      |                               | 管理人员：3 人；施工人员：12 人；       |           |       |                      |        |      |     |     |    |
|          | 材料到货      |                               | BIPV 支架预计明天到货两车           |           |       |                      |        |      |     |     |    |
|          | 安全工作      |                               |                           |           |       |                      |        |      |     |     |    |
|          | 施工内容      |                               | 混凝土屋面支架安装、混凝土屋面支架验收       |           |       |                      |        |      |     |     |    |
| 主要材料到货情况 |           |                               |                           |           |       |                      |        |      |     |     |    |
| 序号       | 材料/设备名称   | 型号                            | 单位                        | 总数量       | 当日到货量 | 累计到货量                | 累计到货率  | 厂家   |     |     |    |
| 1        | 混凝土墩子     | 400*300mm                     | 块                         | 650       | 0     | 650                  | 100%   | 安徽金地 |     |     |    |
| 2        | BIPV 主水槽  | 220*55*1.0                    | 米                         | 14697.08  | 0     | 3359.06              | 22.86% | 安徽宇信 |     |     |    |
| 3        | 支撑线槽      | 40*55*0.8                     | 米                         | 12813.34  | 0     | 3462.41              | 27.02% | 安徽宇信 |     |     |    |
| 4        | 副水槽       | 73*25*0.8                     | 米                         | 21568.186 | 0     | 3736                 | 17.32% | 安徽宇信 |     |     |    |
| 5        | 一体化盖条     | 55*15*1.0                     | 个                         | 11758.097 | 0     | 3134.4               | 26.66% | 安徽宇信 |     |     |    |
| 6        | 拉钩        | 200*2.0                       | 个                         | 21199     | 0     | 4000                 | 18.87% | 安徽宇信 |     |     |    |
| 7        | 几字型主水槽底座  | 380*50*50*5                   | 个                         | 10245     | 0     | 2388                 | 23.31% | 安徽宇信 |     |     |    |
| 8        | 几字型支撑线槽底座 | 90*32*50*2.0                  | 个                         | 8937      | 0     | 1503                 | 16.82% | 安徽宇信 |     |     |    |
| 9        | 常规支架      | 常规 0.428                      | MW                        | 0.428     | 0     | 0.428                | 100%   | 安徽宇信 |     |     |    |

# 监理日报

|    |        |                                |   |       |       |       |       |      |
|----|--------|--------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|------|
| 10 | 直流电缆   | 1X4mm <sup>2</sup>             | m |       | 0     |       |       |      |
| 11 | 组件     | 695w                           | 块 | 8632  | 0     | 1287  | 14.9% | 天合   |
| 12 | 逆变器    | 300KW/196KW                    | 台 | 15/2  | 0     | 0/2   | 12    | 华为   |
| 13 | 接地扁铁   |                                | m |       | 0     |       |       |      |
| 14 | 桥架     | 100*50、150*100、200*100、300*100 | m | 2356  | 2081  | 2081  | 88.33 | 安徽钢毅 |
| 15 | 直流电缆   | 1*4                            | m | 60000 | 60000 | 60000 | 100   | 江苏上上 |
| 16 | 低压交流电缆 | 3*95                           | m | 3097  | 3097  | 3097  | 100   | 江苏上上 |
| 17 | 高压交流电缆 | 3*185                          | m | 1905  | 1140  | 1140  | 59.84 | 江苏上上 |
| 18 | 箱变     |                                | 台 |       | 0     |       |       |      |
| 19 | 一二次设备  |                                | 套 |       | 0     |       |       |      |
| 20 |        |                                |   |       |       |       |       |      |

## 工程建设施工进度情况

| 序号 | 部位                | 工作内容    | 单位 | 总工程量    | 当日完成量    | 累计累计量    | 完成比率 |
|----|-------------------|---------|----|---------|----------|----------|------|
| 1  | 水泥屋面（宿舍楼、接待楼、办公楼） | 混凝土墩子安装 | 块  | 650     | -        | 650      | 100% |
|    |                   | 支架安装    | MW | 0.42812 | 0.171248 | 0.342496 | 80%  |
|    |                   | 桥架安装    | MW | 0.42812 |          |          |      |
|    |                   | 组件安装    | 块  | 616     |          |          |      |
|    |                   | 直流电缆敷设  | MW |         |          |          |      |
|    |                   | 逆变器安装   | 台  | 2       |          |          |      |
|    |                   | 防雷接地    | m  |         |          |          |      |
|    |                   | 清洗洗系统安装 | MW |         |          |          |      |
|    |                   | 交流电缆敷设  | m  | 353     |          |          |      |
|    |                   | 监控系统    | 台  | 5       |          |          |      |
|    |                   |         |    |         |          |          |      |
| 2  | 闽海1分厂             | 支架安装    | MW | 3.24982 |          |          |      |
|    |                   | 桥架安装    | MW | 3.24982 |          |          |      |
|    |                   | 组件安装    | 块  | 4676    |          |          |      |
|    |                   | 直流电缆敷设  | MW |         |          |          |      |
|    |                   | 逆变器安装   | 台  | 8       |          |          |      |

# 监理日报

|   |          |         |    |         |  |  |  |
|---|----------|---------|----|---------|--|--|--|
|   |          | 防雷接地    | m  |         |  |  |  |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |  |  |  |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 1594    |  |  |  |
|   |          | 监控系统    | 台  | 2       |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 3 | 13#厂房    | 支架安装    | MW | 0.11398 |  |  |  |
|   |          | 桥架安装    | MW | 0.11398 |  |  |  |
|   |          | 组件安装    | 块  | 164     |  |  |  |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW |         |  |  |  |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 1       |  |  |  |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |  |  |  |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |  |  |  |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 256     |  |  |  |
|   |          | 监控系统    | 台  | 1       |  |  |  |
|   |          | 檩条      | 条  | 48      |  |  |  |
|   |          | 檩条连接件   | 个  | 43      |  |  |  |
|   |          | 隅撑      | 个  | 137     |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 4 | 15-16#厂房 | 支架安装    | MW | 1.31077 |  |  |  |
|   |          | 桥架安装    | MW | 1.31077 |  |  |  |
|   |          | 组件安装    | 块  | 1886    |  |  |  |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW |         |  |  |  |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 4       |  |  |  |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |  |  |  |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |  |  |  |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 449     |  |  |  |
|   |          | 监控系统    | 台  | 2       |  |  |  |
|   |          | 加固檩条    | 条  | 480     |  |  |  |
|   |          | 加固隅撑    | 个  | 484     |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 5 | 17-18#厂房 | 支架安装    | MW | 0.89655 |  |  |  |
|   |          | 桥架安装    | MW | 0.89655 |  |  |  |
|   |          | 组件安装    | 块  | 1290    |  |  |  |

监理日报

|   |       |         |    |     |  |  |  |
|---|-------|---------|----|-----|--|--|--|
|   |       | 直流电缆敷设  | MW |     |  |  |  |
|   |       | 逆变器安装   | 台  | 2   |  |  |  |
|   |       | 防雷接地    | m  |     |  |  |  |
|   |       | 清洗洗系统安装 | MW |     |  |  |  |
|   |       | 交流电缆敷设  | m  | 445 |  |  |  |
|   |       | 监控系统    | 台  | 2   |  |  |  |
|   |       | 加固標条    | 条  | 432 |  |  |  |
|   |       |         |    |     |  |  |  |
|   |       |         |    |     |  |  |  |
|   |       |         |    |     |  |  |  |
| 6 | 箱变    | 箱变基础    |    |     |  |  |  |
|   |       | 箱变安装    | 台  | 3   |  |  |  |
|   |       |         |    |     |  |  |  |
| 7 | 一二次设备 | 一二次设备基础 |    |     |  |  |  |
|   |       | 一二次设备安装 | 套  | 1   |  |  |  |
|   |       |         |    |     |  |  |  |
|   |       |         |    |     |  |  |  |

监理情况

1、工程整体进度：

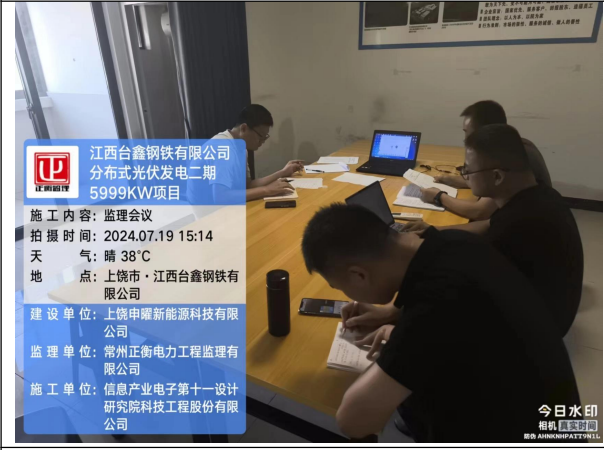
工程总体进度完成量：
 其主要分项工程完成量如下：

| 序号 | 工作内容  | 单位 | 总工程量  | 累计完成量   | 完成比率 |
|----|-------|----|-------|---------|------|
| 1  | 混凝土墩子 | 块  | 650   | 650     | 100% |
| 2  | 支架    | MW | 5.999 | 0.42812 | 7.1% |
| 3  | 直流电缆  | MW | 5.999 |         |      |
| 4  | 组件    | 块  | 8632  |         |      |
| 5  | 逆变器   | 台  | 17    |         |      |
| 6  | 接地扁铁  | MW | 5.999 |         |      |
| 7  | 桥架    | MW | 5.999 |         |      |
| 8  | 交流电缆  | m  | 3097  |         |      |
| 9  | 箱变    | 台  | 3     |         |      |
| 10 | 一二次设备 | 套  | 1     |         |      |
| 11 |       |    |       |         |      |
|    |       |    |       |         |      |
|    |       |    |       |         |      |

# 监理日报

- 2、工程施工安全：巡视现场支架安装，施工人员安全措施已到位。
- 3、工程施工质量：现场巡视检查，昨日所发现问题螺栓平垫弹垫已全部整改。
- 4、问题：
- 5、其他：召开监理例会形成会议纪要上传至系统。

## 附一：施工过程及监督检查图片

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| 支架安装现场巡视                                                                            | 支架安装                                                                                 |
|  |  |
| 监理例会                                                                                | 支架安装现场巡视                                                                             |
|                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                     |                                                                                      |

## 附一：存在的问题照片

|   |  |
|---|--|
| 无 |  |
|   |  |
