

监理日报

项目名称		江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目								
建设单位		上饶申曜新能源科技有限公司			项目负责人	陈伟林				
承包单位		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			项目经理	高涛				
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	项目总代	杨铃铃	记录员	苏航
填报日期		2024. 07. 24（星期三）		天气	晴 温度：28~39℃ 风力：3~4 级					
当日进度	人员安排		管理人员：4人；施工人员：12人；监理：2人							
	机械车辆		无							
	材料到货		无							
	施工进展		水泥屋面组件安装。水泥屋面组件散料。现场 BIPV 材料清点加固设计、建设单位确认荷载报告、支架计算书等内容。							
	安全工作		现场安全巡视。							
明日计划	人员安排		管理人员：4人；施工人员：12人；							
	材料到货		预计明日逆变器到货							
	安全工作									
	施工内容		1. 混凝土屋面组件安装。 2. 设计现场勘察 17-18#屋面情况。 3. 物流中心楼、办公楼支架验收。 4. 跟踪加固单位人员进场、爬梯等材料进场。							
主要材料到货情况										
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家		
1	混凝土墩子	400*300mm	块	650	0	650	100%	安徽金地		
2	BIPV 主水槽	220*55*1.0	米	14697.08	11338.02	14697.08	100%	安徽宇信		
3	支撑线槽	40*55*0.8	米	12813.34	8377.83	11840.24	92.41%	安徽宇信		
4	副水槽	73*25*0.8	米	21568.186	1770.842	21506.842	99.72%	安徽宇信		
5	一体化盖条	55*15*1.0	个	11758.097	5997.534	9131.934	77.67%	安徽宇信		
6	拉钩	200*2.0	个	21199	13376	17376	81.97%	安徽宇信		
7	几字型主水	380*50*50*5	个	10245	6090	8478	82.7	安徽宇信		

监理日报

	槽底座						5%	
8	几字型支撑线槽底座	90*32*50*2.0	个	8937	7478	8981	100.49%	安徽宇信
9	常规支架	常规 0.428	MW	0.428	0	0.428	100%	安徽宇信
10	直流电缆	1X4mm ²	m		0			
11	组件	695w	块	8632	0	1287	14.9%	天合
12	逆变器	300KW/196KW	台	15/2	0	0/2	12	华为
13	接地扁铁		m		0			
14	桥架	100*50、150*100、200*100、300*100	m	2356	2081	2081	88.33	安徽钢毅
15	直流电缆	1*4	m	60000	60000	60000	100	江苏上上
16	低压交流电缆	3*95	m	3097	3097	3097	100	江苏上上
17	高压交流电缆	3*185	m	1905	1140	1140	59.84	江苏上上
18	箱变		台		0			
19	一二次设备		套		0			
20								

工程建设施工进展情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计累计量	完成率
1	水泥屋面（宿舍楼、接待楼、办公楼）	混凝土墩子安装	块	650	-	650	100%
		支架安装	MW	0.42812	-	0.42812	100%
		桥架安装	MW	0.42812			
		组件安装	块	616	280	280	45.45
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	2			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	353			
		监控系统	台	5			
2	闽海1分厂	支架安装	MW	3.24982			
		桥架安装	MW	3.24982			
		组件安装	块	4676			

监理日报

		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	8			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	1594			
		监控系统	台	2			
3	13#厂房	支架安装	MW	0.11398			
		桥架安装	MW	0.11398			
		组件安装	块	164			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	1			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	256			
		监控系统	台	1			
		檩条	条	48			
		檩条连接件	个	43			
		隅撑	个	137			
4	15-16#厂房	支架安装	MW	1.31077			
		桥架安装	MW	1.31077			
		组件安装	块	1886			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	4			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	449			
		监控系统	台	2			
		加固檩条	条	480			
		加固隅撑	个	484			
5	17-18#厂房	支架安装	MW	0.89655			

监理日报

		桥架安装	MW	0.89655			
		组件安装	块	1290			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	2			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	445			
		监控系统	台	2			
		加固檩条	条	432			
6	箱变	箱变基础					
		箱变安装	台	3			
7	一二次设备	一二次设备基础					
		一二次设备安装	套	1			

监理情况

1、工程整体进度：

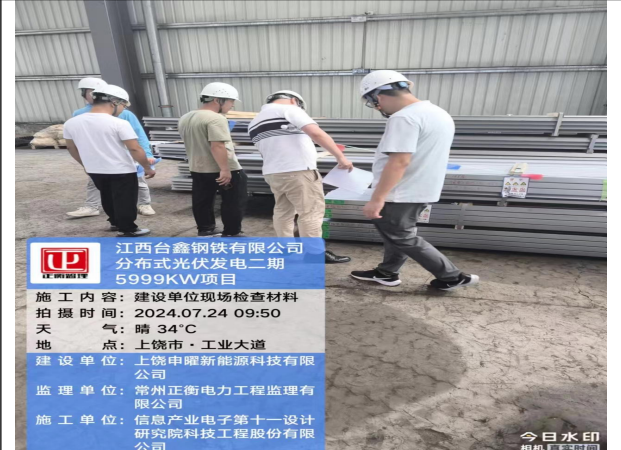
工程总体进度完成量： 其主要分项工程完成量如下：

序号	工作内容	单位	总工程量	累计完成量	完成比率
1	混凝土墩子	块	650	650	100%
2	支架	MW	5.999	0.42812	7.1%
3	直流电缆	MW	5.999		
4	组件	块	8632		
5	逆变器	台	17		
6	接地扁铁	MW	5.999		
7	桥架	MW	5.999		
8	交流电缆	m	3097		
9	箱变	台	3		
10	一二次设备	套	1		
11					

监理日报

1、工程施工安全：施工人员调整作业时间，防暑降温药品已备，施工人员安全措施已到位。					
2、工程施工质量：业主现场巡查					
3、问题：防水卷材安装不到位、支架切口处出现生锈、水泥墩蜂窝麻面较多、垃圾及时清理。					
4、其他：参加加固设计、建设单位确认荷载报告、支架计算书等内容。					

附一：施工过程及监督检查图片

	
业主现场检查材料	业主现场检查屋面安装情况
	
业主现场检查屋面安装情况	业主现场检查材料

附一：存在的问题照片

无	
