

监理日报

项目名称		江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目									
建设单位		上饶申曜新能源科技有限公司				项目负责人	陈伟林				
承包单位		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司				项目经理	高涛				
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司				项目总监	张献兵	项目总代	杨铃铃	记录员	苏航
填报日期		2024.08.05（星期一）			天气	晴转雨温度：28~40℃ 风力：1~2 级					
当日进度	人员安排		管理人员：4人；施工人员：16人；监理：2人								
	机械车辆		吊车一台，叉车一台。两台登高直臂车								
	材料到货										
	施工进展		1. 闽海一分厂，吊装 BIPV 材料，分散支架材料，主水槽、支撑线槽固定安装。 2. 加固单位进行连接件焊接、刷漆。 3. 办理预交税款。 4. 走道板试安装。								
	安全工作		现场安全巡视。								
明日计划	人员安排		管理人员：4人；施工人员：16人；								
	材料到货										
	安全工作										
	施工内容		1. 加固单位对檩条连接件、隅撑连接件进行加工作业。 2. 闽海一分厂，固定底座 主水槽、支撑线槽安装。 3. 爬梯现场进行焊接制作。 4. 组件试安装。								
主要材料到货情况											
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家	验收情况		
1	混凝土墩子	400*300mm	块	650	0	650	100%	安徽金地	已验收		
2	BIPV 主水槽	220*55*1.0	米	14697.08	11338.02	14697.08	100%	安徽宇信	已验收		
3	支撑线槽	40*55*0.8	米	12813.34	8377.83	11840.24	92.41%	安徽宇信	已验收		
4	副水槽	73*25*0.8	米	21568.186	1770.842	21506.842	99.72%	安徽宇信	已验收		
5	一体化盖条	55*15*1.0	个	11758.097	5997.534	9131.934	77.67%	安徽宇信	已验收		

监理日报

6	拉钩	200*2.0	个	21199	13376	17376	81.97%	安徽宇信	已验收
7	几字型主水槽底座	380*50*50*5	个	10245	6090	8478	82.75%	安徽宇信	已验收
8	几字型支撑线槽底座	90*32*50*2.0	个	8937	7478	8981	100.49%	安徽宇信	已验收
9	常规支架	常规 0.428	MW	0.428	0	0.428	100%	安徽宇信	已验收
10	直流电缆	1X4mm²	m		0				已验收
11	组件	695w	块	8632	0	1287	14.9%	天合	已验收
12	逆变器	300KW/196KW	台	17	15	15/2	100%	华为	未验收
13	接地扁铁		m		0				已验收
14	桥架	100*50、 150*100、 200*100、 300*100	m	2356	2081	2081	88.33	安徽钢毅	已验收
15	直流电缆	1*4	m	60000	60000	60000	100	江苏上上	已验收
16	低压交流电缆	3*95	m	3097	3097	3097	100	江苏上上	已验收
17	高压交流电缆	3*185	m	1905	1140	1140	59.84	江苏上上	已验收
18	箱变		台		0				
19	一二次设备		套		0				
20									

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计累计量	完成比率
1	水泥屋面（宿舍楼、接待楼、办公楼）	混凝土墩子安装	块	650	-	650	100%
		支架安装	MW	0.42812	-	0.42812	100%
		桥架安装	MW	0.42812			
		组件安装	块	616		490	80%
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	2			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	353			
		监控系统	台	5			

监理日报

2	闵海 1 分厂	支架安装	MW	3.24982			
		桥架安装	MW	3.24982			
		组件安装	块	4676			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	8			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	1594			
		监控系统	台	2			
3	13#厂房	支架安装	MW	0.11398			
		桥架安装	MW	0.11398			
		组件安装	块	164			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	1			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	256			
		监控系统	台	1			
		檩条	条	48			
		檩条连接件	个	43			
		隅撑	个	137			
4	15-16#厂房	支架安装	MW	1.31077			
		桥架安装	MW	1.31077			
		组件安装	块	1886			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	4			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	449			
		监控系统	台	2			

监理日报

		加固檩条	条	480			
		加固隅撑	个	484			
5	17-18#厂房	支架安装	MW	0.89655			
		桥架安装	MW	0.89655			
		组件安装	块	1290			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	2			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	445			
		监控系统	台	2			
		加固檩条	条	432			
6	箱变	箱变基础					
		箱变安装	台	3			
7	一二次设备	一二次设备基础					
		一二次设备安装	套	1			

监理情况

1、工程整体进度：

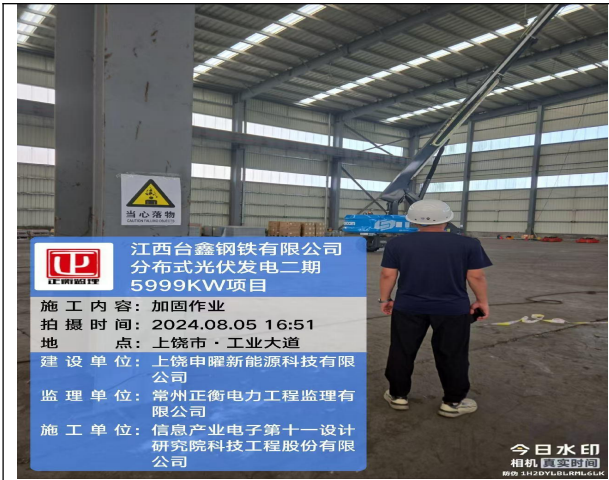
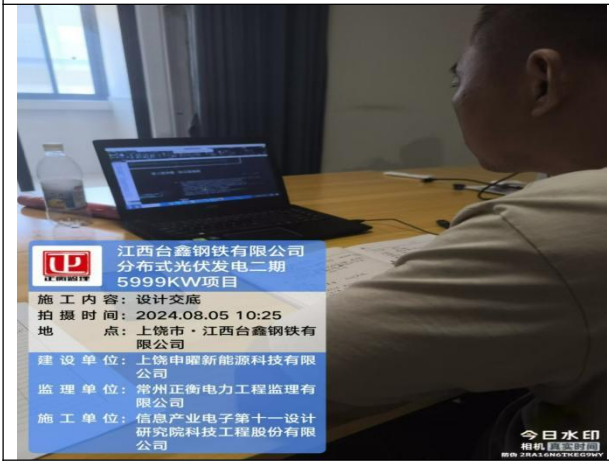
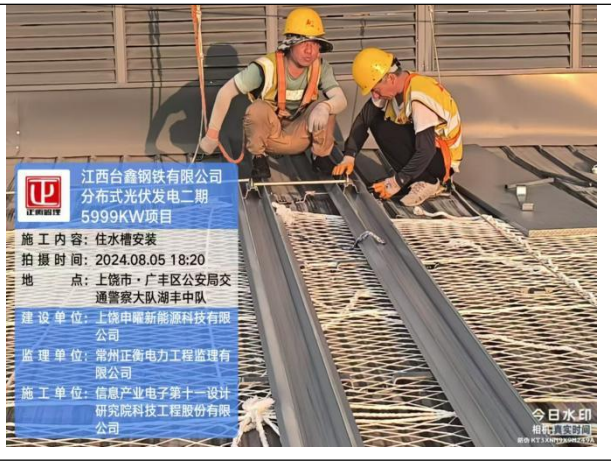
工程总体进度完成量： 其主要分项工程完成量如下：

序号	工作内容	单位	总工程量	累计完成量	完成比率
1	混凝土墩子	块	650	650	100%
2	支架	MW	5.999	0.42812	7.1%
3	直流电缆	MW	5.999		
4	组件	块	8632	490	5.7%
5	逆变器	台	17		
6	接地扁铁	MW	5.999		
7	桥架	MW	5.999		

监理日报

8	交流电缆	m	3097		
9	箱变	台	3		
10	一二次设备	套	1		
11					
1、工程施工安全：闽海一分厂上施工人员安全带已穿，安全措施已到位。加固单位已做好安全防护措施，穿戴安全带，作业区域已做好围挡。					
2、工程施工质量：巡视闽海一分厂，加固单位进行檩条连接件、隅撑连接件加固作业。闽海一分厂材料吊装，检查闽海一分厂几字支撑、主水槽安装，分散支架材料。					
3、问题：					
4、其他：参加图纸设计交底。					

附一：施工过程及监督检查图片

 江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容：加固作业 拍摄时间：2024.08.05 16:51 地点：上饶市·工业大道 建设单位：上饶申曜新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 今日水印 相机 真实时间 808 2120YSLRLRLSLK	 江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容：主水槽安装 拍摄时间：2024.08.05 08:25 地点：上饶市·320国道 建设单位：上饶申曜新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 今日水印 相机 真实时间 808 2120YSLRLRLSLK
加固施工巡视	主水槽安装
 江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容：设计交底 拍摄时间：2024.08.05 10:25 地点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司 建设单位：上饶申曜新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 今日水印 相机 真实时间 808 2120YSLRLRLSLK	 江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容：住水槽安装 拍摄时间：2024.08.05 18:20 地点：上饶市·广丰区公安局交通警察大队湖丰中队 建设单位：上饶申曜新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 今日水印 相机 真实时间 808 2120YSLRLRLSLK
参加设计交底	一分厂现场检查

