

监理日报

项目名称		江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目									
建设单位		上饶申曜新能源科技有限公司				项目负 责人	陈伟林				
承包单位		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司				项目经 理	高涛				
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司				项目总 监	张献兵	项目 总代	杨铃铃	记 录 员	苏航
填报日期		2024.08.06（星期二）			天气	晴转雨温度：28~40℃ 风力：1~2 级					
当日 进度	人员安排		管理人员：4人；施工人员：16人；监理：2人								
	机械车辆		吊车一台， 叉车一台。两台登高直臂车								
	材料到货										
	施工进展		1. 闽海一分厂，分散支架材料，主水槽、支撑线槽固定安装。 2. 加固单位进行 17-18 厂房连接件焊接、刷漆。 3. 爬梯现场进行焊接制作。 4. 组件试安装。 5. 水泥屋面张贴安全标识标 牌								
	安全工作		现场安全巡视。								
明日 计划	人员安排		管理人员：4人；施工人员：16人；								
	材料到货										
	安全工作										
	施工内容		1. 加固单位对檩条连接件、隅撑连接件进行加工作业。 2. 闽海一分厂，固定底座 主水槽、支撑线槽安装。 3. 爬梯现场进行焊 接安装。								
主要材料到货情况											
序 号	材料/设备 名称	型号	单 位	总 数量	当日 到货量	累计 到货量	累计 到货 率	厂家	验收情 况		
1	混凝土墩子	400*300mm	块	650	0	650	100%	安徽金地	已验收		
2	BIPV 主水槽	220*55*1.0	米	14697.08	11338.02	14697.08	100%	安徽宇信	已验收		
3	支撑线槽	40*55*0.8	米	12813.34	8377.83	11840.24	92.41%	安徽宇信	已验收		
4	副水槽	73*25*0.8	米	21568.186	1770.842	21506.842	99.72%	安徽宇信	已验收		
5	一体化盖条	55*15*1.0	个	11758.097	5997.534	9131.9	77.67	安徽宇	已验收		

监理日报

						34	%	信	
6	拉钩	200*2.0	个	21199	13376	17376	81.97%	安徽宇信	已验收
7	几字型主水槽底座	380*50*50*5	个	10245	6090	8478	82.75%	安徽宇信	已验收
8	几字型支撑线槽底座	90*32*50*2.0	个	8937	7478	8981	100.49%	安徽宇信	已验收
9	常规支架	常规 0.428	MW	0.428	0	0.428	100%	安徽宇信	已验收
10	直流电缆	1X4mm²	m		0				已验收
11	组件	695w	块	8632	0	1287	14.9%	天合	已验收
12	逆变器	300KW/196KW	台	17	15	15/2	100%	华为	未验收
13	接地扁铁		m		0				已验收
14	桥架	100*50、 150*100、 200*100、 300*100	m	2356	2081	2081	88.33	安徽钢毅	已验收
15	直流电缆	1*4	m	60000	60000	60000	100	江苏上上	已验收
16	低压交流电缆	3*95	m	3097	3097	3097	100	江苏上上	已验收
17	高压交流电缆	3*185	m	1905	1140	1140	59.84	江苏上上	已验收
18	箱变		台		0				
19	一二次设备		套		0				
20									

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计累计量	完成率
1	水泥屋面（宿舍楼、接待楼、办公楼）	混凝土墩子安装	块	650	-	650	100%
		支架安装	MW	0.42812	-	0.42812	100%
		桥架安装	MW	0.42812			
		组件安装	块	616		490	80%
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	2			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	353			
		监控系统	台	5			

监理日报

2	闵海 1 分厂	支架安装	MW	3.24982			
		桥架安装	MW	3.24982			
		组件安装	块	4676			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	8			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	1594			
		监控系统	台	2			
3	13#厂房	支架安装	MW	0.11398			
		桥架安装	MW	0.11398			
		组件安装	块	164			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	1			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	256			
		监控系统	台	1			
		檩条	条	48			
		檩条连接件	个	43			
		隅撑	个	137			
4	15-16#厂房	支架安装	MW	1.31077			
		桥架安装	MW	1.31077			
		组件安装	块	1886			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	4			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	449			
		监控系统	台	2			

监理日报

		加固檩条	条	480			
		加固隅撑	个	484			
5	17-18#厂房	支架安装	MW	0.89655			
		桥架安装	MW	0.89655			
		组件安装	块	1290			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	2			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	445			
		监控系统	台	2			
		加固檩条	条	432			
6	箱变	箱变基础					
		箱变安装	台	3			
7	一二次设备	一二次设备基础					
		一二次设备安装	套	1			

监理情况

1、工程整体进度：

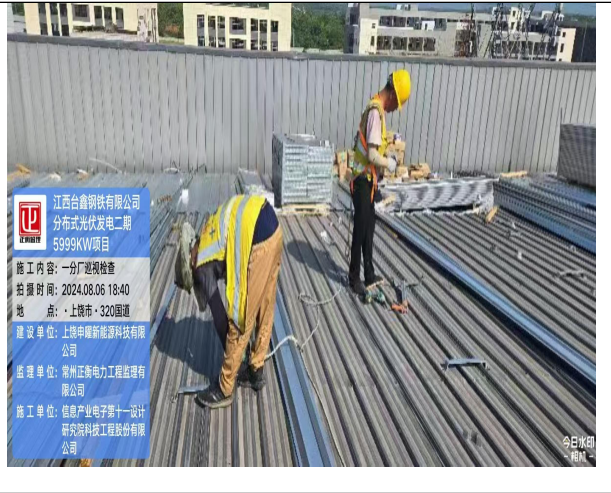
工程总体进度完成量： 其主要分项工程完成量如下：

序号	工作内容	单位	总工程量	累计完成量	完成比率
1	混凝土墩子	块	650	650	100%
2	支架	MW	5.999	0.42812	7.1%
3	直流电缆	MW	5.999		
4	组件	块	8632	490	5.7%
5	逆变器	台	17		
6	接地扁铁	MW	5.999		
7	桥架	MW	5.999		

监理日报

8	交流电缆	m	3097		
9	箱变	台	3		
10	一二次设备	套	1		
11					
1、工程施工安全：闽海一分厂上施工人员安全带已穿，安全措施已到位。加固单位已做好安全防护措施，穿戴安全带，作业区域已做好围挡。					
2、工程施工质量：巡视闽海一分厂，加固单位进行檩条连接件、隅撑连接件加固作业，检查闽海一分厂几字支撑、主水槽安装，分散支架材料，爬梯焊接，防腐刷漆。					
3、问题：					
4、其他：					

附一：施工过程及监督检查图片

 江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容：17.18加固施工 拍摄时间：2024.08.06 17:15 地点：上饶市·工业大道 建设单位：上饶申耀新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	 江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容：主水槽安装 拍摄时间：2024.08.06 08:50 地点：上饶市·320国道 建设单位：上饶申耀新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
加固施工巡视	主水槽安装
 江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容：一分厂巡视检查 拍摄时间：2024.08.06 18:40 地点：上饶市·320国道 建设单位：上饶申耀新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	 江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容：一分厂巡视检查 拍摄时间：2024.08.06 18:40 地点：上饶市·320国道 建设单位：上饶申耀新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
一分厂现场检查	一分厂现场检查

