

监理日报

|          |          |                               |                                                                             |           |          |                       |        |      |      |     |    |
|----------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------|------|------|-----|----|
| 项目名称     |          | 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 |                                                                             |           |          |                       |        |      |      |     |    |
| 建设单位     |          | 上饶申曜新能源科技有限公司                 |                                                                             |           |          | 项目负责人                 | 陈伟林    |      |      |     |    |
| 承包单位     |          | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司      |                                                                             |           |          | 项目经理                  | 高涛     |      |      |     |    |
| 监理单位     |          | 常州正衡电力工程监理有限公司                |                                                                             |           |          | 项目总监                  | 张献兵    | 项目总代 | 杨铃铃  | 记录员 | 苏航 |
| 填报日期     |          | 2024.08.07（星期三）               |                                                                             |           | 天气       | 晴转雨温度：28~39℃ 风力：1~2 级 |        |      |      |     |    |
| 当日进度     | 人员安排     |                               | 管理人员：4人；施工人员：16人；监理：2人                                                      |           |          |                       |        |      |      |     |    |
|          | 机械车辆     |                               | 吊车一台，叉车一台。两台登高直臂车                                                           |           |          |                       |        |      |      |     |    |
|          | 材料到货     |                               |                                                                             |           |          |                       |        |      |      |     |    |
|          | 施工进展     |                               | 1. 闽海一分厂，分散支架材料，主水槽、支撑线槽固定安装。<br>2. 加固单位进行 17-18 厂房连接件焊接、刷漆。 3. 爬梯现场进行焊接制作。 |           |          |                       |        |      |      |     |    |
|          | 安全工作     |                               | 现场安全巡视。                                                                     |           |          |                       |        |      |      |     |    |
| 明日计划     | 人员安排     |                               | 管理人员：4人；施工人员：16人；                                                           |           |          |                       |        |      |      |     |    |
|          | 材料到货     |                               |                                                                             |           |          |                       |        |      |      |     |    |
|          | 安全工作     |                               |                                                                             |           |          |                       |        |      |      |     |    |
|          | 施工内容     |                               | 1. 加固单位对檩条连接件、隅撑连接件进行加工作业。 2. 闽海一分厂，固定底座 主水槽、支撑线槽安装。 3. 爬梯现场进行焊接安装。         |           |          |                       |        |      |      |     |    |
| 主要材料到货情况 |          |                               |                                                                             |           |          |                       |        |      |      |     |    |
| 序号       | 材料/设备名称  | 型号                            | 单位                                                                          | 总数量       | 当日到货量    | 累计到货量                 | 累计到货率  | 厂家   | 验收情况 |     |    |
| 1        | 混凝土墩子    | 400*300mm                     | 块                                                                           | 650       | 0        | 650                   | 100%   | 安徽金地 | 已验收  |     |    |
| 2        | BIPV 主水槽 | 220*55*1.0                    | 米                                                                           | 14697.08  | 11338.02 | 14697.08              | 100%   | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |
| 3        | 支撑线槽     | 40*55*0.8                     | 米                                                                           | 12813.34  | 8377.83  | 11840.24              | 92.41% | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |
| 4        | 副水槽      | 73*25*0.8                     | 米                                                                           | 21568.186 | 1770.842 | 21506.842             | 99.72% | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |
| 5        | 一体化盖条    | 55*15*1.0                     | 个                                                                           | 11758.097 | 5997.534 | 9131.934              | 77.67% | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |

# 监理日报

|    |           |                                            |    |       |       |       |         |      |     |
|----|-----------|--------------------------------------------|----|-------|-------|-------|---------|------|-----|
| 6  | 拉钩        | 200*2.0                                    | 个  | 21199 | 13376 | 17376 | 81.97%  | 安徽宇信 | 已验收 |
| 7  | 几字型主水槽底座  | 380*50*50*5                                | 个  | 10245 | 6090  | 8478  | 82.75%  | 安徽宇信 | 已验收 |
| 8  | 几字型支撑线槽底座 | 90*32*50*2.0                               | 个  | 8937  | 7478  | 8981  | 100.49% | 安徽宇信 | 已验收 |
| 9  | 常规支架      | 常规 0.428                                   | MW | 0.428 | 0     | 0.428 | 100%    | 安徽宇信 | 已验收 |
| 10 | 直流电缆      | 1X4mm²                                     | m  |       | 0     |       |         |      | 已验收 |
| 11 | 组件        | 695w                                       | 块  | 8632  | 0     | 1287  | 14.9%   | 天合   | 已验收 |
| 12 | 逆变器       | 300KW/196KW                                | 台  | 17    | 15    | 15/2  | 100%    | 华为   | 未验收 |
| 13 | 接地扁铁      |                                            | m  |       | 0     |       |         |      | 已验收 |
| 14 | 桥架        | 100*50、<br>150*100、<br>200*100、<br>300*100 | m  | 2356  | 2081  | 2081  | 88.33   | 安徽钢毅 | 已验收 |
| 15 | 直流电缆      | 1*4                                        | m  | 60000 | 60000 | 60000 | 100     | 江苏上上 | 已验收 |
| 16 | 低压交流电缆    | 3*95                                       | m  | 3097  | 3097  | 3097  | 100     | 江苏上上 | 已验收 |
| 17 | 高压交流电缆    | 3*185                                      | m  | 1905  | 1140  | 1140  | 59.84   | 江苏上上 | 已验收 |
| 18 | 箱变        |                                            | 台  |       | 0     |       |         |      |     |
| 19 | 一二次设备     |                                            | 套  |       | 0     |       |         |      |     |
| 20 |           |                                            |    |       |       |       |         |      |     |

## 工程建设施工进度情况

| 序号 | 部位                | 工作内容    | 单位 | 总工程量    | 当日完成量 | 累计累计量   | 完成比率 |
|----|-------------------|---------|----|---------|-------|---------|------|
| 1  | 水泥屋面（宿舍楼、接待楼、办公楼） | 混凝土墩子安装 | 块  | 650     | -     | 650     | 100% |
|    |                   | 支架安装    | MW | 0.42812 | -     | 0.42812 | 100% |
|    |                   | 桥架安装    | MW | 0.42812 |       |         |      |
|    |                   | 组件安装    | 块  | 616     |       | 490     | 80%  |
|    |                   | 直流电缆敷设  | MW |         |       |         |      |
|    |                   | 逆变器安装   | 台  | 2       |       |         |      |
|    |                   | 防雷接地    | m  |         |       |         |      |
|    |                   | 清洗洗系统安装 | MW |         |       |         |      |
|    |                   | 交流电缆敷设  | m  | 353     |       |         |      |
|    |                   | 监控系统    | 台  | 5       |       |         |      |

# 监理日报

|   |          |         |    |         |  |  |  |
|---|----------|---------|----|---------|--|--|--|
|   |          |         |    |         |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 2 | 闵海 1 分厂  | 支架安装    | MW | 3.24982 |  |  |  |
|   |          | 桥架安装    | MW | 3.24982 |  |  |  |
|   |          | 组件安装    | 块  | 4676    |  |  |  |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW |         |  |  |  |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 8       |  |  |  |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |  |  |  |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |  |  |  |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 1594    |  |  |  |
|   |          | 监控系统    | 台  | 2       |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 3 | 13#厂房    | 支架安装    | MW | 0.11398 |  |  |  |
|   |          | 桥架安装    | MW | 0.11398 |  |  |  |
|   |          | 组件安装    | 块  | 164     |  |  |  |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW |         |  |  |  |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 1       |  |  |  |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |  |  |  |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |  |  |  |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 256     |  |  |  |
|   |          | 监控系统    | 台  | 1       |  |  |  |
|   |          | 檩条      | 条  | 48      |  |  |  |
|   |          | 檩条连接件   | 个  | 43      |  |  |  |
|   |          | 隅撑      | 个  | 137     |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 4 | 15-16#厂房 | 支架安装    | MW | 1.31077 |  |  |  |
|   |          | 桥架安装    | MW | 1.31077 |  |  |  |
|   |          | 组件安装    | 块  | 1886    |  |  |  |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW |         |  |  |  |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 4       |  |  |  |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |  |  |  |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |  |  |  |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 449     |  |  |  |
|   |          | 监控系统    | 台  | 2       |  |  |  |

# 监理日报

|   |          |         |    |         |  |  |  |
|---|----------|---------|----|---------|--|--|--|
|   |          | 加固檩条    | 条  | 480     |  |  |  |
|   |          | 加固隅撑    | 个  | 484     |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 5 | 17-18#厂房 | 支架安装    | MW | 0.89655 |  |  |  |
|   |          | 桥架安装    | MW | 0.89655 |  |  |  |
|   |          | 组件安装    | 块  | 1290    |  |  |  |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW |         |  |  |  |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 2       |  |  |  |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |  |  |  |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |  |  |  |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 445     |  |  |  |
|   |          | 监控系统    | 台  | 2       |  |  |  |
|   |          | 加固檩条    | 条  | 432     |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 6 | 箱变       | 箱变基础    |    |         |  |  |  |
|   |          | 箱变安装    | 台  | 3       |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 7 | 一二次设备    | 一二次设备基础 |    |         |  |  |  |
|   |          | 一二次设备安装 | 套  | 1       |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |

## 监理情况

1、工程整体进度：

工程总体进度完成量： 其主要分项工程完成量如下：

| 序号 | 工作内容  | 单位 | 总工程量  | 累计完成量   | 完成比率 |
|----|-------|----|-------|---------|------|
| 1  | 混凝土墩子 | 块  | 650   | 650     | 100% |
| 2  | 支架    | MW | 5.999 | 0.42812 | 7.1% |
| 3  | 直流电缆  | MW | 5.999 |         |      |
| 4  | 组件    | 块  | 8632  | 490     | 5.7% |
| 5  | 逆变器   | 台  | 17    |         |      |
| 6  | 接地扁铁  | MW | 5.999 |         |      |
| 7  | 桥架    | MW | 5.999 |         |      |

监理日报

|                                                                                   |       |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|--|--|
| 8                                                                                 | 交流电缆  | m | 3097 |  |  |
| 9                                                                                 | 箱变    | 台 | 3    |  |  |
| 10                                                                                | 一二次设备 | 套 | 1    |  |  |
| 11                                                                                |       |   |      |  |  |
|                                                                                   |       |   |      |  |  |
| 1、工程施工安全：闽海一分厂上施工人员安全带已穿，安全措施已到位，爬梯吊装焊接，施工人员防护措施到位。加固单位已做好安全防护措施，穿戴安全带，作业区域已做好围挡。 |       |   |      |  |  |
| 2、工程施工质量：巡视闽海一分厂，加固单位进行檩条连接件、隅撑连接件加固作业，检查闽海一分厂几字支撑、主水槽安装，分散支架材料，爬梯焊接，防腐刷漆。        |       |   |      |  |  |
| 3、问题：                                                                             |       |   |      |  |  |
| 4、其他：                                                                             |       |   |      |  |  |


附一：施工过程及监督检查图片



加固施工巡视



主水槽安装

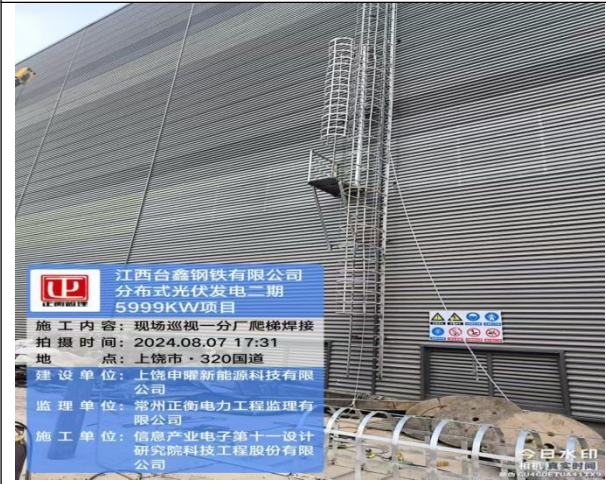

一分厂现场爬梯安装检查



一分厂现场爬梯安装检查

