

监理日报

项目名称		江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目									
建设单位		上饶申曜新能源科技有限公司				项目负责人	陈伟林				
承包单位		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司				项目经理	高涛				
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司				项目总监	张献兵	项目总代	杨铃铃	记录员	苏航
填报日期		2024.09.08（星期日）			天气	晴 温度：27~37℃ 风力：1~2 级					
当日进度	人员安排		管理人员：1人；施工人员：14人；监理：2人								
	机械车辆		五台登高直臂车								
	材料到货		组件到场两车。								
	施工进展		1. 17-18#厂房加固檩条安装、拉条车丝、拉条安装等； 2. 闽海一分厂安装主水槽、拉钩、材料分散等； 3. 门卫处铺设钢管 4. 组件到场一批，卸货； 5. 18 厂房-水渠值筋，砌筑电缆井；								
	安全工作		现场安全巡视人员安全用品佩戴齐全，加固安全员在岗。								
明日计划	人员安排		管理人员：1人；施工人员：14人；								
	材料到货										
	安全工作		现场人员安全用品佩戴，安全防护及防暑物资持续检查。								
	施工内容		1. 13#厂房加固檩条安装、拉条车丝、拉条安装等；2. 闽海一分厂组件吊装，安装主水槽、拉钩、组件，材料分散等；3. 电缆沟混凝土浇筑。								
主要材料到货情况											
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家	验收情况		
1	混凝土墩子	400*300mm	块	650	0	650	100%	安徽金地	已验收		
2	BIPV 主水槽	220*55*1.0	米	14697.08	0	14697.08	100%	安徽宇信	已验收		
3	支撑线槽	40*55*0.8	米	12813.34	0	11840.24	92.41%	安徽宇信	已验收		
4	副水槽	73*25*0.8	米	21568.186	0	21506.842	99.72%	安徽宇信	已验收		
5	一体化盖条	55*15*1.0	个	11758.097	0	9131.934	77.67%	安徽宇信	已验收		
6	拉钩	200*2.0	个	21199	0	17376	81.97%	安徽宇	已验收		

监理日报

								信	
7	几字型主水槽底座	380*50*50*5	个	10245	0	8478	82.75%	安徽宇信	已验收
8	几字型支撑线槽底座	90*32*50*2.0	个	8937	0	8981	100.49%	安徽宇信	已验收
9	常规支架	常规 0.428	MW	0.428	0	0.428	100%	安徽宇信	已验收
10	直流电缆	1X4mm²	m		0				已验收
11	组件	695w	块	8632	0	1287	14.9%	天合	已验收
12	逆变器	300KW/196KW	台	17	0	15/2	100%	华为	未验收
13	接地扁铁	4*4	m		0				已验收
14	桥架	100*50、 150*100、 200*100、 300*100	m	2356	0	2081	88.33%	安徽钢毅	已验收
15	直流电缆	1*4	m	60000	0	60000	100%	江苏上上	已验收
16	低压交流电缆	3*95	m	3097	0	3097	100%	江苏上上	已验收
17	高压交流电缆	3*185	m	1905	0	1140	59.84%	江苏上上	已验收
18	箱变		台		0				
19	一二次设备		套		0				
20	加固檩条		根	383	383	383	100%		已验收

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计累计量	完成比率
1	水泥屋面（宿舍楼、接待楼、办公楼）	混凝土墩子安装	块	650	-	650	100%
		支架安装	MW	0.42812	-	0.42812	100%
		桥架安装	MW	0.42812			
		组件安装	块	616	-	616	100%
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	2			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	353			
		监控系统	台	5			

监理日报

2	闵海 1 分厂	支架安装	MW	3. 24982			24. 62%
		桥架安装	MW	3. 24982			
		组件安装	块	4676		638	13. 64%
		直流电缆敷设	MW	3. 24982	0. 05	0. 395	12. 15%
		逆变器安装	台	8			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	1594			
		监控系统	台	2			
		主水槽安装	MW	3. 24982	0. 07	2. 67	82. 00%
3	13#厂房	支架安装	MW	0. 11398			
		桥架安装	MW	0. 11398			
		组件安装	块	164			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	1			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	256			
		监控系统	台	1			
		檩条	条	48			
		檩条连接件	个	43			
		隅撑	个	137			
4	15-16#厂房	支架安装	MW	1. 31077			
		桥架安装	MW	1. 31077			
		组件安装	块	1886			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	4			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	449			
		监控系统	台	2			

监理日报

		加固檩条	条	480			
		加固隅撑	个	484			
5	17-18#厂房	支架安装	MW	0.89655			
		桥架安装	MW	0.89655			
		组件安装	块	1290			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	2			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	445			
		监控系统	台	2			
		加固檩条	条	432			
6	箱变	箱变基础					
		箱变安装	台	3			
7	一二次设备	一二次设备基础					
		一二次设备安装	套	1			

监理情况

1、工程整体进度：


工程总体进度完成量： 其主要分项工程完成量如下：

序号	工作内容	单位	总工程量	累计完成量	完成比率
1	混凝土墩子	块	650	650	100%
2	支架	MW	5.999	0.42812	7.1%
3	直流电缆	MW	5.999	0.345	0.1%
4	组件	块	8632	706	11%
5	逆变器	台	17		
6	接地扁铁	MW	5.999		
7	桥架	MW	5.999		

监理日报

8	交流电缆	m	3097		
9	箱变	台	3		
10	一二次设备	套	1		
11					
1、工程施工安全：加固单位已做好安全防护措施，穿戴安全带，作业区域已做好围挡。一分厂光伏安装人员及 15-16 厂房材料散料安全用品佩戴齐全，防暑物资配置到位。					
2、工程施工质量：17-18#厂房加固檩条安装、拉条车丝、拉条安装等； 15-16#厂房支架安装，巡视检查一分厂几字形支架安装、主水槽安装散料，巡视检查电缆沟预埋管放管浇筑回填夯实，钢筋绑扎平铺。					
3、问题：					
4、其他：旁站组件卸车					

附一： 施工过程及监督检查图片

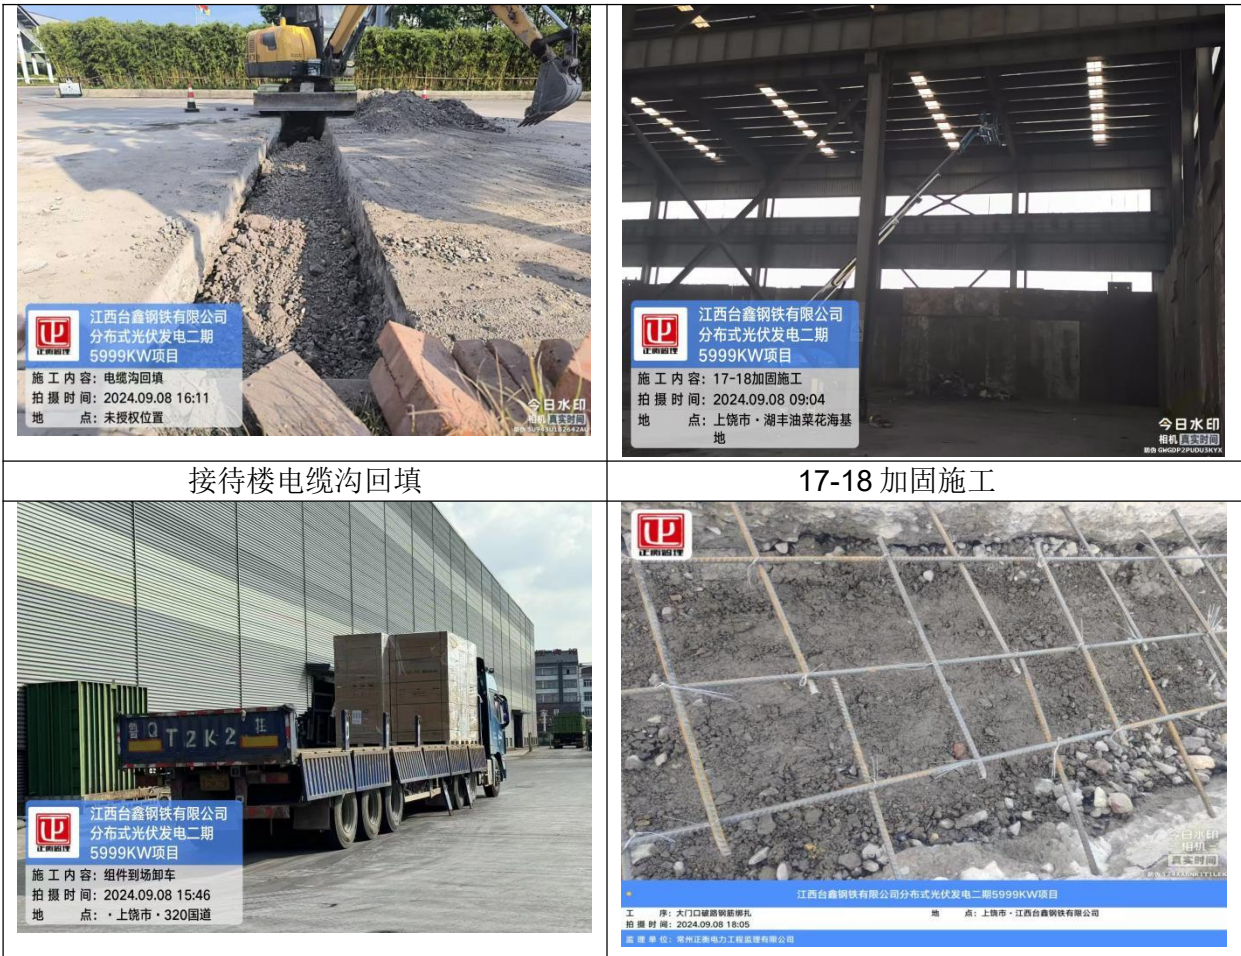

监理日报

一分厂组件卸车	接待楼电缆沟钢筋绑扎
 江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容: 电缆沟下管固定浇筑混凝土 拍摄时间: 2024.09.08 15:30 地点: 上饶市·江西台鑫钢铁有限公司 今日水印 相机 [15:30:15] 水印相机 [15:30:15]	
接待楼预埋管浇筑	
附一：存在的问题照片	
无	
