

监理日报

项目名称		江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目							
建设单位		上饶申曜新能源科技有限公司			项目负 责人	陈伟林			
承包单位		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份 有限公司			项目经 理	高涛			
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司			项目总 监	张献兵	项目 总代	杨铃 铃	记 录 员 杨铃铃
填报日期		2024. 10. 25（星期五）		天气	晴温度：20~32℃ 风力：2~3 级				
当日 进度	人员安排		管理人员：4人；施工人员：21人；监理：1人						
	机械车辆		顶管车 1 辆，						
	材料到货								
	施工进展		1、 闽海一分厂组件安装，桥架安装，直流线敷设； 2 顶管施工；						
	安全工作		现场安全巡视人员安全用品佩戴齐全						
明日 计划	人员安排		管理人员：4人；施工人员：21人；						
	材料到货								
	安全工作		现场人员安全用品佩戴，安全防护持续检查。						
	施工内容		1. 电缆路径破路；2. 顶管进行施工； 3. 闽海一分厂桥架安装、接地安装； 4. 15-16#厂房支架安装，组件吊装；						
主要材料到货情况									
序号	材料/设备 名称	型号	单 位	总 数量	当日 到货量	累计 到货量	累计 到货率	厂家	验收情 况
1	混凝土墩子	400*300mm	块	650	0	650	100%	安徽金 地	已验收
2	BIPV 主水槽	220*55*1.0	米	14697.08	0	14697.08	100%	安徽宇 信	已验收
3	支撑线槽	40*55*0.8	米	12813.34	0	11840.24	92.41%	安徽宇 信	已验收
4	副水槽	73*25*0.8	米	21568.186	0	21506.842	99.72%	安徽宇 信	已验收
5	一体化盖条	55*15*1.0	个	11758.097	0	9131.934	77.67%	安徽宇 信	已验收
6	拉钩	200*2.0	个	21199	0	20520	96.8%	安徽宇 信	已验收
7	几字型主水	380*50*50*5	个	10245	0	8478	100%	安徽宇	已验收

监理日报

	槽底座							信	
8	几字型支撑线槽底座	90*32*50*2.0	个	8937	0	8981	100.49%	安徽宇信	已验收
9	常规支架	常规 0.428	MW	0.428	0	0.428	100%	安徽宇信	已验收
10	直流电缆	1X4mm ²	m	60000	0	60000	100%	江苏上上	已验收
11	组件	695w	块	8632	2607	6039	70%	天合	已验收
12	逆变器	300KW/196KW	台	17	0	15/2	100%	华为	未验收
13	接地扁铁	4*4	m		0				已验收
14	桥架	100*50、150*100、200*100、300*100	m	2356	0	2081	88.33%	安徽钢毅	已验收
15	直流电缆	1*4	m	60000	0	60000	100%	江苏上上	已验收
16	低压交流电缆	3*95	m	3097	0	3097	100%	江苏上上	已验收
17	高压交流电缆	3*185	m	1905	0	1140	59.84%	江苏上上	已验收
18	箱变		台		0				
19	一二次设备		套		0				
20	加固檩条		根	383	383	383	100%		已验收

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计累计量	完成比率
1	水泥屋面（宿舍楼、接待楼、办公楼）	混凝土墩子安装	块	650	-	650	100%
		支架安装	MW	0.42812	-	0.42812	100%
		桥架安装	MW	0.42812			
		组件安装	块	616	-	616	100%
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	2			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	353			
		监控系统	台	5			

监理日报

2	闵海 1 分厂	主水槽安装	MW	3.24982	/	3.24982	100%
		桥架安装	MW	3.24982	0.24	2.91	89.54%
		组件安装	块	4676	423	4676	100%
		直流电缆敷设	MW	3.24982	0.271	3.24982	100%
		逆变器安装	台	8	2	3	37.5%
		防雷接地	MW	3.24982	0.32	2.14	75.7%
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	1594			
		监控系统	台	2			
3	13#厂房	支架安装	MW	0.11398			
		桥架安装	MW	0.11398			
		组件安装	块	164			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	1			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	256			
		监控系统	台	1			
		檩条	条	48			
		檩条连接件	个	43			
		隅撑	个	137			
4	15-16#厂房	支架安装	MW	1.31077	0.325	0.822	62.74%
		桥架安装	MW	1.31077			
		组件安装	块	1886			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	4			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	449			
		监控系统	台	2			
		加固檩条	条	480			

监理日报

		加固隅撑	个	484			
5	17-18#厂房	支架安装	MW	0.89655			
		桥架安装	MW	0.89655			
		组件安装	块	1290			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	2			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	445			
		监控系统	台	2			
		加固檩条	条	432			
6	箱变	箱变基础		3	3	3	50%
		箱变安装	台				
7	一二次设备	一二次设备基础		1	1	1	50%
		一二次设备安装	套	1			

监理情况

1、工程整体进度：

工程总体进度完成量：其主要分项工程完成量如下：

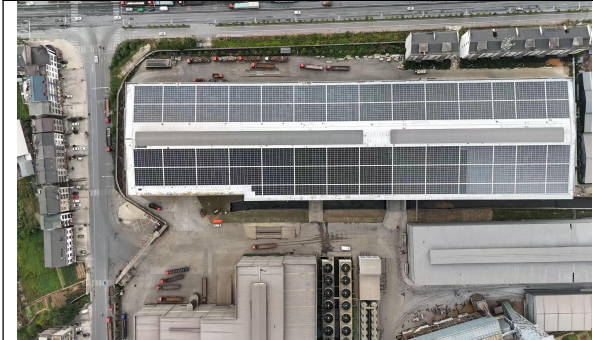
序号	工作内容	单位	总工程量	累计完成量	完成比率
1	混凝土墩子	块	650	650	100%
2	支架	MW	5.999	3.67794	61.4%
3	直流电缆	MW	5.999	3.24982	54.2%
4	组件	块	8632	5292	61.3%
5	逆变器	台	17	3	3/17
6	接地扁铁	MW	5.999	2.14	35.7%
7	桥架	MW	5.999	2.91	48.5%
8	交流电缆	m	3097		

监理日报

9	箱变	台	3		
10	一二次设备	套	1		
11					

- 1、 工程施工安全：光伏安装人员安全用品佩戴齐全。
- 2、 工程施工质量：组件安装光伏线绑扎到位压接牢固，桥架安装符合图纸设计直流线放线中。
- 3、 其他：
- 4、 问题：

附一： 施工过程及监督检查图片

	
组件安装	桥架安装
	
一分厂组件安装完成	

附一： 存在的问题照片

无	
