

监理日报

项目名称		江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目									
建设单位		上饶申曜新能源科技有限公司				项目负责人	陈伟林				
承包单位		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司				项目经理	高涛				
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司				项目总监	张献兵	项目总代	杨铃铃	记录员	苏航
填报日期		2024. 12. 28（星期六）			天气	晴温度：-1~11℃ 风力：1~2 级					
当日进度	人员安排		管理人员：2人；施工人员：1人；监理：2人								
	机械车辆										
	材料到货										
	施工进展		1. 现场安装 1.2 次舱标牌。2、接待楼桥架安装								
	安全工作		现场安全巡视人员安全用品佩戴齐全								
明日计划	人员安排		管理人员：2人；施工人员：1人；								
	材料到货										
	安全工作		现场人员安全用品佩戴，安全防护持续检查。								
	施工内容		1. 整改消缺								
主要材料到货情况											
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家	验收情况		
1	混凝土墩子	400*300mm	块	650	0	650	100%	安徽金地	已验收		
2	BIPV 主水槽	220*55*1.0	米	14697.08	0	14697.08	100%	安徽宇信	已验收		
3	支撑线槽	40*55*0.8	米	12813.34	0	12813.34	100%	安徽宇信	已验收		
4	副水槽	73*25*0.8	米	21568.186	0	21568.186	100%	安徽宇信	已验收		
5	一体化盖条	55*15*1.0	个	11758.097	0	11758.097	100%	安徽宇信	已验收		
6	拉钩	200*2.0	个	21199	0	21199	100%	安徽宇信	已验收		
7	几字型主水槽底座	380*50*50*5	个	10245	0	10245	100%	安徽宇信	已验收		

监理日报

8	几字型支撑线槽底座	90*32*50*2.0	个	8937	0	8981	100.49%	安徽宇信	已验收
9	常规支架	常规 0.428	MW	0.428	0	0.428	100%	安徽宇信	已验收
10	直流电缆	1X4mm²	m	60000	0	60000	100%	江苏上上	已验收
11	组件	695w	块	8632	0	8646	100%	天合	已验收
12	逆变器	300KW/196KW	台	17	0	15/2	100%	华为	未验收
13	接地扁铁	4*4	m		0				已验收
14	桥架	100*50、 150*100、 200*100、 300*100	m	2356	0	2356	100%	安徽钢毅	已验收
15	直流电缆	1*4	m	60000	0	60000	100%	江苏上上	已验收
16	低压交流电缆	3*95	m	3097	0	3097	100%	江苏上上	已验收
17	高压交流电缆	3*185	m	1905	0	1905	100%	江苏上上	已验收
18	箱变	1250/1600/2500	台	3	3	3	100%	正泰	已验收
19	一二次设备		套	1	1	1	100%	正泰 南瑞	已验收
20	加固檩条		根	383	383	383	100%		已验收

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计累计量	完成率
1	水泥屋面（宿舍楼、接待楼、办公楼）	混凝土墩子安装	块	650	—	650	100%
		支架安装	MW	0.42812	—	0.42812	100%
		桥架安装	MW	0.42812	—	0.42812	100%
		组件安装	块	616	—	616	100%
		直流电缆敷设	MW	0.42812	—	0.42812	100%
		逆变器安装	台	2		2	100%
		防雷接地	MW	0.42812	—	0.42812	100%
		清洗洗系统安装	MW	0.42812		0.42812	100%
		交流电缆敷设	m	353	—	353	100%
		监控系统	台	5		5	100%

监理日报

2	闵海 1 分厂	主水槽安装	MW	3. 24982	—	3. 24982	100%
		桥架安装	MW	3. 24982	—	3. 24982	100%
		组件安装	块	4676	—	4676	100%
		直流电缆敷设	MW	3. 24982	—	3. 24982	100%
		逆变器安装	台	8	—	8	100%
		防雷接地	MW	3. 24982	—	3. 24982	100%
		清洗洗系统安装	MW	3. 24982		3. 24982	100%
		交流电缆敷设	m	1594	—	1594	100%
		监控系统	台	4		4	100%
3	13#厂房	支架安装	MW	0. 11398		0. 11398	100%
		桥架安装	MW	0. 11398		0. 11398	100%
		组件安装	块	171		171	100%
		直流电缆敷设	MW	0. 11398		0. 11398	100%
		逆变器安装	台	1		1	100%
		防雷接地	m	0. 11398		0. 11398	100%
		清洗洗系统安装	MW	0. 118845		0. 118845	100%
		交流电缆敷设	m	256	—	256	100%
		监控系统	台	1		1	100%
		檩条	条	48	—	48	100%
		檩条连接件	个	43	—	43	100%
		隅撑	个	137	—	137	100%
4	15-16#厂房	支架安装	MW	1. 31077	—	1. 31077	100%
		桥架安装	MW	1. 31077	—	1. 31077	100%
		组件安装	块	1886	—	1886	100%
		直流电缆敷设	MW	1. 31077	—	1. 31077	100%
		逆变器安装	台	4	—	4	100%
		防雷接地	m	1. 31077		1. 31077	100%
		清洗洗系统安装	MW	1. 31077		1. 31077	100%
		交流电缆敷设	m	449	—	449	100%
		监控系统	台	2		2	100%

监理日报

		加固檩条	条	480		480	100%
		加固隅撑	个	484		484	100%
5	17-18#厂房	支架安装	MW	0.89655	—	0.89655	100%
		桥架安装	MW	0.89655		0.89655	100%
		组件安装	块	1290		1290	100%
		直流电缆敷设	MW	0.89655		0.891685	100%
		逆变器安装	台	2		2	100%
		防雷接地	m	0.89655		0.8	100%
		清洗洗系统安装	MW	0.89655		0.89655	100%
		交流电缆敷设	m	262	—	262	100%
		监控系统	台	2		1	100%
		加固檩条	条	432		432	100%
6	箱变	箱变基础		3	—	3	100%
		箱变安装	台	3	—	3	100%
7	一二次设备	一二次设备基础		1	—	1	100%
		一二次设备安装	套	1	—	1	100%

监理情况

1、工程整体进度：

工程总体进度完成量：50% 其主要分项工程完成量如下：

序号	工作内容	单位	总工程量	累计完成量	完成比率
1	混凝土墩子	块	650	650	100%
2	支架	MW	5.999	5.999	100%
3	直流电缆	MW	5.999	5.999	100%
4	组件	块	8632	8632	100%
5	逆变器	台	17	10	17/17
6	接地扁铁	MW	5.999	5.999	100%

监理日报


7	桥架	MW	5.999	5.999	100%
8	交流电缆	m	3097	3097	100%
9	箱变	台	3	3	100%
10	一二次设备	套	1	1	100%
11					

- 1、 工程施工安全：巡视现场施工人员安全用品佩戴齐全。
- 2、 工程施工质量：1、巡视现场桥架安装，1.2 次舱标识牌安装。
- 3、 其他：
- 4、 问题：

附一： 施工过程及监督检查图片




现场巡视

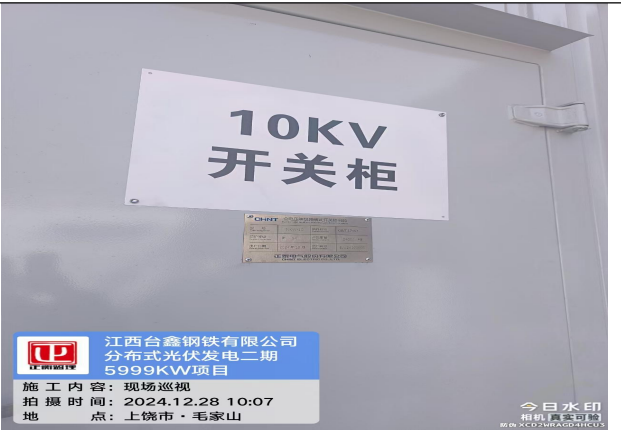

现场巡视



现场巡视

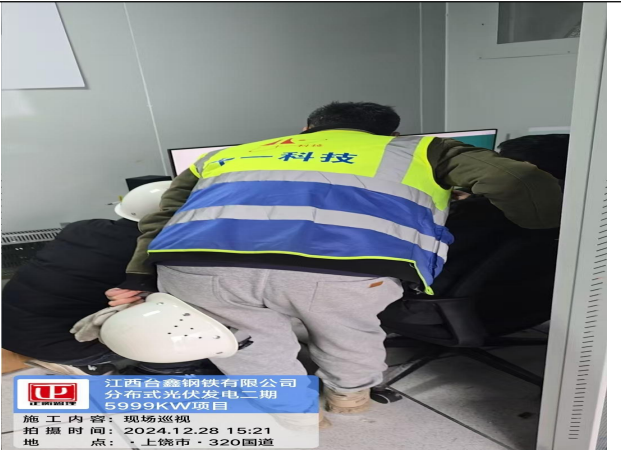

现场巡视

附一： 存在的问题照片
