

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 18 日 星期 二	气候	阴	气温	18-15℃
监理单位 动态：2 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求		材料进场： 无			
施工方人员动态：主要管理人员:4 人, 施工员:6 人, 全站仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求.					
施工机械动态：挖机 1 台, 拖拉机 1 台, 振动式打桩机 1 台, 满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1. 二号地块场地清表 6 亩， 2. 3 号地支架安装 16 组，3 号地组件安装 420 块。				
监理今日工作内容	1. 巡视检查三号地块支架安装，支架组件安装。 2. 安全巡视检查。 3. 在宿舍整理资料。 4. 填写监理日记。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	容岩峰		总监签阅	曹锐	



监理巡查三地块组件开箱抽检



监理巡查三地块光伏4平方线穿管



监理巡查三地块支架组件安装




监理巡查一地块施工现场开专项安全例会



监理巡查二地块场地平整



监理巡查三地块支架桩头刷防腐

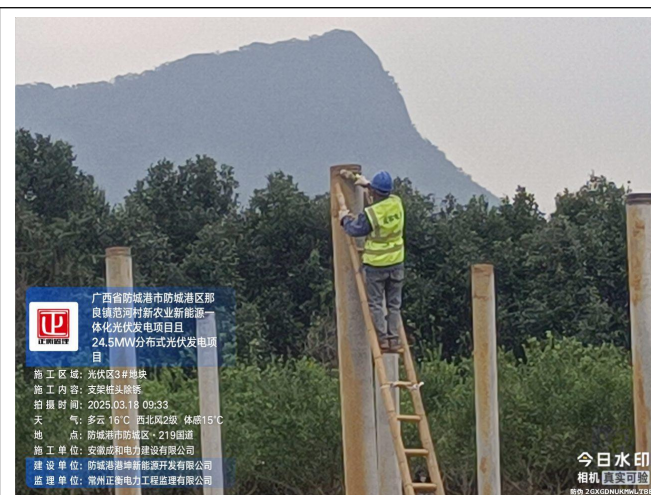

监理巡查三地块支架桩头除锈



监理巡查三地块支架安装



监理巡查三地块光伏4平方线敷设



监理巡查三地块支架组件安装
