

# 监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期	2025年03月22日星期六	气候	晴	气温	13-27℃
监理人员动态：2人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求	材料进场： 1、管桩8米99根。				
施工方人员动态：主要管理人员：4人，施工员：6人，全站仪1台，GPS测量仪1台，满足施工现场要求。					
施工机械动态：挖机1台，拖拉机1台，振动式打桩机1台，满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1、3号地支架安装19组，3号地组件安装588块，3号地4平方线5800米，3号地安装汇流箱2台。				
监理今日工作内容	1. 巡视检查三号地块支架安装，支架组件安装、4平方线、汇流箱安装。 2. 1号地块制作钢平台。 3. 安全巡视检查。 4. 在宿舍整理资料。 5. 填写监理日记。 6. 汇流箱开箱检查，接地扁钢沟回填验收、接地扁钢电阻测试。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	容岩峰		总监签阅	曹铁	



监理巡查一地块箱逆变一体机桩头除锈



监理巡查一地块钢平台制作



监理巡查三地块支架檩条安装




监理巡查三地块接地沟开挖



监理巡查三地块光伏电缆 4 平方线敷设



监理巡查三地块支架组件安装

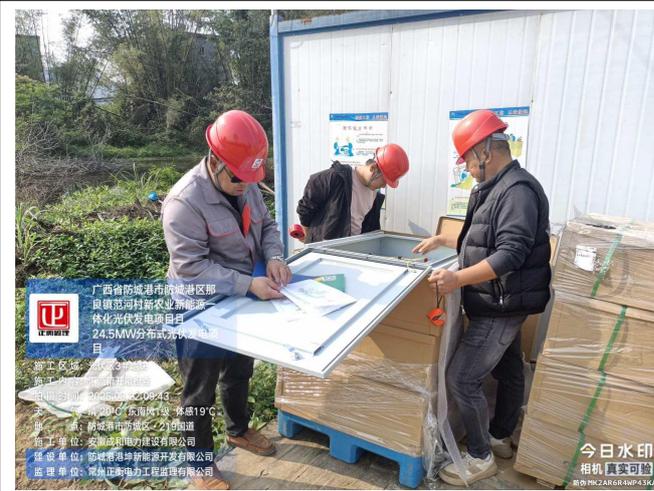

监理巡查三地块汇流箱开箱检查



监理巡查四地块接地扁钢沟回填



监理巡查四地块接地扁钢电阻测试
