

# 监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目

日期	2025年04月04日星期四	气候	晴	气温	17-25℃
监理人员动态：2人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求	材料进场： 无				
施工方人员动态：主要管理人员：4人，施工员：6人，全站仪1台，GPS测量仪1台，满足施工现场要求。					
施工机械动态：挖机1台，拖拉机1台，振动式打桩机1台，满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1、1号地块制作钢平台，三号地块桩基引孔23根，新增地块支架+5号地12，高压顶管约80米。				
监理今日工作内容	1. 1号地块制作钢平台，三号地块桩基引孔，高压顶管。 2. 安全巡视检查。 3. 在宿舍整理资料。 4. 填写监理日记。 5. 基础开挖及浇筑均已完成。组塔情况：组塔完成7.25基，分别为：G1#、G10#、G11#、G7#的80%、G9#，今日完成：G8#剩余的20%此基塔安装已完成、G19#安装55%累计完成65%，G28#安装完成70%。 6. 今日对已浇筑的塔基基础进行强度抽检。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	容岩峰		总监签阅	曹铁	



广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化24.4兆瓦分布式光伏发电项目  
 施工区域: 光伏区1#地块  
 施工内容: 箱逆变一体机吊装  
 拍摄时间: 2025.04.04 17:51  
 天气: 晴 22°C 东南风2级 体感23°C  
 地点: 防城港市防城区·219国道  
 施工单位: 安成成和电力建设有限公司  
 建设单位: 防城港市新能源开发有限公司  
 监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司

监理巡查光伏区一号地块箱逆变一体机吊装



广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化24.4兆瓦分布式光伏发电项目  
 施工区域: 2#地块  
 施工内容: 平台吊装就位  
 拍摄时间: 2025.04.04  
 天气: 多云 24°C  
 地点: 防城港市防城区·219国道

监理巡查光伏区二号地块平台吊装就位



广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化24.4兆瓦分布式光伏发电项目  
 前方施工 车辆慢行  
 施工区域: 光伏区1#地块  
 施工内容: 架设电缆过路顶管  
 拍摄时间: 2025.04.04 17:56  
 天气: 晴 23°C 东南风2级 体感23°C  
 地点: 防城港市防城区·219国道  
 施工单位: 安成成和电力建设有限公司  
 建设单位: 防城港市新能源开发有限公司  
 监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司

监理巡查光伏区一号地块高压电缆过路顶管



广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化24.4兆瓦分布式光伏发电项目  
 施工区域: 3#地块  
 施工内容: 汇流箱接线  
 拍摄时间: 2025.04.04  
 天气: 多云 21°C  
 地点: 防城港市防城区·219国道

监理巡查光伏区三号地块汇流箱接线




广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化24.4兆瓦分布式光伏发电项目  
 施工区域: 1#地块  
 施工内容: 箱逆变一体机吊装就位  
 拍摄时间: 2025.04.04  
 天气: 晴 22°C  
 地点: 防城港市防城区·219国道

监理巡查光伏区一号地块箱逆变一体机吊装就位



广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化24.4兆瓦分布式光伏发电项目  
 施工区域: 2#地块  
 施工内容: 支架安装  
 拍摄时间: 2025.04.04  
 天气: 多云 20°C  
 地点: 防城港市防城区·那良镇范河小学

监理巡查光伏区二号地块支架安装

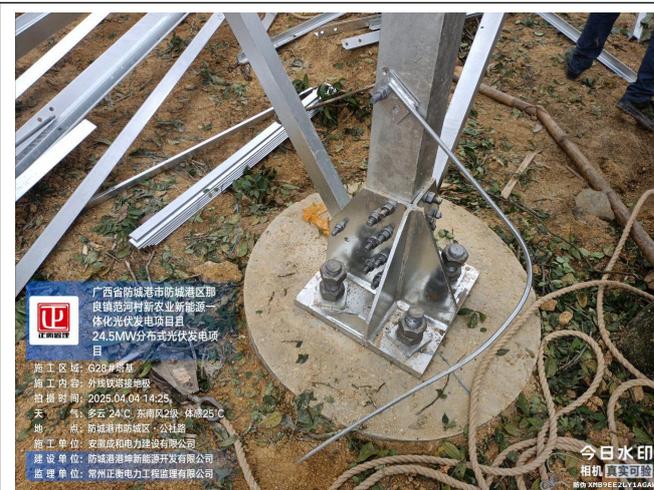

监理巡查 G28 外线铁塔接地板



监理巡查 G28 外线开始组塔



监理巡查外线 G16 塔基基础浇筑强度抽检



监理巡查外线 G16 塔基基础浇筑强度抽检



监理巡查外线 G10 塔基基础浇筑强度抽检
