

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目

日期	2025年04月05日星期五	气候	多云	气温	19-26℃
监理人员动态：2人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求	材料进场： 无				
施工方人员动态：主要管理人员：4人，施工员：6人，全站仪1台，GPS测量仪1台，满足施工现场要求。					
施工机械动态：挖机1台，拖拉机1台，振动式打桩机1台，满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1、1号地块制作钢平台，三号地块桩基引孔27根，高压顶管约80米。				
监理今日工作内容	1. 1号地块制作钢平台，三号地块桩基引孔，高压顶管。 2. 安全巡视检查。 3. 在宿舍整理资料。 4. 填写监理日记。 5. 基础开挖及浇筑均已完成。组塔情况：组塔完成8.25基，分别为：G1#、G10#、G11#、G7#的80%、G8#、G9#，G19#安装完成65%，今日完成：G28#剩余的30%此基塔安装已完成，G15#安装完成80%。 6. 今日对已浇筑的塔基基础进行强度抽检。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	谷岩峰		总监签阅	曹铁	



广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化2.4兆瓦分布式光伏发电项目
 施工区域: G15#塔基
 施工内容: 外线开始组塔
 拍摄时间: 2025.04.05 15:28
 天气: 轻度雾霾 22°C 东南风1级 体感23°C
 地点: 防城港市防城区·312国道
 施工单位: 安城和电力建设有限公司
 建设单位: 防城港市新能源开发有限公司
 监理单位: 柳州正康电力工程监理有限公司

监理巡查 G15 外线开始组塔



广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化2.4兆瓦分布式光伏发电项目
 施工区域: G28#塔基
 施工内容: 外线铁塔紧固
 拍摄时间: 2025.04.05-08:47
 天气: 雾 19°C 东南风 体感21°C
 地点: 防城港市防城区·公社路
 施工单位: 安城和电力建设有限公司
 建设单位: 防城港市新能源开发有限公司
 监理单位: 柳州正康电力工程监理有限公司

监理巡查 G28 外线铁塔紧固




广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化2.4兆瓦分布式光伏发电项目
 施工区域: G28#塔基
 施工内容: 外线开始组塔
 拍摄时间: 2025.04.05 10:46
 天气: 雾 19°C 东南风 体感21°C
 地点: 防城港市防城区·公社路
 施工单位: 安城和电力建设有限公司
 建设单位: 防城港市新能源开发有限公司
 监理单位: 柳州正康电力工程监理有限公司

监理巡查 G28 外线开始组塔




工作记录
 施工区域: 广西防城港市那良镇范河村新农业新能源2.4.5兆瓦分布式光伏发电项目
 施工内容: 23号塔回弹强度
 拍摄时间: 2025.04.05 10:07
 天气: 阴 20°C
 地点: 防城港市防城区·大山
 施工单号: 请填入内容

监理巡查 G23 外线铁塔浇筑强度抽检

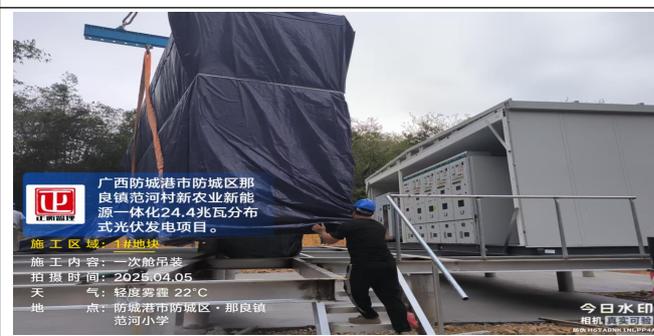

广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化2.4兆瓦分布式光伏发电项目
 施工区域: 1#地块
 施工内容: 一次舱吊装
 拍摄时间: 2025.04.05
 天气: 轻度雾霾 22°C
 地点: 防城港市防城区·那良镇范河小学

监理巡查光伏区一号地块一次舱吊装

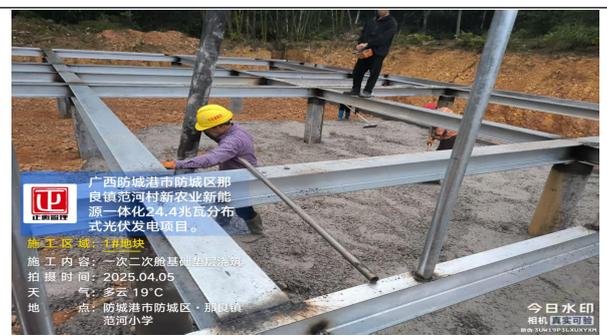

广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化2.4兆瓦分布式光伏发电项目
 施工区域: 1#地块
 施工内容: 一次二次舱基础垫层浇筑
 拍摄时间: 2025.04.05
 天气: 多云 19°C
 地点: 防城港市防城区·那良镇范河小学

监理巡查光伏区一号地块一次舱二次舱基础垫层浇筑



广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化2.4兆瓦分布式光伏发电项目
 施工区域: 1#地块
 施工内容: 一次舱吊装
 拍摄时间: 2025.04.05
 天气: 轻度雾霾 22°C
 地点: 防城港市防城区·219国道

监理巡查光伏区一号地块一次舱吊装

