

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 13 日 星期 日	气候	多云转阵雨	气温	17-25℃
监理单位 动态：2 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求	材料进场： 无				
施工方人员动态：主要管理人员:4 人, 施工员:6 人, 全站仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求.					
施工机械动态：挖机 1 台、打桩机 1 台、1104 型拖拉机 1 台、3 吨叉车一台，满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1、钢平台焊接，新增地块支架+5 号地 8，新增地块支架+5 号地 448，高压电缆施放 170 米。 2、高压电缆施放，电缆沟开挖，4 平方线放线穿管。				
监理今日工作内容	1、巡视检查钢平台焊接，新增地块支架+5 号地，新增地块支架+5 号地，高压电缆施放。 2、在宿舍整理资料。 3、填写监理日记。 4、组立 G3、G4、G23 铁塔、电缆井开挖、接地网开挖及焊接，完成 G5、G24、G25 铁塔组立，完成 D14 接地开挖及焊接。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	容岩峰		总监签阅	曹金亮	



监理巡查外线 G18 塔基础浇筑



监理巡查光伏区一号地块高压电缆敷设



监理巡查光伏区二号地块组件安装



监理巡查光伏二号地块支架安装



监理巡查光伏区二号地块 MC4 插头制作



监理巡查光伏区三号地块箱逆变一体机平台围栏加工




监理巡查光伏区三号地块汇流箱安装



监理巡查外线 G3 塔基塔材倒运



监理巡查外线 G4 塔基塔材倒运

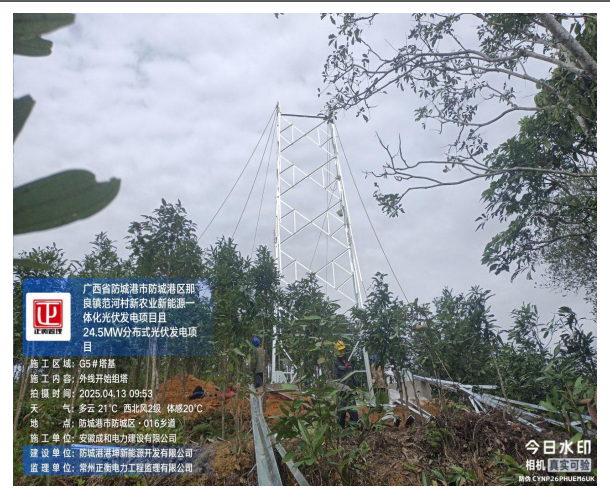

监理巡查外线 G5 塔基开始组塔



监理巡查外线 G25 塔基开始组塔



监理巡查外线 G24 塔基开始组塔



监理巡查外线 G18 塔基基础挖沟
