

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 20 日 星期 日	气候	阴	气温	24-31℃
监理单位 动态：2 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求		材料进场： 无			
施工方人员动态：土建施工人员进退场情况：管理人员 1 名、安全员 1 名、施工员 2 名、施工班组 5 名。安装施工人员进退场情况：管理员 2 名施工人员 16 名。					
施工机械动态：大型机械进退场情况：挖机 2 台、推土机一台、打桩机 1 台、1104 型拖拉机 1 台、3 吨叉车一台					
施工部位进度情况	1、3 号地 4 平方线 700 米，新增地块支架+5 号地 56，高压电缆施放 20 米，1 号、2 号、3 号、4 号、5 号箱变取油样送检，2 号、4 号箱变电缆耐压试验，5 号箱变保护装置调试及避雷器试验				
监理今日工作内容	1、巡视检查 3 号地 4 平方线，新增地块支架+5 号地，高压电缆施放。1 号、2 号、3 号、4 号、5 号箱变取油样送检，2 号、4 号箱变电缆耐压试验，5 号箱变保护装置调试及避雷器试验见证。 2、在宿舍整理资料。 3、填写监理日记。 4、G1 号至 G15 号塔导线紧线；G1 至 G18 号塔紧光缆，G18 至 G28 号铁塔展放光缆、敷设光伏站至 G01 号塔电缆及制作电缆头；敷设 G28 号塔至桂香站站外墙边新建电缆之间电缆；接地网开挖及焊接，完成 G2 号、G7 号耐张紧线及压接塔、G18 号至 G28 号塔牵引展放、完成 D4、D5 接地开挖及焊接。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	岑岩峰		总监签阅	岑岩峰	



广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化24.4兆瓦分布式光伏发电项目。

施工区域: 4#箱逆变器

施工内容: 油取样送检见证

拍摄时间: 2025.04.20

天气: 多云 26°C

地点: 防城港市防城区·219国道

今日水印
相机 [1.3.1.1]
微信: XSYUFGZJHRAWBY

监理巡查光伏区升压站 4 号箱变取油样



广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化24.4兆瓦分布式光伏发电项目。

施工区域: 1#箱逆变器

施工内容: 油取样送检见证

拍摄时间: 2025.04.20

天气: 多云 25°C

地点: 防城港市防城区·219国道

海拔: -2.3米

今日水印
相机 [1.3.1.1]
微信: XSYUFGZJHRAWBY

监理巡查光伏区升压站 1 号箱变取油样作



广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化24.4兆瓦分布式光伏发电项目。

施工区域: 2#箱逆变器

施工内容: 油取样送检见证

拍摄时间: 2025.04.20

天气: 多云 26°C

地点: 防城港市防城区·219国道

今日水印
相机 [1.3.1.1]
微信: THGSHYIHEGUPAN

监理巡查光伏区升压站 2 号箱变取油样



广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化24.4兆瓦分布式光伏发电项目。

施工区域: 3#箱逆变器

施工内容: 油取样送检见证

拍摄时间: 2025.04.20

天气: 多云 26°C

地点: 防城港市防城区·219国道

今日水印
相机 [1.3.1.1]
微信: XSYUFGZJHRAWBY

监理巡查光伏区升压站 3 号箱变取油样



广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化24.4兆瓦分布式光伏发电项目。

施工区域: 2#箱逆变器

施工内容: 箱逆变器耐压试验

拍摄时间: 2025.04.20

天气: 多云 25°C

地点: 防城港市防城区·219国道

海拔: 31.8米

今日水印
相机 [1.3.1.1]
微信: HSDDBZJLGPCC31

监理巡查光伏区 2 号箱变耐压试验



广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化24.4兆瓦分布式光伏发电项目。

施工区域: 2#箱逆变器

施工内容: 箱逆变器耐压试验

拍摄时间: 2025.04.20

天气: 多云 25°C

地点: 防城港市防城区·219国道

海拔: 31.8米

今日水印
相机 [1.3.1.1]
微信: HSDDBZJLGPCC31

监理巡查光伏区 2 号箱变耐压试验



监理巡查光伏区2号箱变耐压试验



监理巡查光伏区升压站接线



监理巡查外线 G27-G28 塔基封网



监理巡查外线 G18-G19 塔基封网



监理巡查外线 G14-G15 塔基封网



监理巡查外线 G11-G12 塔基封网



监理巡查外线 G4-G5 塔基封网



监理巡查外线 G1 塔基悬挂警示标识牌



监理巡查外线 G4-G5 塔基封网



监理巡查外线 G11-G12 塔基封网



监理巡查外线 G14-G15 塔基封网



监理巡查外线 G19-G28 塔基放牵引绳



监理巡查外线 G28 塔基电缆井



监理巡查外线 G28 塔基电缆井



监理巡查外线 G1-G15 塔基高压电缆、ABS 光缆敷设




监理巡查光伏区箱逆变一体机取油样



监理巡查光伏区 5 号箱变避雷器试验



监理巡查光伏区 5 号箱变保护装置调试

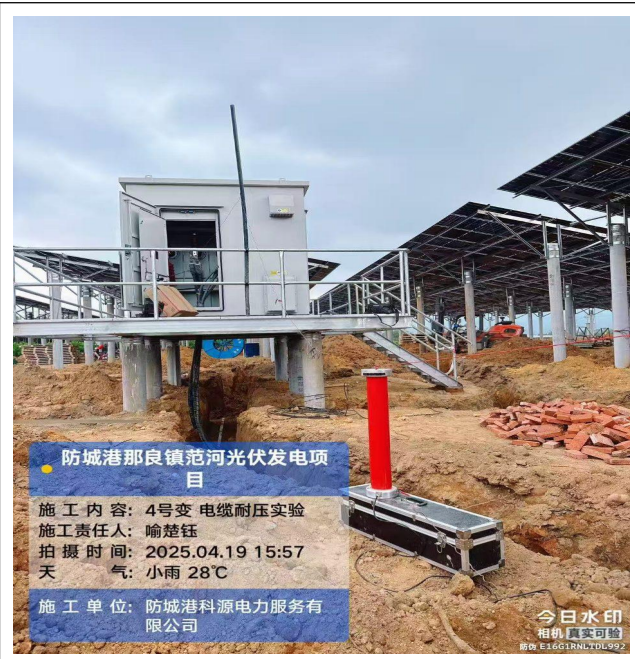

监理巡查光伏区 4 号箱变电缆耐压试验



监理巡查光伏区升压站 5 号箱变取油样
