

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目


日期	2025 年 04 月 22 日 星期 二	气候	阴	气温	24-32℃
监理单位 动态：3 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求		材料进场： 无			
施工方人员动态：土建施工人员进退场情况：管理人员 1 名、安全员 1 名、施工员 2 名、施工班组 5 名。安装施工人员进退场情况：管理员 2 名施工人员 16 名。					
施工机械动态：大型机械进退场情况：挖机 2 台、推土机一台、打桩机 1 台、1104 型拖拉机 1 台、3 吨叉车一台					
施工部位进度情况	1、光伏区 35KV 开关柜保护装置调试，35KVSVG 刀闸试验，35KVSVG 避雷器试验，35KVSVG 计数器试验，35KV 站用变电缆耐压试验，35KVSVG 电缆耐压试验，35KVSVG 间隔耐压试验，升压站保护调试，3 号地块电缆沟验收，3 号地块 1*4 电缆敷设，3 号地块接地验收。				
监理今日工作内容	1、巡视检查光伏区 35KV 开关柜保护装置调试，35KVSVG 刀闸试验，35KVSVG 避雷器试验，35KVSVG 计数器试验，35KV 站用变电缆耐压试验，35KVSVG 电缆耐压试验，35KVSVG 间隔耐压试验，升压站保护调试，3 号地块电缆沟验收，3 号地块 1*4 电缆敷设，3 号地块接地验收。 2、在宿舍整理资料。 3、填写监理日记。 4、G1 号至 G15 号塔导线紧线及附件安装；G18 至 G28 号铁塔展放导地线及紧线；G1、G18、G28 号塔光缆熔接；浇筑塔脚保护帽，完成 G11 号、G14 号耐张紧线及压接、G3-G6 号塔附件安装、G18 号至 G28 号塔 A、C 导线展放、完成 D10、D15-D17 塔脚保护帽浇筑。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	容岩峰		总监签阅	曹金亮	



监理巡查光伏区三号地块电缆沟验收



监理巡查光伏区三号地块电缆沟验收

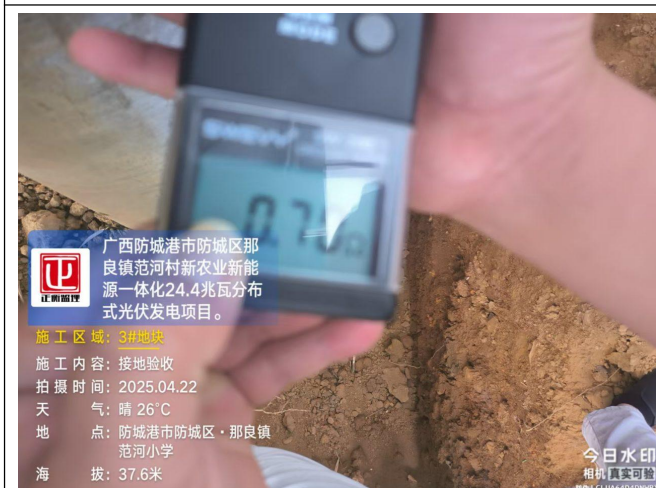


监理巡查光伏区三号地块电缆沟验收



监理巡查光伏区三号地块电缆沟验收



监理巡查光伏区三号地块 1*4 电缆敷设

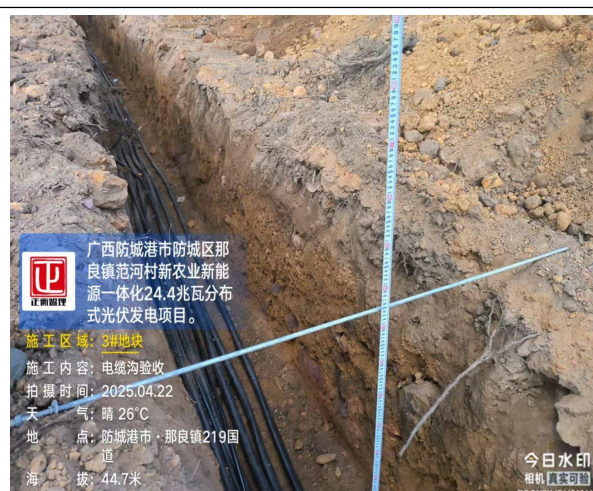

监理巡查光伏区三号地块电缆沟验收




监理巡查光伏区三号地块电缆沟验收



监理巡查光伏区升压保护调试




监理巡查光伏区升压保护调试

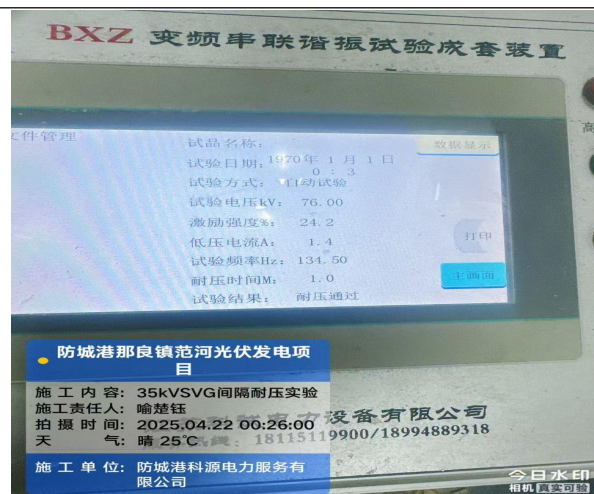


监理巡查光伏区升压站 35KV 隔离耐压试验




监理巡查光伏区升压站 35KV 用变电缆耐压试验

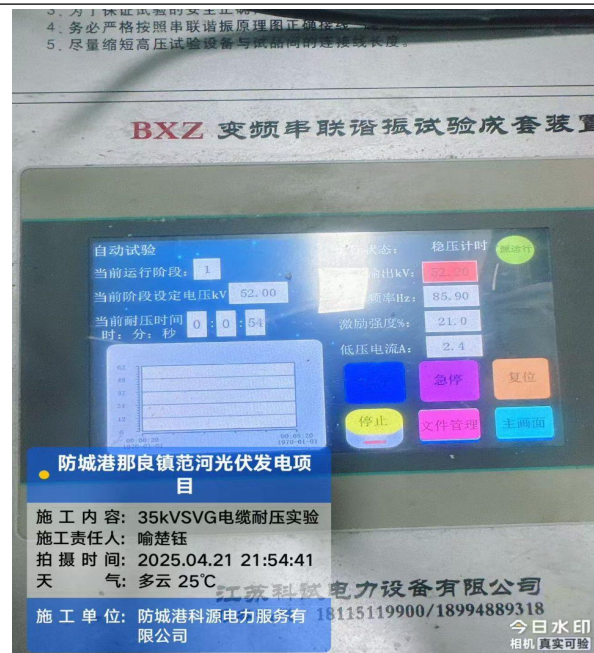

监理巡查光伏区升压站 35KV 电缆耐压试验

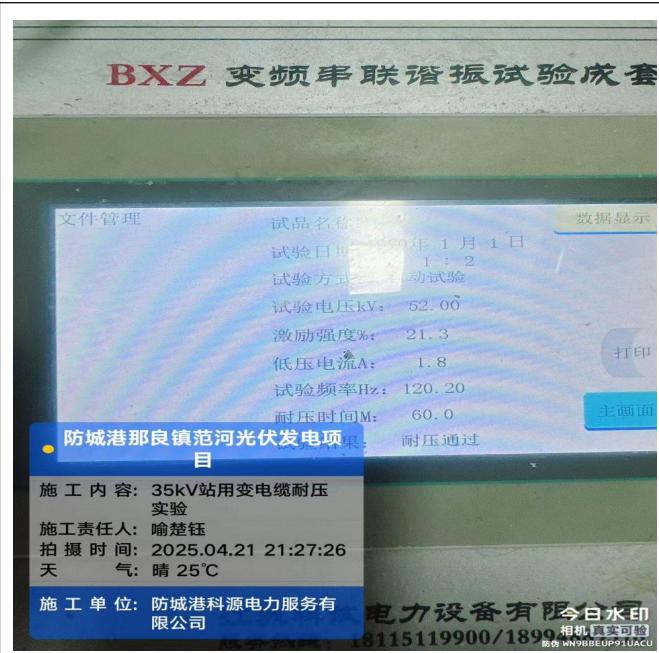

防城港那良镇范河光伏发电项目

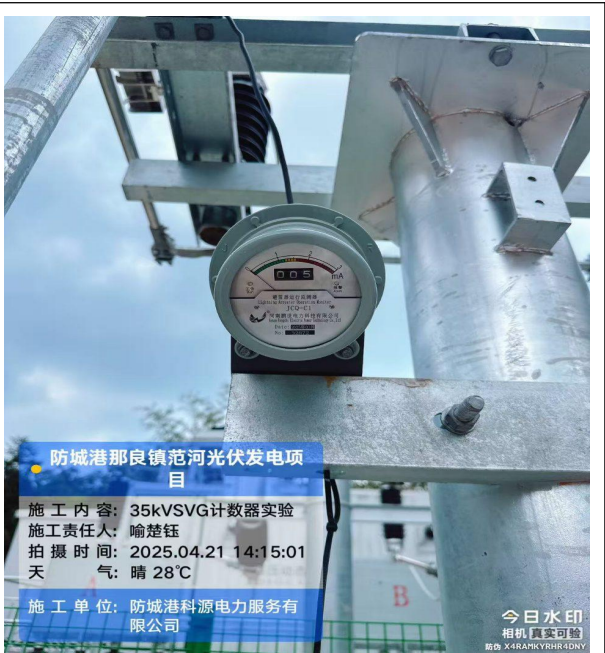

防城港那良镇范河光伏发电项目



防城港那良镇范河光伏发电项目



防城港那良镇范河光伏发电项目



防城港那良镇范河光伏发电项目



防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源—24.5MW分布式光伏发电项目

监理巡查光伏区升压站 35KV 变电站耐压试验

监理巡查光伏区升压站 35KVSVG 计数器试验

监理巡查光伏区升压站 35KVSVG 避雷器试验

监理巡查光伏区升压站 35KVSVG 刀闸试验

监理巡查光伏区升压站 35KV 开关柜保护装置调试

监理巡查外线 G18-G28 塔基开始拉线



广西壮族自治区防城港市防城区那良镇那利村新农业新能源一体化光伏发电项目
24.5MW分布式光伏发电项目
施工区域: G28#塔基
施工内容: 外线铁塔开始拉线
拍摄时间: 2025.04.22 15:28
天气: 晴 31°C 东南风3级 体感31°C
地点: 防城港市防城区·公社路/
施工单位: 安源和电力建设有限公司
建设单位: 防城港市新能源开发有限公司
监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪码: EAXBPH4H5K5Y21

监理巡查外线 G28 光纤熔接



广西壮族自治区防城港市防城区那良镇那利村新农业新能源一体化光伏发电项目
24.5MW分布式光伏发电项目
施工区域: G28#塔基
施工内容: 外线铁塔基础砌筑
拍摄时间: 2025.04.22 15:26
天气: 晴 31°C 东南风3级 体感31°C
地点: 防城港市防城区·公社路/
施工单位: 安源和电力建设有限公司
建设单位: 防城港市新能源开发有限公司
监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪码: ALBXAUC4453043

监理巡查外线 G28 塔基进站电缆井砌筑



广西壮族自治区防城港市防城区那良镇那利村新农业新能源一体化光伏发电项目
24.5MW分布式光伏发电项目
施工区域: G18#-G28 塔基
施工内容: 外线铁塔开始拉线
拍摄时间: 2025.04.22 15:03
天气: 晴 30°C 东南风3级 体感30°C
地点: 防城港市防城区·312省道
施工单位: 安源和电力建设有限公司
建设单位: 防城港市新能源开发有限公司
监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪码: A4UDC4NTG6Y99

监理巡查外线 G18-G28 塔基开始拉线



广西壮族自治区防城港市防城区那良镇那利村新农业新能源一体化光伏发电项目
24.5MW分布式光伏发电项目
施工区域: G3#塔基
施工内容: 外线铁塔附件安装
拍摄时间: 2025.04.22 14:41
天气: 晴 30°C 东南风3级 体感30°C
地点: 防城港市防城区·219国道
施工单位: 安源和电力建设有限公司
建设单位: 防城港市新能源开发有限公司
监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪码: R62UAB4222RD44

监理巡查外线 G3 塔基附件安装
