

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期	2025 年 02 月 28 日 星期 五	气候	晴	气温	9-24℃
监理单位 动态：2 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求		材料进场： 1. 8 米管桩到货 99 根。 2. 支架到货约 5 兆瓦。			
施工方人员动态：主要管理人员:4 人, 施工员:6 人, 全站仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求.					
施工机械动态：挖机 1 台, 推土机 1 台, 振动式打桩机 1 台, 满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1. 4 号地块支架安装 15 个。				
监理今日工作内容	1. 巡视检查四号地块支架安装，并熟悉现场。 2. 安全巡视检查 3. 学习图纸。 4. 填写监理日记。				
检查发现问题及处理措施	施工现场登高作业佩戴安全带，与总包沟通并要求其立即整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	岑岩峰		总监签阅	岑岩峰	




监理巡查四地块支架材料分料

监理巡查四地块支架材料分料



监理巡查四地块支架安装

监理巡查四地块支架安装

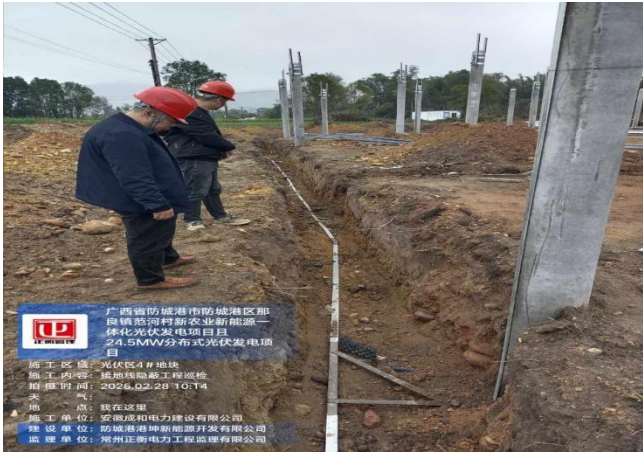

监理巡查四地块接地线隐蔽工程巡检

监理巡查四地块支架安装
