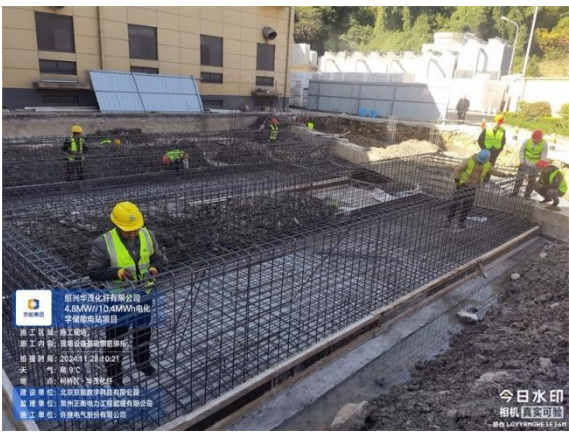


监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2024 年 11 月 28 日 天气：多云
 星期：四 气温： 3— 14℃
 工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站复查设 BMS 基础钢筋绑扎。 2、检查 BMS 基础承台模板支模加固情况。 3、全程旁站设备承台混凝土浇筑过程。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天上午现场共有 10 人，管理人员 1 人。 1、基础设备承台钢筋绑扎。 2、完成设备基础钢筋绑扎 100%。 3、PCS 基础承台支模完成 100%。 4、设备基础承台混能听浇筑完成 100%。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	BMS 基础承台钢筋绑扎	
照片		
文字描述	BMS 基础承台钢筋绑扎检查	
照片		
文字描述	现场设备基础承台混凝土浇筑	

照片

