

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2024 年 12 月 11 日

天气：小雨

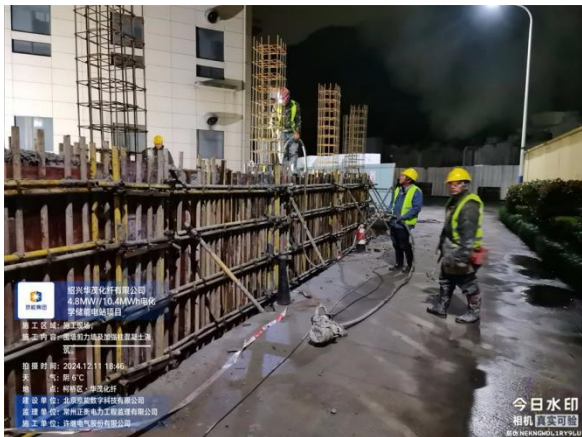
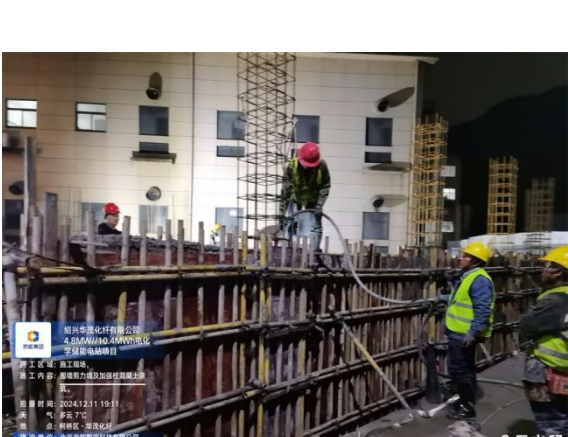
星期：三

气温: 2—11°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、昨天夜间及今天上午，现场小雨，无法施工。 2、今天下午完成浇筑围墙及加强柱 70%浇筑。 3、全程旁站现场浇筑施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天上午现场小雨无法施工，今天下午共有 10 人，管理人员 1 人。 1、完成围墙及加强柱 70%混凝土浇筑。 2、完成电缆沟混凝土浇筑。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	围墙及加强柱混凝土浇筑	围墙及加强柱混凝土浇筑
照片	 照片水印 宜兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MVA中化 孚远热电项目 施工内容:围墙及加强柱混凝土浇筑 拍摄时间:2024.12.11 16:48 天气:阴 6℃ 建设单位:无锡华茂化纤有限公司 监理单位:常州正泰电力工程有限公司 施工单位:开泰电气股份有限公司 相机:LAZYSHOT1500P1	 照片水印 宜兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MVA中化 孚远热电项目 施工内容:围墙及加强柱混凝土浇筑 拍摄时间:2024.12.11 17:06 天气:阴 6℃ 建设单位:无锡华茂化纤有限公司 监理单位:常州正泰电力工程有限公司 施工单位:开泰电气股份有限公司 相机:LAZYSHOT1500P1
文字描述	围墙及加强柱混凝土浇筑	围墙及加强柱混凝土浇筑
照片	 照片水印 宜兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MVA中化 孚远热电项目 施工内容:围墙及加强柱混凝土浇筑 拍摄时间:2024.12.11 19:46 天气:阴 6℃ 建设单位:无锡华茂化纤有限公司 监理单位:常州正泰电力工程有限公司 施工单位:开泰电气股份有限公司 相机:LAZYSHOT1500P1	 照片水印 宜兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MVA中化 孚远热电项目 施工内容:围墙及加强柱混凝土浇筑 拍摄时间:2024.12.11 19:11 天气:多云 7℃ 建设单位:无锡华茂化纤有限公司 监理单位:常州正泰电力工程有限公司 施工单位:开泰电气股份有限公司 相机:LAZYSHOT1500P1
文字描述		
照片		
