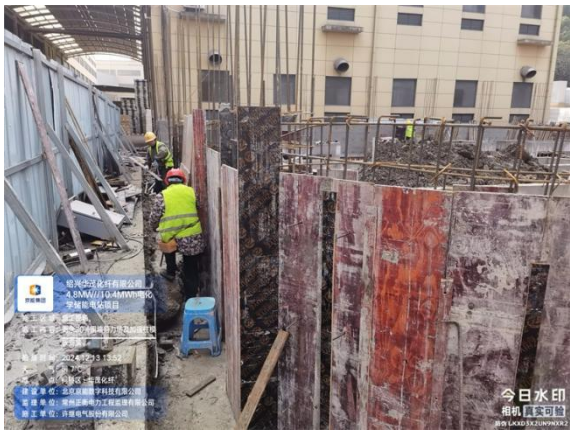


监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2024 年 12 月 13 日 天气：阴转小雨
 星期：五 气温： 4— 10℃
 工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查剩余 30%围墙剪力墙及加强柱模板安装情况。 2、检查 70%围墙剪力墙模板拆除情况。 3、召开监理例会。 4、全天旁站现场施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天上午现场小雨无法施工，今天下午共有 10 人，管理人员 1 人。 1、剩余 30%围墙剪力墙及加强柱模板安装施工。 2、70%围墙剪力墙及加强柱模板拆除。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	剩余 30%围墙剪力墙及加强柱模板筋安装	70%围墙剪力墙及加强柱模板拆除后混凝土浇筑质量检查
照片		
文字描述	70%围墙剪力墙及加强柱模板拆除	70%围墙剪力墙及加强柱模板拆除
照片		
文字描述	召开项目监理例会	召开项目监理例会
照片		
