

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 4 月 21 日

天气：多云转中雨

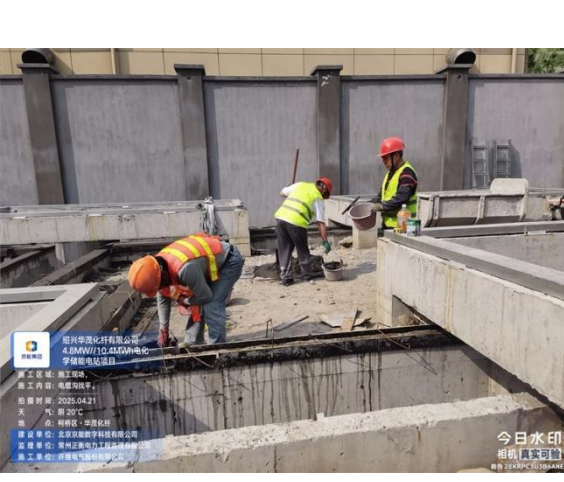
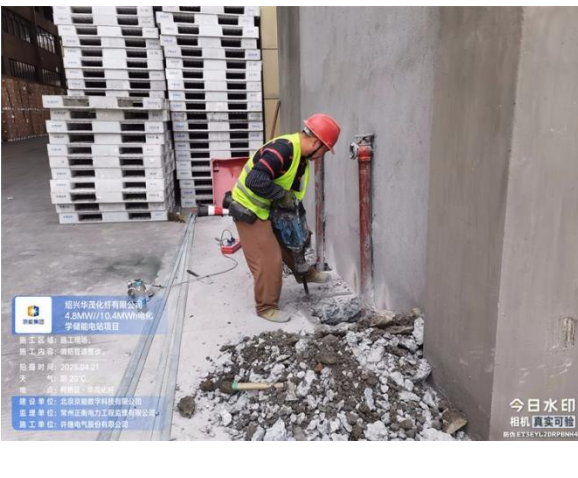
星期： 一

气温: 15-28°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查电缆沟顶找平施工。 2、检查华茂配电室 2 楼卫生间配电柜基础混凝土浇筑施工。 3、旁站综合保护柜、监控通讯柜倒运、就位施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 10 人在施工。 1、电缆沟顶找平施工 3 人。 2、华茂配电室配电柜基础浇筑 2 人。 3、综合保护柜、监控通讯柜倒运就位 5 人。
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述 照片	综合保护柜、监控通讯柜到场验收	综合保护柜、监控通讯柜倒运
	 综合保护柜、监控通讯柜到场验收	 综合保护柜、监控通讯柜倒运
文字描述 照片	综合保护柜、监控通讯柜就位	电缆沟顶找平施工
	 综合保护柜、监控通讯柜就位	 电缆沟顶找平施工
文字描述 照片	消防管道地上部分整改	华茂配电室2楼卫生间配电柜基础浇筑
	 消防管道地上部分整改	 华茂配电室2楼卫生间配电柜基础浇筑
