

## 监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 5 月 07 日

天气：多云

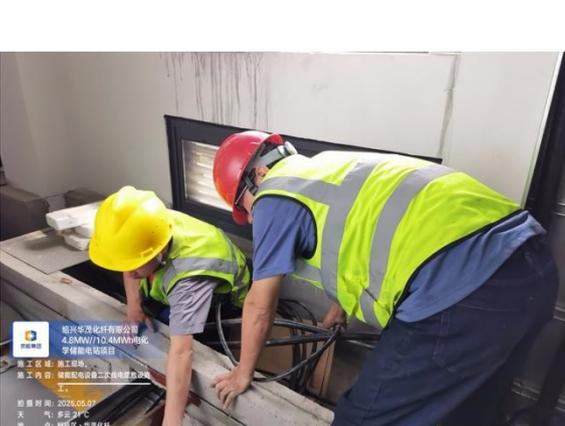
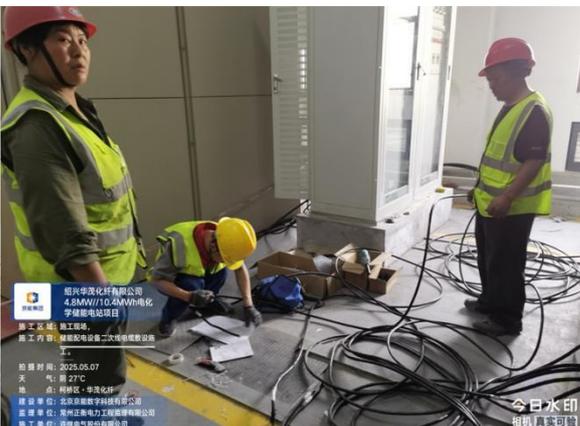
星期：三

气温：15-28℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站检查储能配电柜二次电缆敷设情况。 2、陪同绍兴电网公司王飞主任对现场进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 6 人，其中管理人员 2 人。 储能配电柜二次电缆线敷设施工。
其 他 项	绍兴电网王飞主任带 现场检查，对部分配电柜布置位置提出异议，要求现场暂时停止施工。	
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述	储能配电柜二次电缆线敷设施工	储能配电柜二次电缆线敷设施工
照片	 <p>储能配电柜二次电缆线敷设施工</p> <p>绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目</p> <p>施工区域: 施工现场 施工内容: 储能配电柜二次电缆线敷设</p> <p>拍摄时间: 2025.05.07 天气: 多云 21℃ 地点: 嵊州经济开发区 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 苏州工业园区工程咨询有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 相机号: 8911131104171</p>	 <p>储能配电柜二次电缆线敷设施工</p> <p>绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目</p> <p>施工区域: 施工现场 施工内容: 储能配电柜二次电缆线敷设</p> <p>拍摄时间: 2025.05.07 天气: 多云 21℃ 地点: 嵊州经济开发区 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 苏州工业园区工程咨询有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 相机号: 8911131104171</p>
文字描述	储能配电柜二次电缆线敷设施工	储能配电柜二次电缆线敷设施工
照片	 <p>储能配电柜二次电缆线敷设施工</p> <p>绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目</p> <p>施工区域: 施工现场 施工内容: 储能配电柜二次电缆线敷设</p> <p>拍摄时间: 2025.05.07 天气: 多云 21℃ 地点: 嵊州经济开发区 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 苏州工业园区工程咨询有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 相机号: 8911131104171</p>	 <p>储能配电柜二次电缆线敷设施工</p> <p>绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目</p> <p>施工区域: 施工现场 施工内容: 储能配电柜二次电缆线敷设</p> <p>拍摄时间: 2025.05.07 天气: 多云 21℃ 地点: 嵊州经济开发区 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 苏州工业园区工程咨询有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 相机号: 8911131104171</p>
文字描述	储能配电柜二次电缆线敷设施工	绍兴电网王飞主任到现场检查
照片	 <p>储能配电柜二次电缆线敷设施工</p> <p>绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目</p> <p>施工区域: 施工现场 施工内容: 储能配电柜二次电缆线敷设</p> <p>拍摄时间: 2025.05.07 天气: 晴 27℃ 地点: 嵊州经济开发区 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 苏州工业园区工程咨询有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 相机号: 8911131104171</p>	 <p>绍兴电网王飞主任到现场检查</p> <p>绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目</p> <p>施工区域: 施工现场 施工内容: 电网线路巡视检查</p> <p>拍摄时间: 2025.05.07 天气: 晴 27℃ 地点: 嵊州经济开发区 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 苏州工业园区工程咨询有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 相机号: 8911131104171</p>
