

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 5 月 22 日

天气：多云

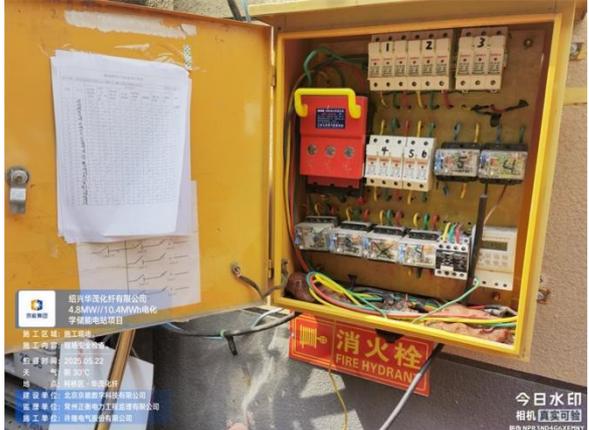
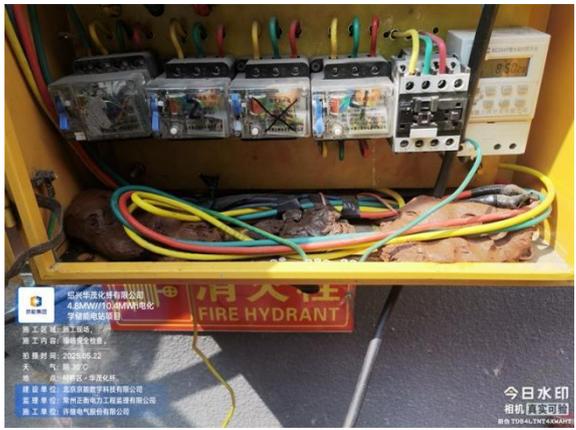
星期：四

气温：22-33℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今天现场因电网要求调整二次设备布置，设计单位暂未完成调整设计图纸，电气安装暂无法施工。 2、上午对现场进行安全检查，下午全程旁站 2 号电池仓储能电池安装施工。	
	施 工 情 况	
其 他 项	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 7 人施工，管理人员 1 人。 2 号电池仓储能电池安装 6 人;现场随车吊一台;叉车一台。到下午 7 点完成全部安装施工。
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

<p>文字描述</p>	<p>现场安全检查</p>	<p>现场安全检查</p>
<p>照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>2号电池仓储能电池安装</p>	<p>2号电池仓储能电池安装</p>
<p>照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>2号电池仓储能电池安装</p>	<p>2号电池仓储能电池安装</p>
<p>照片</p>		
