

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 5 月 27 日

天气：多云

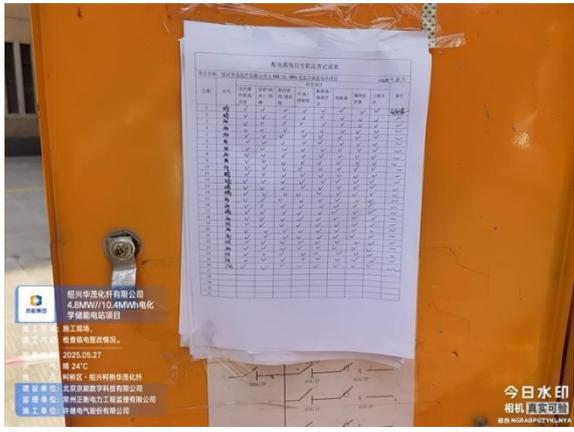
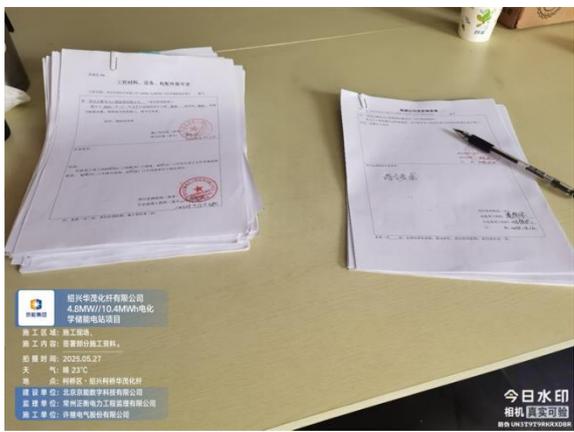
星期：二

气温：18-28℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1、今天现场因电网要求调整二次设备布置，设计单位暂未完成调整设计图纸，电气安装暂无法施工。</p> <p>2、检查现场安全整改情况：1) 复查临电配电箱检查记录;2)复查配电箱防火风度；3)复查临电接地情况;4)再次检查灭火器压力情况； 5) 复查现场安全警告标准布置情况。</p> <p>3、签署部分施工资料。</p> | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 许继电气股份有限公司 | 今天现场无人施工。 |
| 其 他 项 | | |
| 本日现场监理工作人员 | 郭俊兴 | |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： | |

工程现场照片

| | | |
|------|---|--|
| 文字描述 | 现场安全整改检查 | 现场安全整改检查 |
| 照片 |  <p>照片内容：黄色配电箱，贴有“警告 当心触电”警示标识，下方有“消防栓”标识。</p> |  <p>照片内容：张贴在橙色柜体上的安全检查清单表格。</p> |
| 文字描述 | 现场安全整改检查 | 现场安全整改检查 |
| 照片 |  <p>照片内容：配电箱内部，展示了复杂的电气线路、开关和端子排。</p> |  <p>照片内容：施工现场入口处的金属大门，门上贴有安全警示标志。</p> |
| 文字描述 | 现场安全整改检查 | 签署部分施工资料 |
| 照片 |  <p>照片内容：红色的手提式干粉灭火器，放置在施工现场。</p> |  <p>照片内容：办公桌上摆放着多份施工资料文件，旁边有一支笔。</p> |
