

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 5.月 29 日

天气：多云

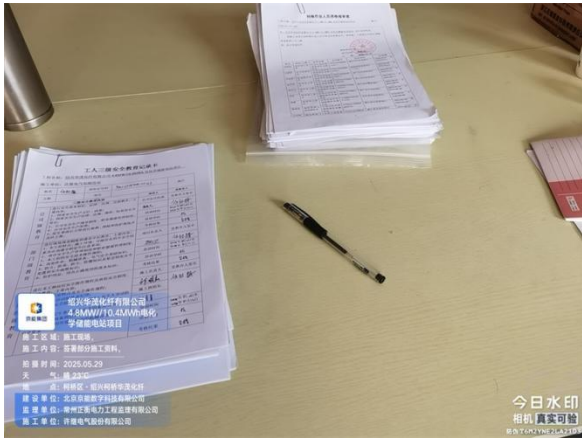
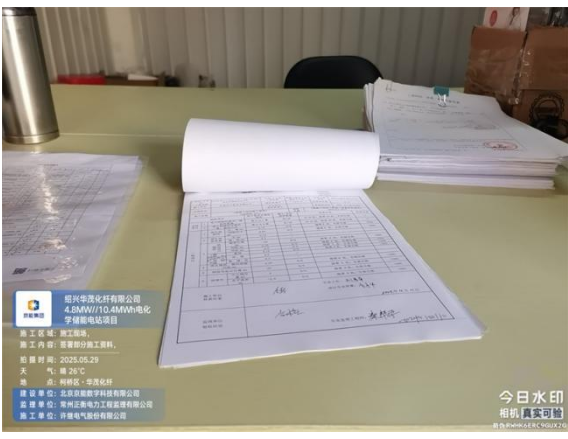
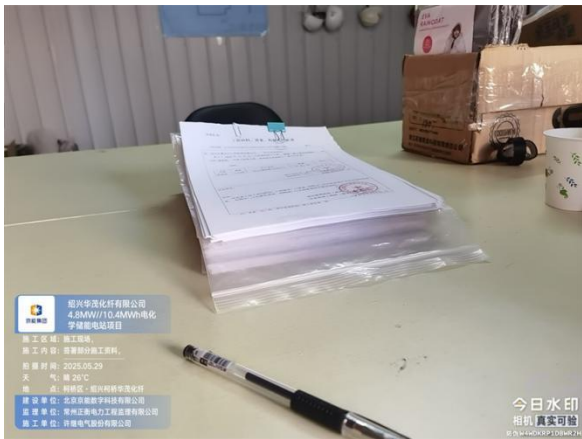
星期： 三

气温: 18-28°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今天现场因电网要求调整二次设备布置，设计单位暂未完成调整设计图纸，电气安装暂无法施工。 2、签署部分施工资料检验批。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场无人施工。
其 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	签署部分施工资料检验批	签署部分施工资料检验批
照片	 照片信息: - 施工单位: 烟台华源化纤有限公司 - 工程名称: 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 - 施工区域: 施工区域 - 施工内容: 签署部分施工资料 - 拍摄时间: 2025.05.29 - 天气: 晴 - 温度: 26℃ - 地点: 烟台华源化纤有限公司 - 建设单位: 北京华源数字科技有限公司 - 监理单位: 烟台华源电力工程有限公司 - 施工单位: 烟台华源化纤有限公司 今日水印 相机 真实可信	 照片信息: - 施工单位: 烟台华源化纤有限公司 - 工程名称: 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 - 施工区域: 施工区域 - 施工内容: 签署部分施工资料 - 拍摄时间: 2025.05.29 - 天气: 晴 - 温度: 26℃ - 地点: 烟台华源化纤有限公司 - 建设单位: 北京华源数字科技有限公司 - 监理单位: 烟台华源电力工程有限公司 - 施工单位: 烟台华源化纤有限公司 今日水印 相机 真实可信
文字描述	签署部分施工资料检验批	
照片	 照片信息: - 施工单位: 烟台华源化纤有限公司 - 工程名称: 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 - 施工区域: 施工区域 - 施工内容: 签署部分施工资料 - 拍摄时间: 2025.05.29 - 天气: 晴 - 温度: 26℃ - 地点: 烟台华源化纤有限公司 - 建设单位: 北京华源数字科技有限公司 - 监理单位: 烟台华源电力工程有限公司 - 施工单位: 烟台华源化纤有限公司 今日水印 相机 真实可信	
文字描述		
照片		
