

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 03 日

天气：多云

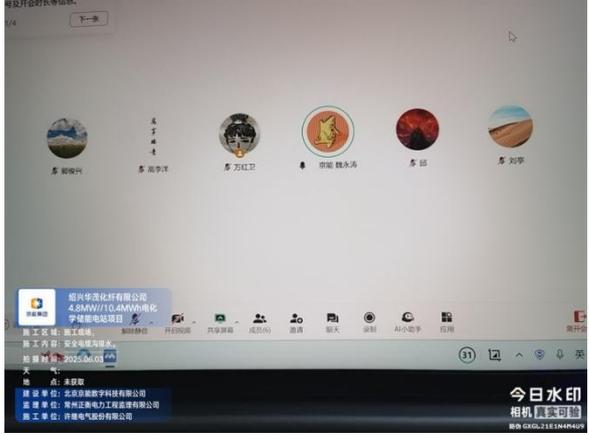
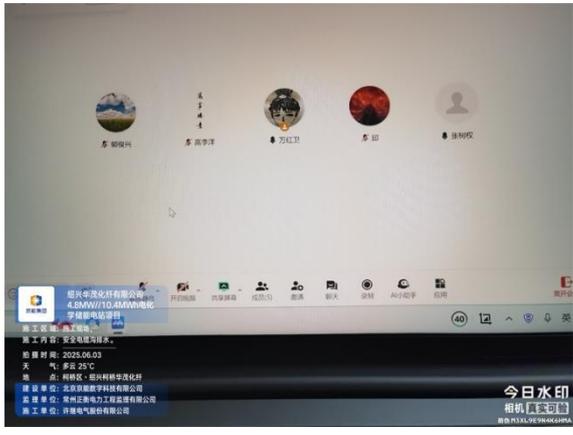
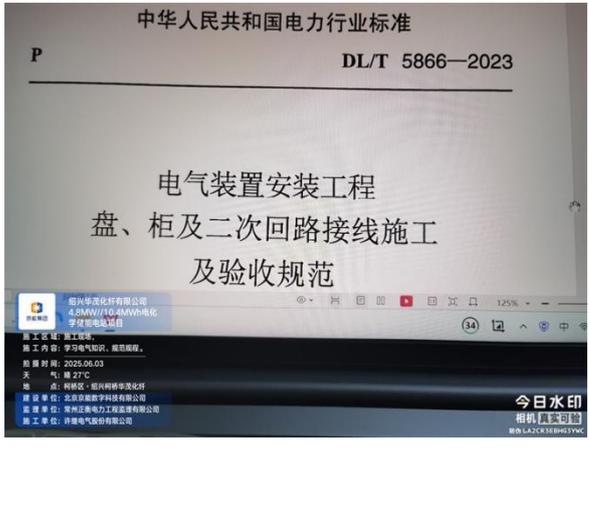
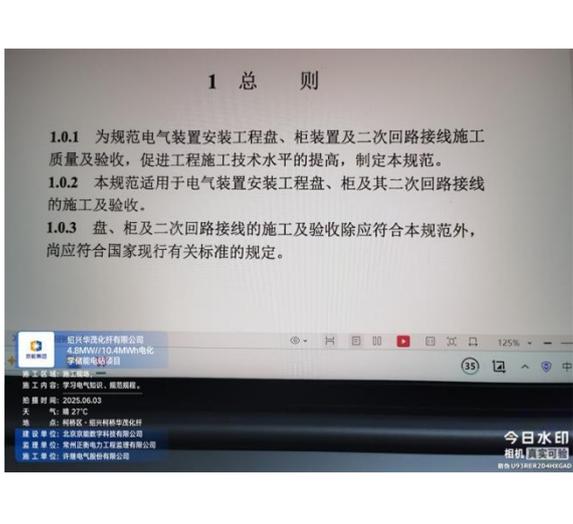
星期：一

气温：18-25℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、今天现场因电网要求调整二次设备布置，在电网到现场检查之前所有电缆已敷设完毕，故有 30%的原控制电缆作废，需要重新定制，至今定制的控制电缆暂未到场，现场无法施工。</p> <p>2、参加总包单位组织的项目进度协调会议。</p> <p>3、学习电气相关知识、规范规程。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场无人施工。
其 他 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述	项目进度协调会议	项目进度协调会议
照片		
文字描述	学习电气规范、规程	学习电气规范、规程
照片		
文字描述	学习电气规范、规程	学习电气规范、规程
照片	
