

监理日志（施工安全.施工质量）

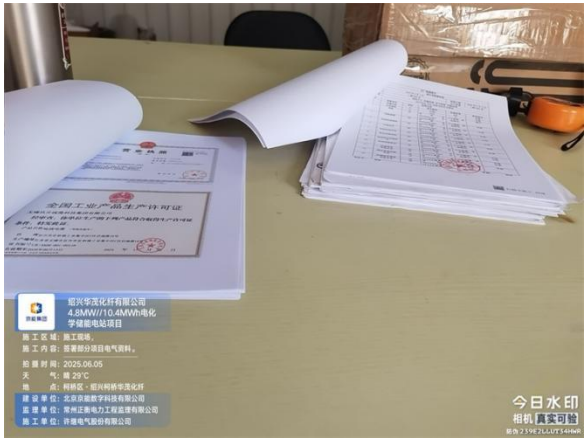
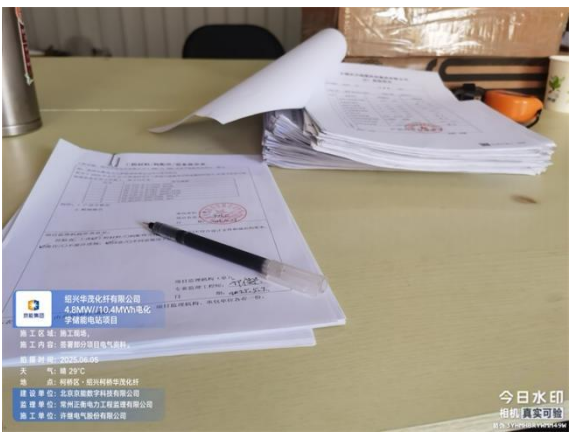
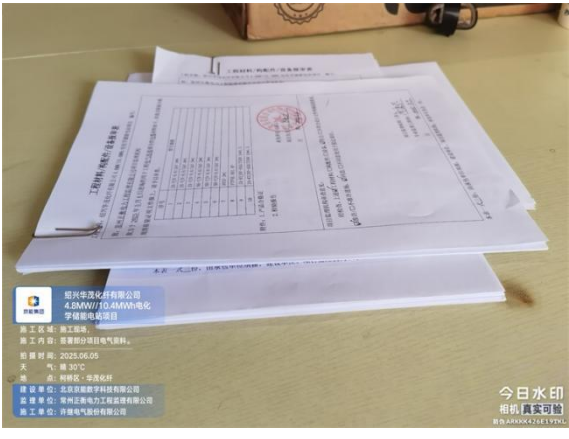
日期：2025 年 6 月 05 日
 天气：多云

星期： 三
 气温： 18-32℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今天现场因电网要求调整二次设备布置，在电网到现场检查之前所有电缆已敷设完毕，故有 30%的原控制电缆作废，需要重新定制，至今定制的控制电缆暂未到场，现场无法施工。 2、审核签署部分电气材料进场、施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场无人施工。
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	审核签署部分电气材料进场、施工资料	审核签署部分电气材料进场、施工资料
照片	 今日水印 相机 真实可信 水印 25923243754466	 今日水印 相机 真实可信 水印 3153208243754466
文字描述	审核签署部分电气材料进场、施工资料	审核签署部分电气材料进场、施工资料
照片	 今日水印 相机 真实可信 水印 81623243754466	 今日水印 相机 真实可信 水印 81623243754466
文字描述		
照片		
