

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 08 日

天气：中到大雨

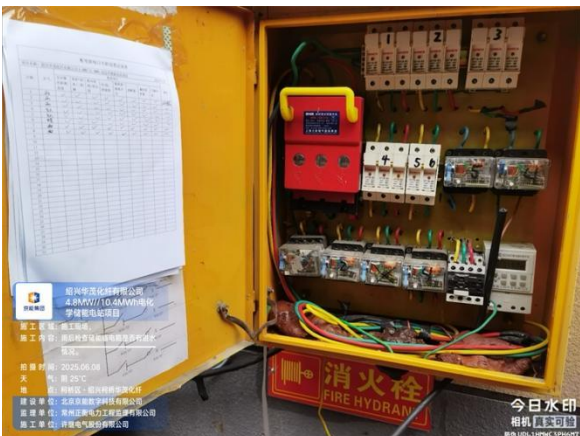
星期： 日

气温: 18-28°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今天现场因电网要求调整二次设备布置，在电网到现场检查之前所有电缆已敷设完毕，故有 30%的原控制电缆作废，需要重新定制，至今定制的控制电缆暂未到场，现场无法施工。 2、因今天降大雨，对现场进行如下检查： 1) 检查储能机柜室漏雨情况； 2) 检查储能电缆沟积水情况； 3) 检查现储能场临电安全情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场无人施工。
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	检查储能机柜室漏雨情况	检查春电缆沟积水情况
照片	 照片显示储能机柜室内部，地面有明显积水，表明存在漏雨情况。	 照片显示电缆沟内部，沟底有积水，表明存在积水情况。
文字描述	检查春电缆沟积水情况	检查春电缆沟积水情况
照片	 照片显示电缆沟内部，沟底有积水，表明存在积水情况。	 照片显示电缆沟内部，沟底有积水，表明存在积水情况。
文字描述	检查储能现场临电安全情况	检查储能现场临电安全情况
照片	 照片显示储能现场临时用电配电箱，箱内安装有漏电保护器、断路器等安全设备，旁边放置有灭火器，表明正在检查临电安全情况。	 照片显示储能现场临时用电配电箱，箱内安装有漏电保护器、断路器等安全设备，旁边放置有灭火器，表明正在检查临电安全情况。
