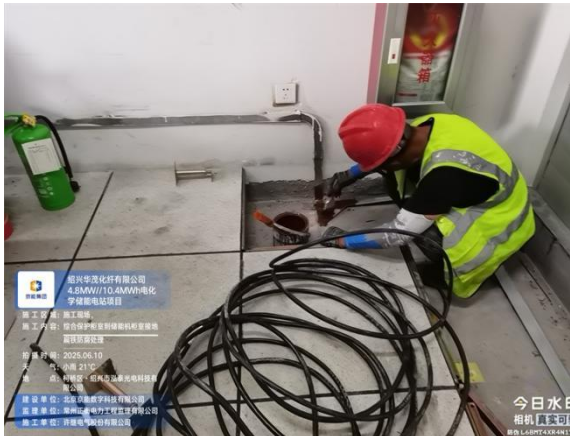


监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 10 日 天气：全天小到中雨
 星期： 二 气温： 18-28℃
 工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查原交直流屏柜基础拆除清理情况。 2、检查从华茂控制室到储能机柜室电缆桥架改造情况。 3、检查储能机柜室接地扁铁焊接、防腐处理情况。 4、检查旁站 1 号储能电池仓接地整改情况。 5、查找储能机柜室漏雨源头并处理完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 6 人在施工。 1、情况交直流屏柜基础拆除垃圾。 2、完成从华茂控制室到储能机柜室电缆桥架改造施工。 3、完成储能机柜室接地扁铁焊接、防腐施工。 4、完成 1 号储能电池仓接地整改。
其 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	从华茂控制室到储能机会室电缆桥架改造	1号储能电池仓接地整改
照片	  储能电站 施工单位: 华茂石化有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 储能机柜室电缆桥架改造 拍摄时间: 2025.06.10 天气: 小雨 22°C 地点: 桐城市 - 华茂石化有限公司 监理单位: 北京国电智通科技有限公司 建设单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 P033429WTD62C	  储能电站 施工单位: 华茂石化有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 设备内部焊接 拍摄时间: 2025.06.10 天气: 小雨 22°C 地点: 桐城市 - 华茂石化有限公司 监理单位: 北京国电智通科技有限公司 建设单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 Y0033429WTD62C
文字描述	储能机柜室接地扁铁焊接	接地扁铁焊接处防腐处理
照片	  储能电站 施工单位: 华茂石化有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 储能机柜室接地扁铁 拍摄时间: 2025.06.10 天气: 小雨 22°C 地点: 桐城市 - 华茂石化有限公司 监理单位: 北京国电智通科技有限公司 建设单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 P033429WTD62C	  储能电站 施工单位: 华茂石化有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 综合保护柜至储能机柜室接地扁铁防腐处理 拍摄时间: 2025.06.10 天气: 小雨 21°C 地点: 桐城市 - 华茂石化有限公司 监理单位: 北京国电智通科技有限公司 建设单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 L00PT4X6K41T5
文字描述	储能机柜室漏雨源开孔查找	储能机柜室接地扁铁防腐处理
照片	  储能电站 施工单位: 华茂石化有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 储能机柜室漏雨开孔检查 拍摄时间: 2025.06.10 天气: 小雨 22°C 地点: 桐城市 - 华茂石化有限公司 监理单位: 北京国电智通科技有限公司 建设单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 K110P6G23J0B9D	  储能电站 施工单位: 华茂石化有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 储能机柜室接地扁铁防腐、防腐处理 拍摄时间: 2025.06.10 天气: 小雨 22°C 地点: 桐城市 - 华茂石化有限公司 监理单位: 北京国电智通科技有限公司 建设单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 K110P6G23J0B9D
