

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 13 日

天气：小雨转多云

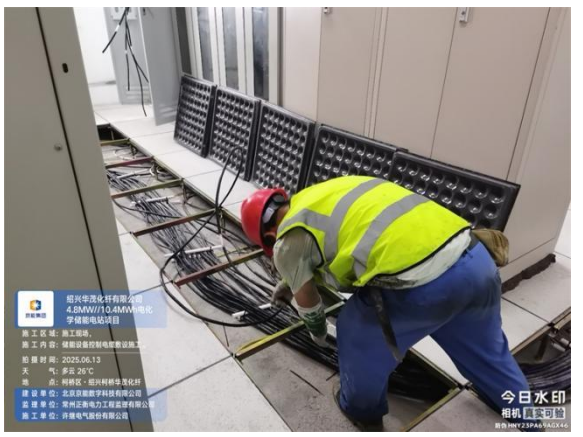
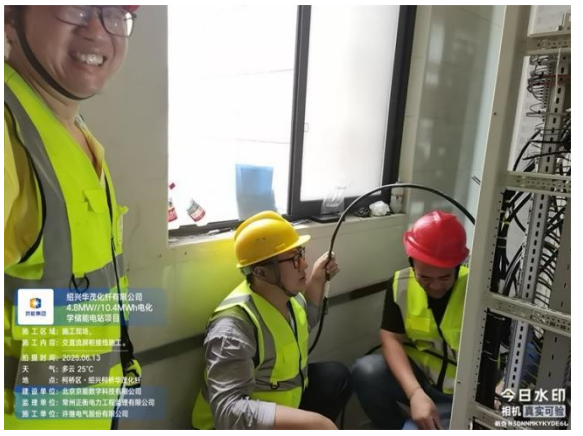
星期： 五

气温: 23-30°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站检查控制电缆敷设施工。 2、旁站检查交直流屏柜接线施工，返现接线施工直流不满足要求;接线人员对接线工艺要求不熟悉，已要求施工单位进行返工并更换接线人员。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 6 人在施工。 1、储能电气设备控制电缆调整敷设施工。 2、储能交直流屏柜接线施工。 3、储能交直流屏柜单体调试施工。
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	储能控制电缆及通讯光纤敷设施工	
照片		
文字描述	储能控制电缆及通讯光纤敷设施工	
照片		
文字描述	储能交直流屏柜接线及调试	
照片		
