

监理日报

项目名称		郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目									
建设单位		郎溪申宣新能源科技有限公司				项目负责人					
承包单位		浙江玉信电力建设有限公司				项目经理	胡江浩				
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司				项目总监	张献兵	项目总代	姜旭	记录员	何冰
填报日期		2025.02.20（星期三）			天气	阴转小雨 温度：2~8℃ 风力：1~2 级					
当日进度	人员安排		管理人员：1人；施工人员：8人；监理：1人								
	机械车辆		曲臂车 1 台 升降车 1 台								
	材料到货		无								
	施工进展		1. 2#车间斜撑及贴板安装 2. 直流桥架打孔穿管 3. 接地扁铁安装 4. 下午下雨屋面无人施工								
	安全工作		现场人员安全用品佩戴。								
明日计划	人员安排		管理人员：1人；施工人员：8人；								
	材料到货		无								
	安全工作		现场人员安全用品佩戴，安全防护物资持续检查。								
	施工内容		1. 2#车间斜撑及贴板安装 2. 直流电缆敷设 3. 桥架安装								
主要材料到货情况											
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家	验收情况		
1	压块	6063-T5	MW	2.18817	0	2.18817	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	已验收		
2	常规支架	导轨 30*40*1.2 夹具新 B 角尺 60 长	MW	2.18817	0	2.18817	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	因设计变更未验收		
3	围栏材料/爬梯材料	横梁 30*30*4 斜梁 30*30*4*1157 立柱 50*50*3*110	MW	2.18817	0	2.18817	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技	安全围栏材料已验收，爬梯材料与图		

监理日报

		爬梯角刚 40*4 爬梯扁铁 40*4 爬梯圆管 32*3						有 限 公 司	纸不符
4	组件	615w	块	3558	0	3567 备件 6 块	100%	天合光能股份有限公司	已验收
5	逆变器	150W/100W/50W/ 40W	台	16	0				
6	接地扁铁	40*4	m	1620	0	1700	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	已验收
7	铝合金桥架	100*100*1.2 200*100*1.2 150*100*1.2 300*100*1.5 500*100*2.0	m	1075	0	1190	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	未验收材料存在误差
8	运维通道	运维通道 203*50*100 角钢 30*30*4	m	940/1884	0	940/1884	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	已验收
9	直流电缆	PV1-F-1x4 m ²	m	36000	12000	26000	72%	江苏上上电缆集团有限公司	已验收
10	交流电缆								
11	视频监控								
12	清洗系统								
13	并网柜								
14	采光带防坠网								
15	3#车间加固钢板	Q355 钢板 / 螺栓 M12*35*58.8	吨/套	3.762/2288	0	3.762/2288	100%	江苏沙钢物资贸易有限公司	进场前已加固完成未提供材料报审未验收
16	2#车间钢管及系杆	- 5XΦ121X2236 - 4XΦ114X7300	米	163	0	163	100%	江苏沙钢物资贸易有	已验收

监理日报

17	2#车间连接板	- 12X200X240 - 8X125X500 - 8X120X220 - 8X220X220	块	274	0	274	100%	限公司 江苏沙 钢物资 贸易有 限公司	未验收
工程建设施工进度情况									
序号	部位	工作内容	单位	总 工程量	当日 完成量		累计 累计量	完成 比率	
1	彩钢瓦屋面	安全围栏安装	MW	2.18817	5%		85%	85%	
		采光带防坠网安装	MW	2.18817					
		支架安装	MW	2.18817	3%		98%	98%	
		桥架安装	MW	2.18817	3%		78%	78%	
		组件安装	块	3558					
		直流电缆敷设	m	36000					
		逆变器安装	台	16					
		防雷接地	m	1620	3%		30%	30%	
		清洗洗系统安装	套	2					
		交流电缆敷设	m	1013					
		监控系统	套	5					
		运维通道安装	m	940/1884	1%		95%	95%	
		并网柜安装	台	5					
2	3#车间	钢结构加固	T	3.762	100%		100%	100%	
3	2#车间	钢结构加固	米	163	10%		48%	48%	

监理日报

7	逆变器安装	台	16		
8	防雷接地	m	1620	30%	30%
9	清洗洗系统安装	套	2		
10	交流电缆敷设	套	1013		
11	监控系统	套	5		
12	运维通道安装	米	940/1884	95%	95%
13	并网柜安装	台	5		
14	3#车间钢结构加固	T	3.762	100%	100%
15	2#车间钢结构加固	米	163	48%	48%


- 1、工程施工安全：现场人员安全用品佩戴。
- 2、工程施工质量：检查现场加固安装质量情况，检查直流桥架打孔穿管质量情况，检查接地扁铁安装质量情况。
- 3、问题：
- 4、其他：

监理日报

附一：施工过程及监督检查图片



2#车间加固贴板安装

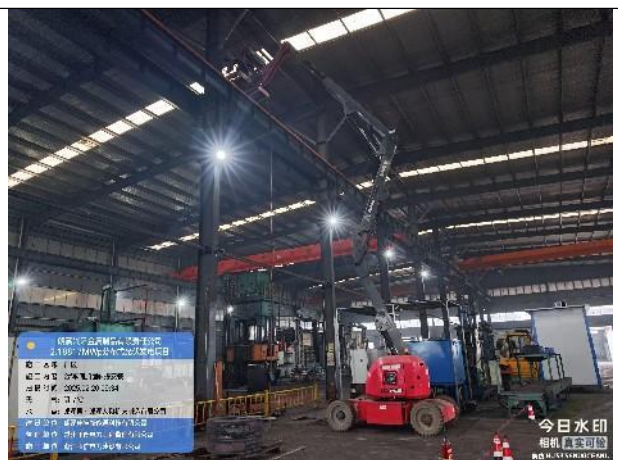

2#车间加固斜撑安装



直流桥架打孔穿管



接地扁铁安装

附一：存在的问题照片

无
