

监理日报

项目名称		郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目									
建设单位		郎溪申宣新能源科技有限公司				项目负责人					
承包单位		浙江玉信电力建设有限公司				项目经理	胡江浩				
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司				项目总监	张献兵	项目总代	姜旭	记录员	何冰
填报日期		2025.03.24（星期一）			天气	晴 温度：14~29℃ 风力：3~4 级					
当日进度	人员安排		管理人员：1人；施工人员：12人；监理：1人								
	机械车辆		叉车 1 辆								
	材料到货		交流电缆进场								
	施工进展		1. 组件安装 2. 接地扁铁安装 3. 室外并网柜接地扁铁焊接 4. 电缆井电缆沟并网柜基础垫层浇筑 5. 逆变器雨棚焊接 6. 电缆井并网柜筏板钢筋绑扎								
	安全工作		现场人员安全用品佩戴。								
明日计划	人员安排		管理人员：1人；施工人员：12人；								
	材料到货		交流电缆进场								
	安全工作		现场人员安全用品佩戴，安全防护物资持续检查。								
	施工内容		1. 组件安装 2. 电缆沟管道预埋电缆井并网柜筏板钢筋绑扎 3. 逆变器雨棚安装 4. 组件直流电缆跨接线绑扎								
主要材料到货情况											
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家	验收情况		
1	压块	6063-T5	MW	2.18817	0	2.18817	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	已验收		
2	常规支架	导轨 30*40*1.2 夹具新 B 角尺 60 长	MW	2.18817	0	2.18817	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	因设计变更未验收		

监理日报

3	围栏材料 /爬梯材料	横梁 30*30*4 斜梁 30*30*4*1157 立柱 50*50*3*110 爬梯角刚 40*4 爬梯扁铁 40*4 爬梯圆管 32*3	MW	2.18817	0	2.18817	100%	天津市 聚鑫云 鹏新能 源科技 有限公 司	安全围栏 材料已验 收,爬梯 材料与图 纸不符
4	组件	615w	块	3558	0	3567 备件 6 块	100%	天合光 能股份 有限公 司	已验收
5	逆变器	150W/100W/50W/ 40W	台	16	0	16	100%	阳光电 源股份 有限公 司	已验收
6	接地扁铁	40*4	m	1620	0	2000	100%	天津市 聚鑫云 鹏新能 源科技 有限公 司	已验收
7	铝合金桥架	100*100*1.2 200*100*1.2 150*100*1.2 300*100*1.5 500*100*2.0	m	1075	0	1190	100%	天津市 聚鑫云 鹏新能 源科技 有限公 司	未验收材 料存在误 差
8	运维通道	运维通道 203*50*100 角钢 30*30*4	m	940/1884	0	940/1884	100%	天津市 聚鑫云 鹏新能 源科技 有限公 司	已验收
9	直流电缆	PV1-F-1x4 m²	m	36000	0	36000	100%	江苏上 上电缆 集团有 限公司	已验收
10	交流电缆	ZC-YJLHV22- 0.6kV/1kV 3*150+1*70/ZC- YJLHV22- 0.6kV/1kV 3*120+1*70/ZC- YJLHV22- 0.6kV/1kV	Km	2.035	80%	2.035	80%	江苏上 上电缆 集团有 限公司	未验收资 料未及时 提供且未 包含并网 电缆

监理日报

		3*35+1*16							
11	视频监控								
12	清洗系统								
13	并网柜	GGD	台	5	0	5	100%	浙江正泰电气科技有限公司	已验收
14	采光带防坠网	采光带防护网及支架 50*5*1000*2000 41*41*2.0	块/支	490/670	0	490/670	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	已验收
15	3#车间加固钢板	Q355 钢板 / 螺栓 M12*35*58.8	吨/套	3.762/2288	0	3.762/2288	100%	江苏沙钢物资贸易有限公司	已验收
16	2#车间钢管及系杆	- 5XΦ121X2236 - 4XΦ114X7300	米	163	0	163	100%	江苏沙钢物资贸易有限公司	已验收
17	2#车间连接板及直拉条	- 12X200X240 - 8X125X500 - 8X120X220 Φ12	块/条	274/68	0	274/68	100%	江苏沙钢物资贸易有限公司	已验收
18	室外并网柜基础材料进场	CPVCΦ100/50	米	132/642	0	132/642	100%	宣城凯成电力科技有限公司	已验收
19	室外并网柜基础钢筋	14Φ/12Φ/8Φ	支	75/51/88	0	75/51/88	100%	铜陵市富鑫钢铁有限公司	未验收未提供相应资料

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计累计量	完成比率
1	彩钢瓦屋面	安全围栏安装	MW	2.18817	6%	96%	96%
		采光带防坠网安装	MW	2.18817	35%	100%	100%
		支架安装	MW	2.18817	3%	100%	100%

监理日报

		桥架安装	MW	2.18817	1%	91%	91%
		组件安装	块	3558	5%	67%	67%
		直流电缆敷设	m	36000	20%	100%	100%
		逆变器安装	台	16	1%	97%	97%
		防雷接地	m	1620	1%	98%	98%
		清洗洗系统安装	套	2			
		交流电缆敷设	m	1013			
		监控系统	套	5			
		运维通道安装	m	940/1884	5%	100%	100%
		并网柜安装	台	5	7%	34%	34%
2	3#车间	钢结构加固	T	3.762	100%	100%	100%
3	2#车间	钢结构加固	米	163	3%	100%	100%

监理情况

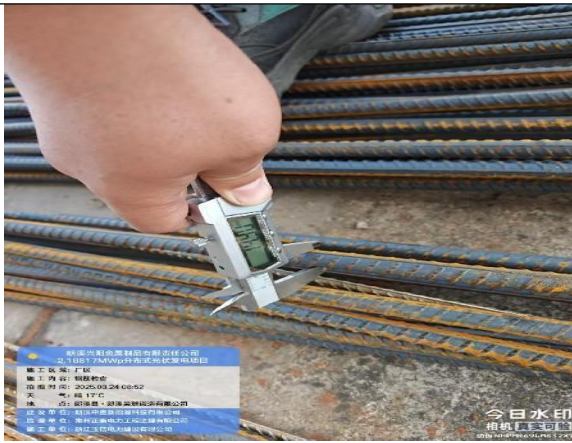
1、工程整体进度：
 工程总体进度完成量：
 其主要分项工程完成量如下：

序号	工作内容	单位	总工程量	累计完成量	完成比率
1	安全围栏安装	MW	2.18817	96%	96%
2	采光带防坠网安装	MW	2.18817	100%	100%
3	支架安装	MW	2.18817	100%	100%
4	桥架安装	MW	2.18817	91%	91%
5	组件安装	块	3558	67%	67%
6	直流电缆敷设	m	36000	100%	100%
7	逆变器安装	台	16	97%	97%
8	防雷接地	m	1620	98%	98%
9	清洗洗系统安装	套	2		
10	交流电缆敷设	套	1013		
11	监控系统	套	5		
12	运维通道安装	米	940/1884	100%	100%
13	并网柜安装	台	5	34%	34%
14	3#车间钢结构加固	T	3.762	100%	100%
15	2#车间钢结构加固	米	163	100%	100%

监理日报

- 1、工程施工安全：现场人员安全用品佩戴。
- 2、工程施工质量：检查组件安装质量情况、检查接地扁铁安装质量情况、检查室外并网柜基础接地扁铁焊接质量情况、检查电缆井并网柜基础筏板钢筋绑扎情况、检查逆变器雨棚焊接情况、检查进场交流电缆型号规格、旁站电缆沟电缆井及并网柜基础垫层浇筑。
- 3、问题：
- 4、其他：

附一：施工过程及监督检查图片

	
钢筋检查	钢筋检查
	
电缆沟电缆井并网柜垫层浇筑	电缆井并网柜底板钢筋绑扎

监理日报



并网柜基础接地扁铁焊接



交流电缆进场卸货



接地扁铁安装



电缆井底板钢筋检查



逆变器雨棚焊接



电缆井底板钢筋检查

附一：存在的问题照片

无
