

监理日报

项目名称	郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目									
建设单位	郎溪申宣新能源科技有限公司				项目负责人					
承包单位	浙江玉信电力建设有限公司				项目经理	胡江浩				
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司				项目总监	张献兵	项目总代	姜旭	记录员	何冰
填报日期	2025.03.29 (星期六)			天气	阴 温度: 5~11℃ 风力: 3~4级					
当日进度	人员安排	管理人员: 1人; 施工人员: 10人; 监理: 1人								
	机械车辆	无								
	材料到货	无								
	施工进展	1. 组件安装 2. 交流桥架安装 3. 逆变器雨棚安装 4. 电缆沟电缆井钢筋绑扎								
	安全工作	现场人员安全用品佩戴。								
明日计划	人员安排	管理人员: 1人; 施工人员: 10人;								
	材料到货	无								
	安全工作	现场人员安全用品佩戴, 安全防护物资持续检查。								
	施工内容	1. 组件安装 2. 电缆井并网柜基础支模板 3. 交流桥架安装 4. 逆变器雨棚安装								
主要材料到货情况										
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家	验收情况	
1	压块	6063-T5	MW	2.18817	0	2.18817	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	已验收	
2	常规支架	导轨 30*40*1.2 夹具新 B 角尺 60 长	MW	2.18817	0	2.18817	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	因设计变更未验收	
3	围栏材料/爬梯材料	横梁 30*30*4 斜梁	MW	2.18817	0	2.18817	100%	天津市聚鑫云	安全围栏材料已验	

监理日报

		30*30*4*1157 立柱 50*50*3*110 爬梯角刚 40*4 爬梯扁铁 40*4 爬梯圆管 32*3						鹏新能 源科技 有限公 司	收, 爬梯 材料与图 纸不符
4	组件	615w	块	3558	0	3567 备件 6 块	100%	天合光 能股份 有限公 司	已验收
5	逆变器	150W/100W/50W/ 40W	台	16	0	16	100%	阳光电 源股份 有限公 司	已验收
6	接地扁铁	40*4	m	1620	0	2000	100%	天津市 聚鑫云 鹏新能 源科技 有限公 司	已验收
7	铝合金桥架	100*100*1.2 200*100*1.2 150*100*1.2 300*100*1.5 500*100*2.0	m	1075	0	1190	100%	天津市 聚鑫云 鹏新能 源科技 有限公 司	未验收材 料存在误 差
8	运维通道	运维通道 203*50*100 角钢 30*30*4	m	940/1884	0	940/1884	100%	天津市 聚鑫云 鹏新能 源科技 有限公 司	已验收
9	直流电缆	PV1-F-1x4 m ²	m	36000	0	36000	100%	江苏上 上电缆 集团有 限公司	已验收
10	交流电缆	ZC-YJLHV22- 0.6kV/1kV 3*150+1*70/ZC- YJLHV22- 0.6kV/1kV 3*120+1*70/ZC- YJLHV22- 0.6kV/1kV 3*35+1*16	Km	2.035	0	2.035	80%	江苏上 上电缆 集团有 限公司	未验收资 料未及时 提供且未 包含并网 电缆
11	视频监控								

监理日报

12	清洗系统								
13	并网柜	GGD	台	5	0	5	100%	浙江正泰电气科技有限公司	已验收
14	采光带防坠网	采光带防护网及支架 50*5*1000*2000 41*41*2.0	块/支	490/670	0	490/670	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	已验收
15	3#车间加固钢板	Q355 钢板 / 螺栓 M12*35*58.8	吨/套	3.762/2288	0	3.762/2288	100%	江苏沙钢物资贸易有限公司	已验收
16	2#车间钢管及系杆	- 5XΦ121X2236 - 4XΦ114X7300	米	163	0	163	100%	江苏沙钢物资贸易有限公司	已验收
17	2#车间连接板及直拉条	- 12X200X240 - 8X125X500 - 8X120X220 Φ12	块/条	274/68	0	274/68	100%	江苏沙钢物资贸易有限公司	已验收
18	室外并网柜基础材料进场	CPVC Φ100/50	米	132/642	0	132/642	100%	宣城凯成电力科技有限公司	已验收
19	室外并网柜基础钢筋	14Φ/12Φ/8Φ	支	75/51/88	0	75/51/88	100%	铜陵市富鑫钢铁有限公司	未验收未提供相应资料

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计累计量	完成率
1	彩钢瓦屋面	安全围栏安装	MW	2.18817	6%	96%	96%
		采光带防坠网安装	MW	2.18817	35%	100%	100%
		支架安装	MW	2.18817	3%	100%	100%
		桥架安装	MW	2.18817	1%	94%	94%

监理日报

		组件安装	块	3558	10%	90%	90%
		直流电缆敷设	m	36000	20%	100%	100%
		逆变器安装	台	16	1%	98%	98%
		防雷接地	m	1620	1%	98%	98%
		清洗洗系统安装	套	2			
		交流电缆敷设	m	1013			
		监控系统	套	5			
		运维通道安装	m	940/1884	5%	100%	100%
		并网柜安装	台	5	15%	65%	65%
2	3#车间	钢结构加固	T	3.762	100%	100%	100%
3	2#车间	钢结构加固	米	163	3%	100%	100%

监理情况

1、工程整体进度：

工程总体进度完成量： 其主要分项工程完成量如下：

序号	工作内容	单位	总工程量	累计完成量	完成比率
1	安全围栏安装	MW	2.18817	96%	96%
2	采光带防坠网安装	MW	2.18817	100%	100%
3	支架安装	MW	2.18817	100%	100%
4	桥架安装	MW	2.18817	94%	94%
5	组件安装	块	3558	90%	90%
6	直流电缆敷设	m	36000	100%	100%
7	逆变器安装	台	16	98%	98%
8	防雷接地	m	1620	98%	98%
9	清洗洗系统安装	套	2		
10	交流电缆敷设	套	1013		
11	监控系统	套	5		
12	运维通道安装	米	940/1884	100%	100%
13	并网柜安装	台	5	65%	65%
14	3#车间钢结构加固	T	3.762	100%	100%
15	2#车间钢结构加固	米	163	100%	100%

监理日报

- 1、工程施工安全：现场人员安全用品佩戴。
- 2、工程施工质量：检查组件安装质量情况、检查交流桥架安装质量情况、检查电缆沟电缆井钢筋绑扎质量情况、检查逆变器雨棚安装质量情况。
- 3、问题：组件边压块漏装，紧固不到位情况，中压块个别方阵组件缝隙过大，组件下面存在垃圾，导水夹装反、组件安装完成后定位线未及时清理。
- 4、其他：

附一：施工过程及监督检查图片



交流桥架安装



电缆沟电缆井钢筋绑扎



逆变器雨棚安装



组件安装

监理日报


附一：存在的问题照片



组件安装缺少导水夹



组件安装完成后未及时清理定位线

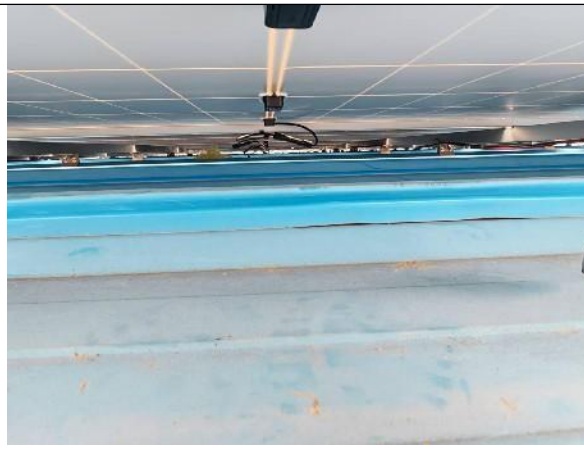

组件下方存在垃圾



中压块安装完成后存在较大缝隙



边压块存在漏装情况
