

监理日报

|          |           |                                     |                                                                |         |       |         |          |                  |          |     |    |
|----------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|----------|------------------|----------|-----|----|
| 项目名称     |           | 郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目 |                                                                |         |       |         |          |                  |          |     |    |
| 建设单位     |           | 郎溪申宣新能源科技有限公司                       |                                                                |         |       | 项目负责人   |          |                  |          |     |    |
| 承包单位     |           | 浙江玉信电力建设有限公司                        |                                                                |         |       | 项目经理    | 胡江浩      |                  |          |     |    |
| 监理单位     |           | 常州正衡电力工程监理有限公司                      |                                                                |         |       | 项目总监    | 张献兵      | 项目总代             | 姜旭       | 记录员 | 何冰 |
| 填报日期     |           | 2025.04.02（星期三）                     |                                                                |         | 天气    | 晴       | 温度：7~24℃ |                  | 风力：3~4级  |     |    |
| 当日进度     | 人员安排      |                                     | 管理人员：1人；施工人员：8人；监理：1人                                          |         |       |         |          |                  |          |     |    |
|          | 机械车辆      |                                     | 无                                                              |         |       |         |          |                  |          |     |    |
|          | 材料到货      |                                     | 无                                                              |         |       |         |          |                  |          |     |    |
|          | 施工进展      |                                     | 1. 逆变器接地扁铁安装 2. 电缆井电缆沟并网柜基础浇筑 3. 组件跨接线绑扎 4. 安全围栏安装 5. 直流桥架盖板安装 |         |       |         |          |                  |          |     |    |
|          | 安全工作      |                                     | 现场人员安全用品佩戴。                                                    |         |       |         |          |                  |          |     |    |
| 明日计划     | 人员安排      |                                     | 管理人员：1人；施工人员：5人；                                               |         |       |         |          |                  |          |     |    |
|          | 材料到货      |                                     | 剩余并网电缆进场卸货                                                     |         |       |         |          |                  |          |     |    |
|          | 安全工作      |                                     | 现场人员安全用品佩戴，安全防护物资持续检查。                                         |         |       |         |          |                  |          |     |    |
|          | 施工内容      |                                     | 1. 逆变器槽盒安装 2. 室外并网柜电缆井电缆沟基础养护 3. 直流桥架盖板安装 4. 安全围栏安装            |         |       |         |          |                  |          |     |    |
| 主要材料到货情况 |           |                                     |                                                                |         |       |         |          |                  |          |     |    |
| 序号       | 材料/设备名称   | 型号                                  | 单位                                                             | 总数量     | 当日到货量 | 累计到货量   | 累计到货率    | 厂家               | 验收情况     |     |    |
| 1        | 压块        | 6063-T5                             | MW                                                             | 2.18817 | 0     | 2.18817 | 100%     | 天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司 | 已验收      |     |    |
| 2        | 常规支架      | 导轨 30*40*1.2<br>夹具新 B 角尺 60<br>长    | MW                                                             | 2.18817 | 0     | 2.18817 | 100%     | 天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司 | 因设计变更未验收 |     |    |
| 3        | 围栏材料/爬梯材料 | 横梁 30*30*4<br>斜梁                    | MW                                                             | 2.18817 | 0     | 2.18817 | 100%     | 天津市聚鑫云           | 安全围栏材料已验 |     |    |

# 监理日报

|    |       |                                                                                                                             |    |          |   |                |      |                                      |                                    |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|----------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|
|    |       | 30*30*4*1157<br>立柱 50*50*3*110<br>爬梯角刚 40*4<br>爬梯扁铁 40*4<br>爬梯圆管 32*3                                                       |    |          |   |                |      | 鹏新能<br>源科技<br>有限公<br>司               | 收,爬梯<br>材料与图<br>纸不符                |
| 4  | 组件    | 615w                                                                                                                        | 块  | 3558     | 0 | 3567 备件 6<br>块 | 100% | 天合光<br>能股份<br>有限公<br>司               | 已验收                                |
| 5  | 逆变器   | 150W/100W/50W/<br>40W                                                                                                       | 台  | 16       | 0 | 16             | 100% | 阳光电<br>源股份<br>有限公<br>司               | 已验收                                |
| 6  | 接地扁铁  | 40*4                                                                                                                        | m  | 1620     | 0 | 2000           | 100% | 天津市<br>聚鑫云<br>鹏新能<br>源科技<br>有限公<br>司 | 已验收                                |
| 7  | 铝合金桥架 | 100*100*1.2<br>200*100*1.2<br>150*100*1.2<br>300*100*1.5<br>500*100*2.0                                                     | m  | 1075     | 0 | 1190           | 100% | 天津市<br>聚鑫云<br>鹏新能<br>源科技<br>有限公<br>司 | 已验收                                |
| 8  | 运维通道  | 运维通道<br>203*50*100<br>角钢 30*30*4                                                                                            | m  | 940/1884 | 0 | 940/1884       | 100% | 天津市<br>聚鑫云<br>鹏新能<br>源科技<br>有限公<br>司 | 已验收                                |
| 9  | 直流电缆  | PV1-F-1x4 m²                                                                                                                | m  | 36000    | 0 | 36000          | 100% | 江苏上<br>上电缆<br>集团有<br>限公司             | 已验收                                |
| 10 | 交流电缆  | ZC-YJLHV22-<br>0.6kV/1kV<br>3*150+1*70/ZC-<br>YJLHV22-<br>0.6kV/1kV<br>3*120+1*70/ZC-<br>YJLHV22-<br>0.6kV/1kV<br>3*35+1*16 | Km | 2.035    | 0 | 2.035          | 80%  | 江苏上<br>上电缆<br>集团有<br>限公司             | 未验收资<br>料未及时<br>提供且未<br>包含并网<br>电缆 |
| 11 | 视频监控  |                                                                                                                             |    |          |   |                |      |                                      |                                    |

# 监理日报

|    |             |                                                   |     |            |   |            |      |                  |     |
|----|-------------|---------------------------------------------------|-----|------------|---|------------|------|------------------|-----|
| 12 | 清洗系统        |                                                   |     |            |   |            |      |                  |     |
| 13 | 并网柜         | GGD                                               | 台   | 5          | 0 | 5          | 100% | 浙江正泰电气科技有限公司     | 已验收 |
| 14 | 采光带防坠网      | 采光带防护网及支架<br>50*5*1000*2000<br>41*41*2.0          | 块/支 | 490/670    | 0 | 490/670    | 100% | 天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司 | 已验收 |
| 15 | 3#车间加固钢板    | Q355 钢板 / 螺栓<br>M12*35*58.8                       | 吨/套 | 3.762/2288 | 0 | 3.762/2288 | 100% | 江苏沙钢物资贸易有限公司     | 已验收 |
| 16 | 2#车间钢管及系杆   | - 5XΦ121X2236<br>- 4XΦ114X7300                    | 米   | 163        | 0 | 163        | 100% | 江苏沙钢物资贸易有限公司     | 已验收 |
| 17 | 2#车间连接板及直拉条 | - 12X200X240<br>- 8X125X500<br>- 8X120X220<br>Φ12 | 块/条 | 274/68     | 0 | 274/68     | 100% | 江苏沙钢物资贸易有限公司     | 已验收 |
| 18 | 室外并网柜基础材料进场 | CPVC Φ100/50                                      | 米   | 132/642    | 0 | 132/642    | 100% | 宣城凯成电力科技有限公司     | 已验收 |
| 19 | 室外并网柜基础钢筋   | 14Φ/12Φ/8Φ                                        | 支   | 75/51/88   | 0 | 75/51/88   | 100% | 铜陵市富鑫钢铁有限公司      | 已验收 |

## 工程建设施工进度情况

| 序号 | 部位    | 工作内容     | 单位 | 总工程量    | 当日完成量 | 累计累计量 | 完成率  |
|----|-------|----------|----|---------|-------|-------|------|
| 1  | 彩钢瓦屋面 | 安全围栏安装   | MW | 2.18817 | 1%    | 97%   | 97%  |
|    |       | 采光带防坠网安装 | MW | 2.18817 | 35%   | 100%  | 100% |
|    |       | 支架安装     | MW | 2.18817 | 3%    | 100%  | 100% |
|    |       | 桥架安装     | MW | 2.18817 | 1%    | 95%   | 95%  |

监理日报

|   |      |         |   |          |      |      |      |
|---|------|---------|---|----------|------|------|------|
|   |      | 组件安装    | 块 | 3558     | 10%  | 100% | 100% |
|   |      | 直流电缆敷设  | m | 36000    | 20%  | 100% | 100% |
|   |      | 逆变器安装   | 台 | 16       | 1%   | 99%  | 99%  |
|   |      | 防雷接地    | m | 1620     | 1%   | 99%  | 99%  |
|   |      | 清洗洗系统安装 | 套 | 2        |      |      |      |
|   |      | 交流电缆敷设  | m | 1013     | 75%  | 75%  | 75%  |
|   |      | 监控系统    | 套 | 5        |      |      |      |
|   |      | 运维通道安装  | m | 940/1884 | 5%   | 100% | 100% |
|   |      | 并网柜安装   | 台 | 5        | 10%  | 95%  | 95%  |
| 2 | 3#车间 | 钢结构加固   | T | 3.762    | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 2#车间 | 钢结构加固   | 米 | 163      | 3%   | 100% | 100% |

监理情况

1、工程整体进度：

工程总体进度完成量：
 其主要分项工程完成量如下：

| 序号 | 工作内容      | 单位 | 总工程量     | 累计完成量 | 完成比率 |
|----|-----------|----|----------|-------|------|
| 1  | 安全围栏安装    | MW | 2.18817  | 97%   | 97%  |
| 2  | 采光带防坠网安装  | MW | 2.18817  | 100%  | 100% |
| 3  | 支架安装      | MW | 2.18817  | 100%  | 100% |
| 4  | 桥架安装      | MW | 2.18817  | 95%   | 95%  |
| 5  | 组件安装      | 块  | 3558     | 100%  | 100% |
| 6  | 直流电缆敷设    | m  | 36000    | 100%  | 100% |
| 7  | 逆变器安装     | 台  | 16       | 99%   | 99%  |
| 8  | 防雷接地      | m  | 1620     | 99%   | 99%  |
| 9  | 清洗洗系统安装   | 套  | 2        |       |      |
| 10 | 交流电缆敷设    | 套  | 1013     | 75%   | 75%  |
| 11 | 监控系统      | 套  | 5        |       |      |
| 12 | 运维通道安装    | 米  | 940/1884 | 100%  | 100% |
| 13 | 并网柜安装     | 台  | 5        | 95%   | 95%  |
| 14 | 3#车间钢结构加固 | T  | 3.762    | 100%  | 100% |
| 15 | 2#车间钢结构加固 | 米  | 163      | 100%  | 100% |

# 监理日报


1、工程施工安全：现场人员安全用品佩戴。

2、工程施工质量：检查逆变器接地扁铁质量情况、旁站电缆沟电缆井并网柜基础浇筑、检查组件跨接线绑扎情况、检查安全围栏安装质量情况、检查直流桥架盖板安装质量情况。

### 3、问题：

4、其他:

附一：施工过程及监督检查图片

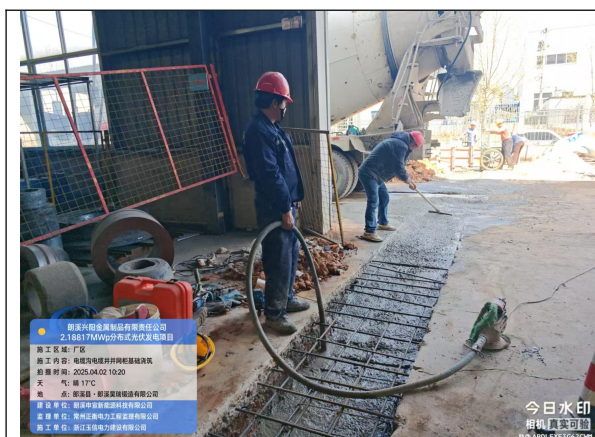

## 电缆井电缆沟并网柜基础浇筑



## 逆变器接地扁铁安装



## 直流桥架盖板安装



## 组件跨接线绑扎

# 监理日报



## 安全围栏安装

### 附一：存在的问题照片

无
