

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.04.14 (星期一)		晴	温度: 10-26℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: <u>2</u> 人; 施工人员: <u>16</u> 人; 监理: <u>1</u> 人; 叉车: <u>0</u> 人; 吊车人员: <u>0</u> 人						
	机械车辆	吊车 <u>0</u> 台、叉车 <u>0</u> 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、盾源 2 车间组件组串、接地安装 2、富乐得 1 车间研发楼组件安装完成 3、配电室下墙桥架安装 50% 4、富乐德 4 车间支架安装 10%						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: <u>2</u> 人; 施工人员: <u>16</u> 人; 监理: <u>1</u> 人; 叉车: <u>0</u> 人; 吊车人员: <u>0</u> 人						
	材料到货	逆变器						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、陶瓷 1 车间彩钢瓦屋面组件安装、组串 (或安排各屋面补料吊装) 2、盾源 2 车间组件组串、接地安装 3、陶瓷 4 车间支架安装						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5746	0	4392	80%	
2	配重块	400x300	块	2127	0	1956	92%	
		400x400	块	2674	0	2630	98%	
		400x350	块	2137	0	2137	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	0	0	
		50KW	台	5	0	0	0	
		100KW	台	4	0	0	0	
		150KW	台	21	0	0	0	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	米	1000	0	900	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流	米	200	0	130	100%	

监理日报

		槽式桥架						
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	米	500	0	450	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	米	700	0	700	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	米	300	0	260	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	米	150	0	110	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	58500	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm²	米	29000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4560	0	4560	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	156	0	0	0	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	2167	0	0	0	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	843	0	0	0	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	2462	0	0	0	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	594	0	260	52%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	0	0	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成率
		400x300 配重块	块	2127	0	1956	92%
		400x400 配重块	块	2674	0	2630	98%
		400x350 配重块	块	2137	0	1540	70%
		支架	kW	4560	50	2200	52%
		组件安装	kW	4560	100	2140	48%
		直流电缆敷设	kW	4560	0	2000	45%
		逆变器安装	kW	4560	0	0	0
		桥架安装	kW	4560	100	2100	47%
		交流电缆敷设	kW	4560	0	0	0
		防雷接地	kW	4560	0	1900	43%
		清洗系统安装	kW	4560	0	0	0
		监控系统安装	kW	4560	0	0	0
		并网柜	kW	4560	0	0	0
		并网	kW	4560	0	0	0

监理情况

一、工程施工安全：无隐患

监理日报




二、工程施工质量：无

三、资料方面：无

四、现场施工现共计 16 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

五、备注：现场容量变更及调整，近期部分数据做更新。

附一：施工过程中及监督检查图片

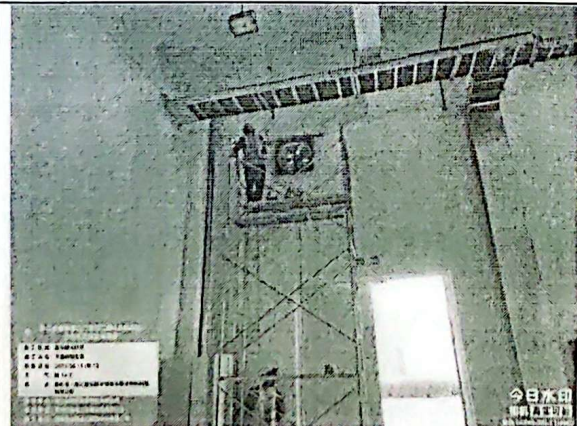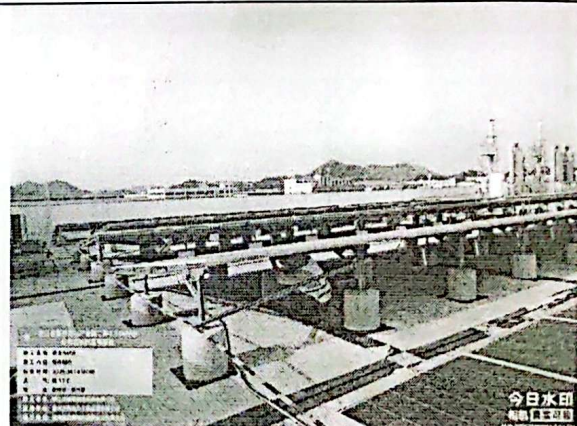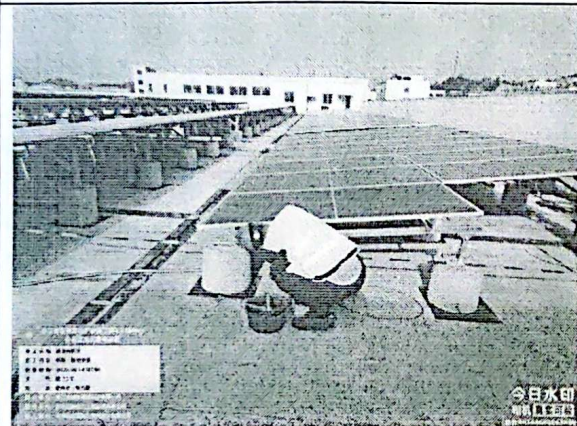

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.04.15 (星期二)		晴	温度: 10-27℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 2人; 施工人员: 18人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	150 逆变器 21 台						
	施工进展情况	1、富乐得 1 车间彩钢瓦屋面支架安装完成, 直流线安装 80% 2、配电室下墙桥架安装 80% 3、富乐德 4 车间支架安装完成						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 2人; 施工人员: 18人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	材料到货	逆变器、交流电缆						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、彩钢瓦屋面组件吊装 2、逆变器吊装、安装						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5746	0	4392	80%	
2	配重块	400x300	块	2127	0	1956	92%	
		400x400	块	2674	0	2630	98%	
		400x350	块	2137	0	2137	100%	
		400x350	块	2137	0	2137	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	1	1	100%	
		50KW	台	5	0	0	0	
		100KW	台	4	0	0	0	
		150KW	台	21	21	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	米	1000	0	900	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	米	200	0	130	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	米	500	0	450	100%	
		400×100mm 热镀锌交流	米	700	0	700	100%	

监理日报

		槽式桥架						
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	米	300	0	260	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	米	150	0	110	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	58500	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	29000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4560	0	4560	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	156	0	0	0	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	2167	0	0	0	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	843	0	0	0	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	2462	0	0	0	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	594	0	260	52%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	0	0	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2127	0	1956	92%
		400x400 配重块	块	2674	0	2630	98%
		400x350 配重块	块	2137	0	1540	70%
		支架	kW	4560	100	2300	53%
		组件安装	kW	4560	0	2140	48%
		直流电缆敷设	kW	4560	100	2100	47%
		逆变器安装	kW	4560	0	0	0
		桥架安装	kW	4560	40	2140	48%
		交流电缆敷设	kW	4560	0	0	0
		防雷接地	kW	4560	0	1900	43%
		清洗系统安装	kW	4560	0	0	0
		监控系统安装	kW	4560	0	0	0
		并网柜	kW	4560	0	0	0
		并网	kW	4560	0	0	0

监理情况


- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：无
- 三、资料方面：无
- 四、现场施工现共计 18 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人

监理日报

证合一，且在有效期内。

五、备注：现场容量变更及调整，近期部分数据做更新。

附一：施工过程及监督检查图片

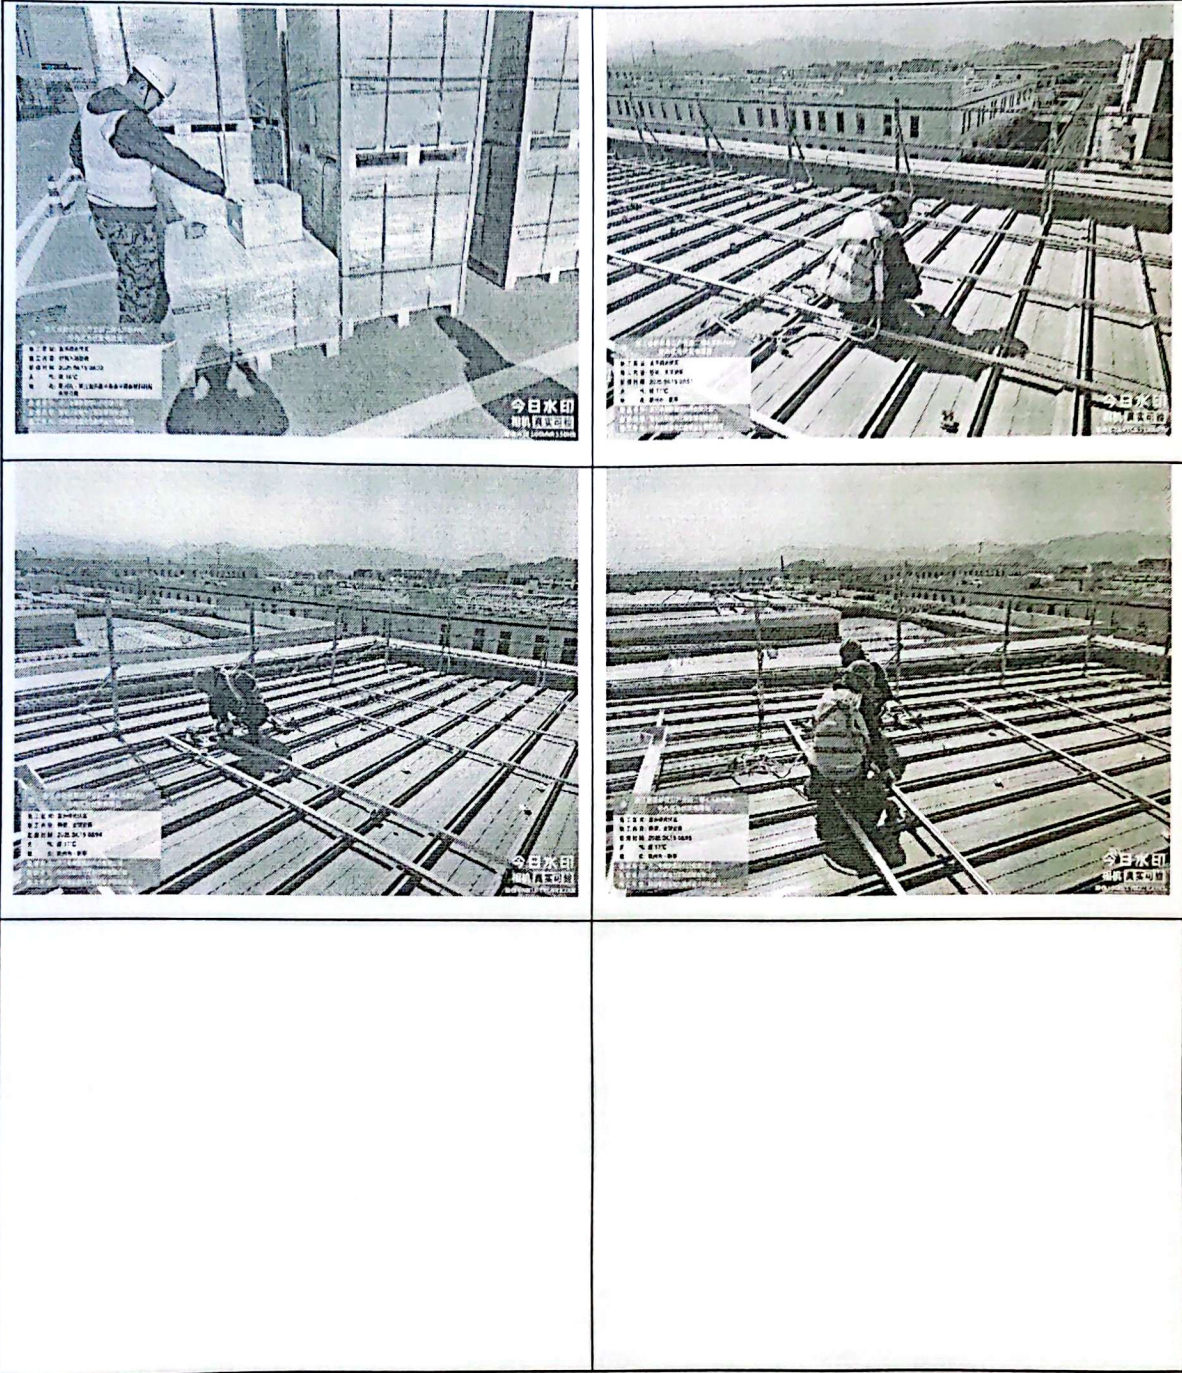

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.04.16 (星期三)		晴	温度: 10-27℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 1人; 施工人员: 18人; 监理: 1人; 叉车: 1人; 吊车人员: 2人						
	机械车辆	吊车 1台、叉车 1台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、富乐得 1、4 车间彩钢瓦屋面组件吊装 2、富乐得 1 车间彩钢瓦屋面直流布线 3、富乐德屋面逆变器吊装						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 2人; 施工人员: 18人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	材料到货	逆变器、交流电缆						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	预报有雨, 总包暂未做计划安排						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5746	0	4392	80%	
2	配重块	400x300	块	2127	0	1956	92%	
		400x400	块	2674	0	2630	98%	
		400x350	块	2137	0	2137	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	0	0	
		100KW	台	4	0	0	0	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	米	1000	0	900	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	米	200	0	130	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	米	500	0	450	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	米	700	0	700	100%	

监理日报

		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	米	300	0	260	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	米	150	0	110	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	58500	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm²	米	29000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4560	0	4560	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	156	0	0	0	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	2167	0	0	0	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	843	0	0	0	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	2462	0	0	0	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	594	0	260	52%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	0	0	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成率
		400x300 配重块	块	2127	0	1956	92%
		400x400 配重块	块	2674	0	2630	98%
		400x350 配重块	块	2137	0	1540	70%
		支架	kW	4560	0	2300	53%
		组件安装	kW	4560	0	2140	48%
		直流电缆敷设	kW	4560	40	2140	48%
		逆变器安装	kW	4560	0	0	0
		桥架安装	kW	4560	0	2140	48%
		交流电缆敷设	kW	4560	0	0	0
		防雷接地	kW	4560	0	1900	43%
		清洗系统安装	kW	4560	0	0	0
		监控系统安装	kW	4560	0	0	0
		并网柜	kW	4560	0	0	0
		并网	kW	4560	0	0	0

监理情况

一、工程施工安全：无隐患

二、工程施工质量：无


三、资料方面：无

四、现场施工现共计 18 人；叉车 1 人，吊装 2 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

监理日报

五、备注：现场容量变更及调整，近期部分数据做更新。

附一：施工过程及监督检查图片

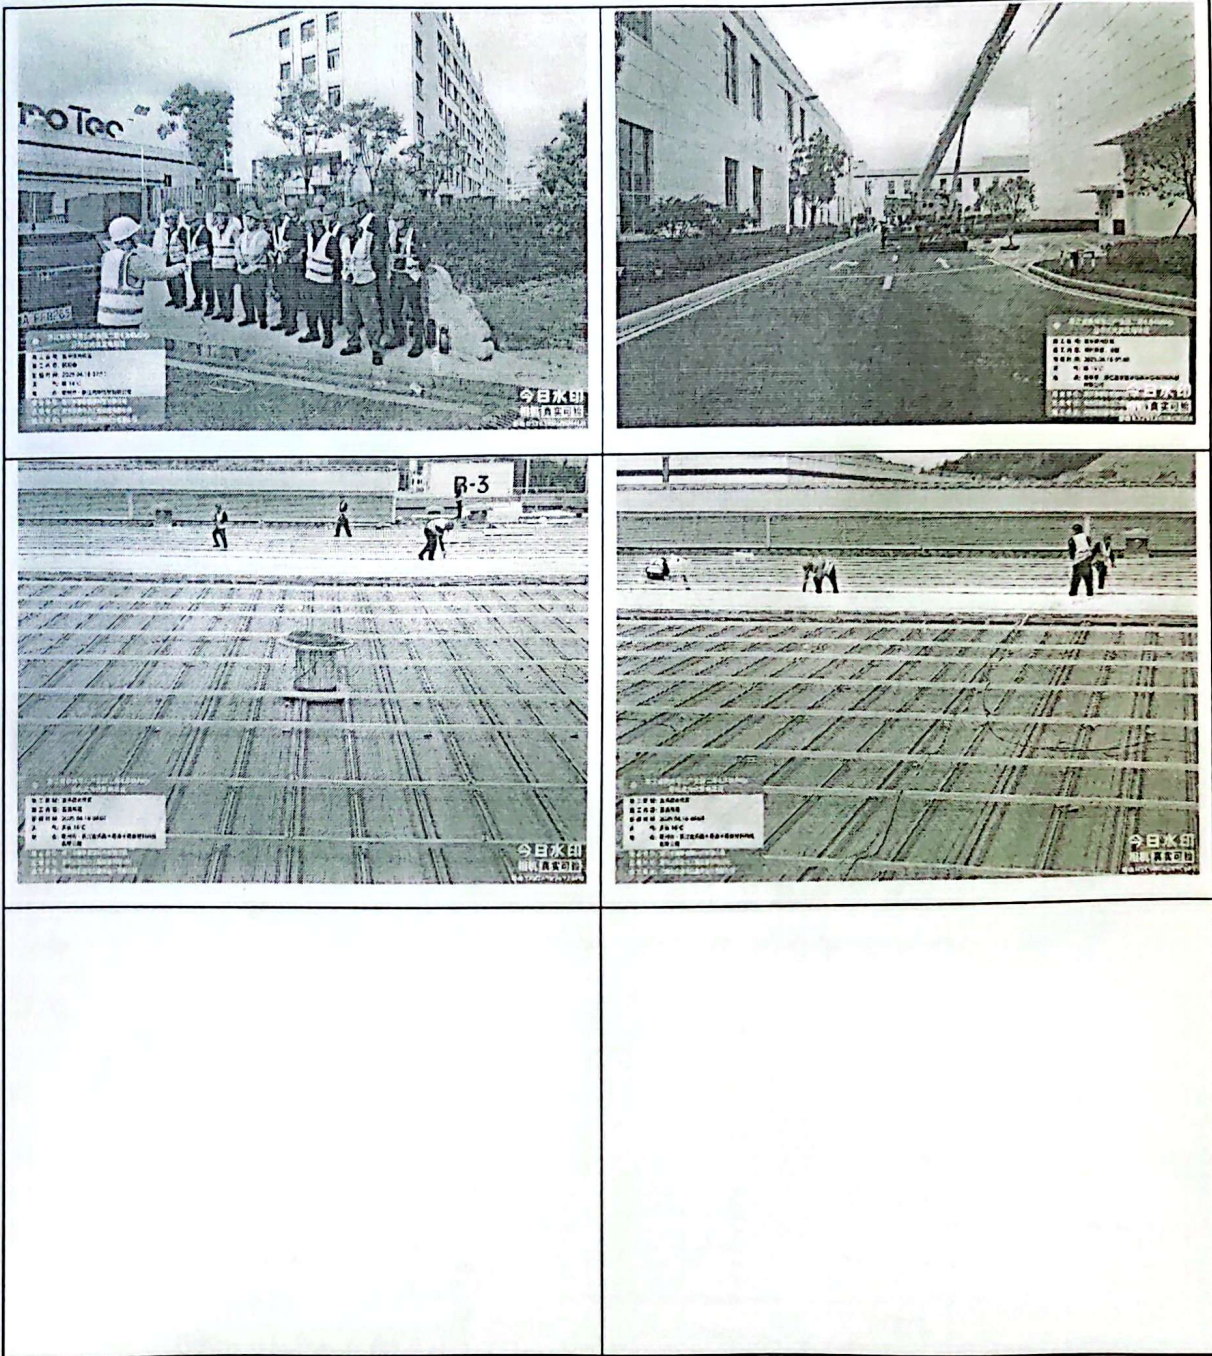

监理日报

项目名称		浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目						
建设单位		浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理		向威	
承包单位		河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理		张翔	
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监		张献兵	记录员 陈大伟
填报日期		2025.04.17 (星期四)		阴转雨	温度: 10-25℃		风力: 1 级	
当日 进度	人员安排	管理人员: 1人; 施工人员: 18人; 监理: 1人; 叉车: 1人; 吊车人员: 2人						
	机械车辆	吊车 1台、叉车 1台						
	材料到货	交流电缆						
	施工进展情况	1、富乐得 1 车间 150 逆变器安装 2、富乐得 1 车间彩钢瓦屋面组件吊装、分散						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 2人; 施工人员: 18人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	材料到货	配重						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、富乐得 4 车间直流电缆敷设 2、富乐得 1 车间彩钢瓦屋面组件安装						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5746	0	4392	80%	
2	配重块	400x300	块	2127	0	1956	92%	
		400x400	块	2674	0	2630	98%	
		400x350	块	2137	0	2137	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	0	0	
		100KW	台	4	0	0	0	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	米	1000	0	900	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	米	200	0	130	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	米	500	0	450	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	米	700	0	700	100%	

监理日报

		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	米	300	0	260	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	米	150	0	110	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	58500	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	29000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4560	0	4560	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	993	0	720	72%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	420	455	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	2512	1855	1855	86%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	504	360	360	71%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1680	1140	1140	67%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	382	0	260	52%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	0	0	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成率
		400x300 配重块	块	2127	0	1956	92%
		400x400 配重块	块	2674	0	2630	98%
		400x350 配重块	块	2137	0	1540	70%
		支架	kW	4560	0	2300	53%
		组件安装	kW	4560	0	2140	48%
		直流电缆敷设	kW	4560	0	2140	48%
		逆变器安装	kW	4560	800	800	17%
		桥架安装	kW	4560	0	2140	48%
		交流电缆敷设	kW	4560	0	0	0
		防雷接地	kW	4560	0	1900	43%
		清洗系统安装	kW	4560	0	0	0
		监控系统安装	kW	4560	0	0	0
		并网柜	kW	4560	0	0	0
		并网	kW	4560	0	0	0

监理情况

一、工程施工安全：无隐患

二、工程施工质量：无


三、资料方面：安全例会纪要、罚款单 002

四、现场施工现共计 18 人；叉车 1 人，吊装 2 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

监理日报

- 五、备注：1、现场容量变更及调整，近期部分数据做更新。
2、交流电缆出厂测试报告暂未提供，暂未安排此材料施工作业。
3、现逆变器只做安装，未接线。

附一：施工过程及监督检查图片

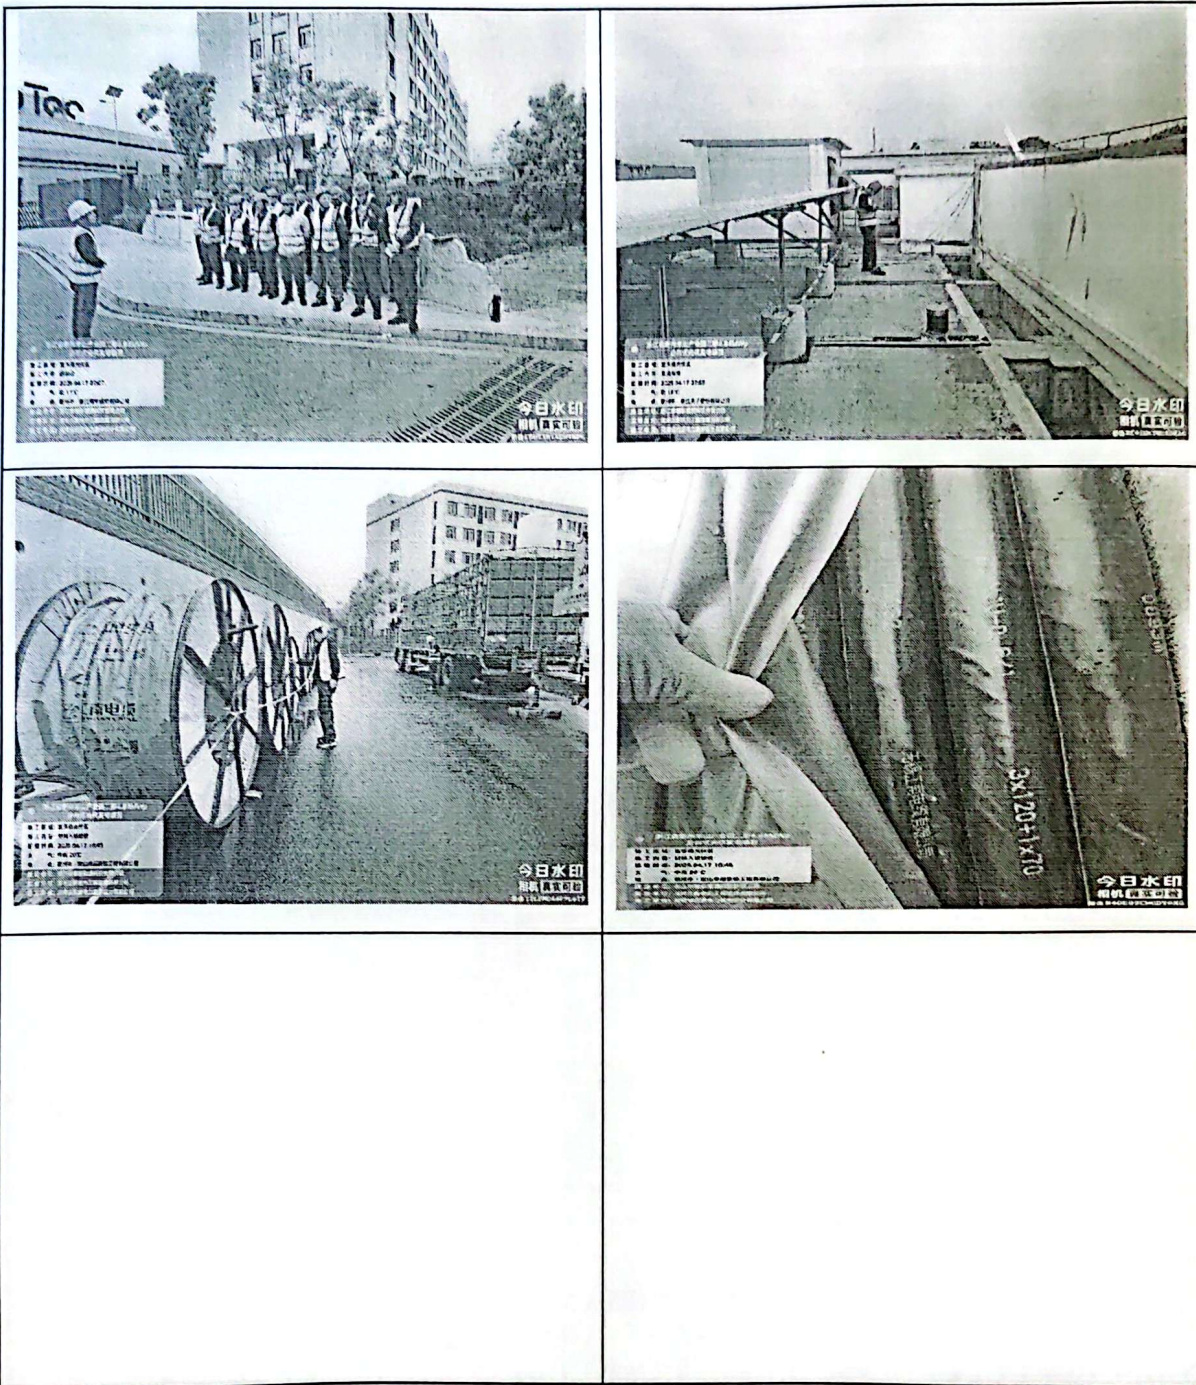

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.04.18 (星期五)		阴转雨	温度: 10-32℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 2 人; 施工人员: 13 人; 监理: 1 人; 叉车: 1 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 1 台						
	材料到货	配重						
	施工进展情况	1、富乐德 1 车间彩钢瓦屋面组件安装完成						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 2 人; 施工人员: 13 人; 监理: 1 人; 叉车: 1 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	50、100 逆变器						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	预报有雨, 视现场情况酌情安排计划						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5746	0	4392	80%	
2	配重块	400x300	块	2127	200	2156	100%	
		400x400	块	2674	160	2790	100%	
		400x350	块	2137	0	2137	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	0	0	
		100KW	台	4	0	0	0	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	米	1000	0	900	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	米	200	0	130	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	米	500	0	450	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	米	700	0	700	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	米	300	0	260	100%	
		300×200mm 热镀锌交流	米	150	0	110	100%	

监理日报

		槽式桥架						
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	58500	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	29000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4560	0	4560	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	993	0	720	72%	以现场实际测量 为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	420	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	2512	0	1855	86%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	504	0	360	71%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1680	0	1140	67%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	382	0	260	52%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	0	0	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2127	0	1956	92%
		400x400 配重块	块	2674	0	2630	98%
		400x350 配重块	块	2137	0	1540	70%
		支架	kW	4560	0	2300	53%
		组件安装	kW	4560	100	2240	49%
		直流电缆敷设	kW	4560	0	2140	48%
		逆变器安装	kW	4560	0	800	17%
		桥架安装	kW	4560	0	2140	48%
		交流电缆敷设	kW	4560	0	0	0
		防雷接地	kW	4560	0	1900	43%
		清洗系统安装	kW	4560	0	0	0
		监控系统安装	kW	4560	0	0	0
		并网柜	kW	4560	0	0	0
		并网	kW	4560	0	0	0

监理情况

- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：小部分组件方阵角度小于 5 度，已下监理联系单 1 份
- 三、资料方面：例会纪要、联系单一份、周报
- 四、现场施工现共计 13 人；叉车 1 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。
- 五、备注：1、现场容量变更及调整，近期部分数据做更新。
- 2、交流电缆出厂测试报告暂未提供，暂未安排此材料施工作业。

监理日报

附一：施工过程及监督检查图片

