

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.06.07 (星期六)		晴	温度: 20-34℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 7 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、安全文明施工整顿 2、直流布线组串调整 (组串调整不计入工程量) 3、盾源防火封堵、桥架盖板安装 4、逆变器雨棚安装						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 7 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、直流布线、组串调整 2、逆变器雨棚安装						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	50	4250	97%
		逆变器安装	kW	4446.83	50	4050	95%
		桥架安装	kW	4446.83	50	4050	95%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4200	96%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4100	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		监控系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		并网柜	kW	4446.83	0	4000	95%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

- 一、工程施工安全：无隐患
 二、工程施工质量：无
 三、资料方面：无


监理日报

四、现场施工现共计 7 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

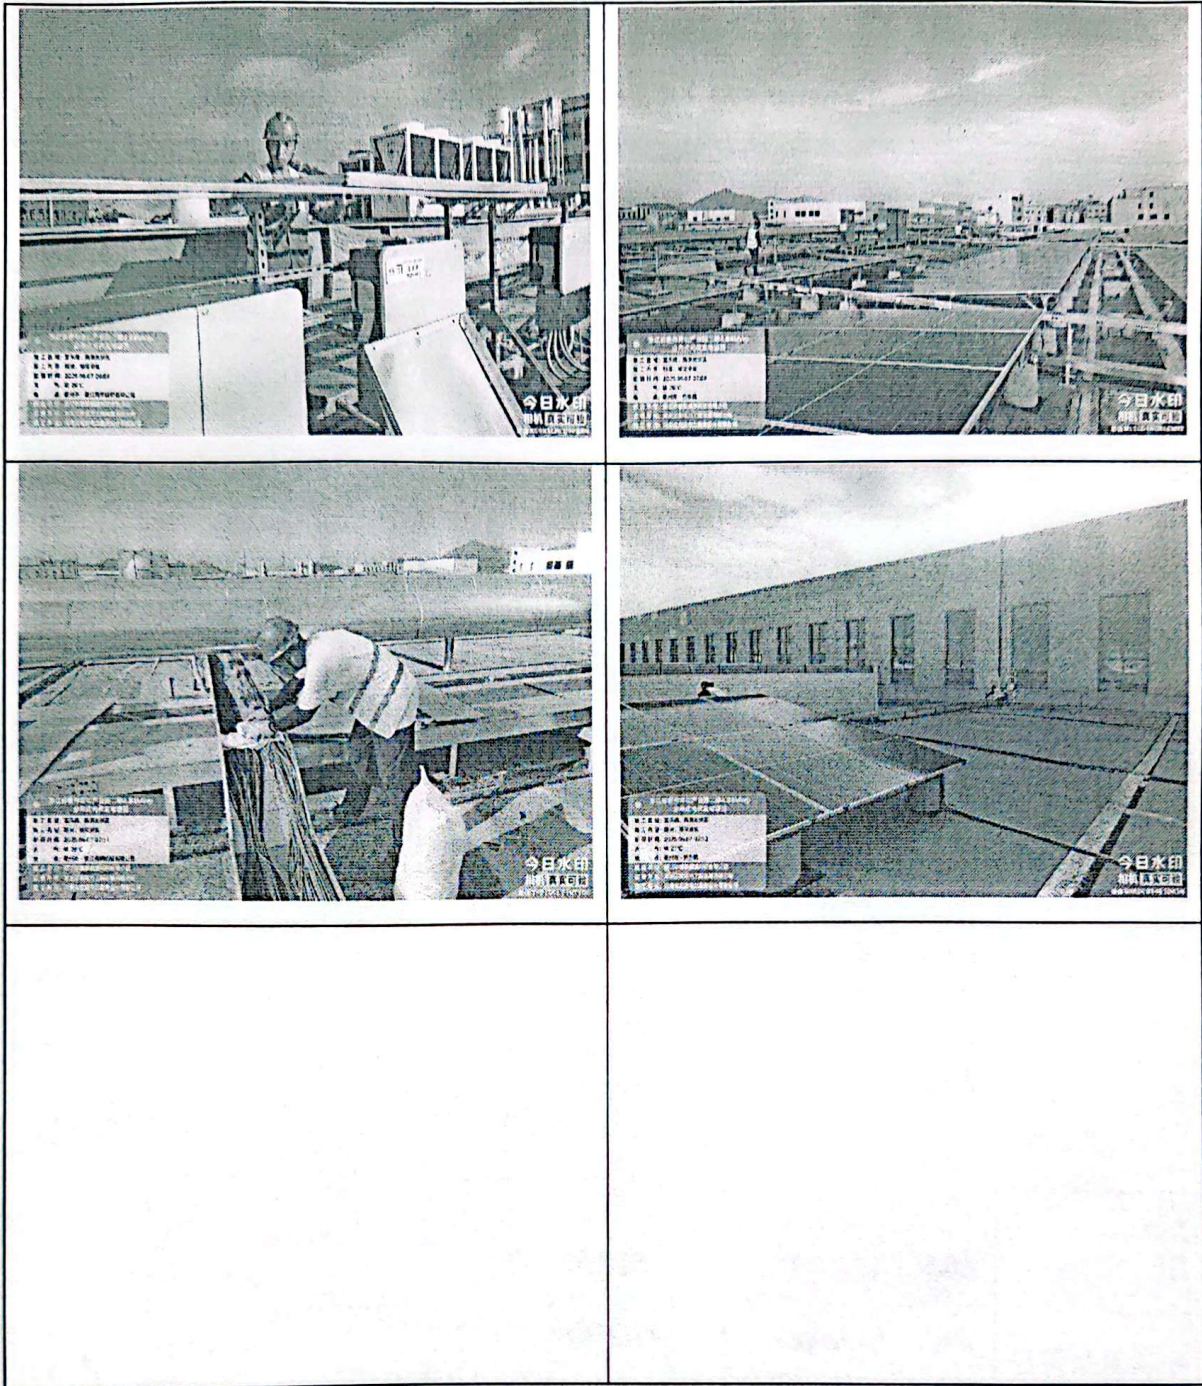

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司				项目经理	向威		
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司				项目经理	张翔		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司				项目总监	张献兵	记录员	陈大伟
填报日期	2025.06.08 (星期日)		阴转雨	温度: 23-34℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、直流换线、布线、组串调整、终端制作。(组串调整不计入工程量)						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 7 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、直流换线、布线、组串调整、终端制作。 2、逆变器接线						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	50	4300	98%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4050	95%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4050	95%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4200	96%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4100	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		监控系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		并网柜	kW	4446.83	0	4000	95%
		并网	kW	4446.83	0	0	0


监理情况

一、工程施工安全：无隐患
 二、工程施工质量：无
 三、资料方面：无
 四、现场施工现共计 6 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核；现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

监理日报

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。
2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

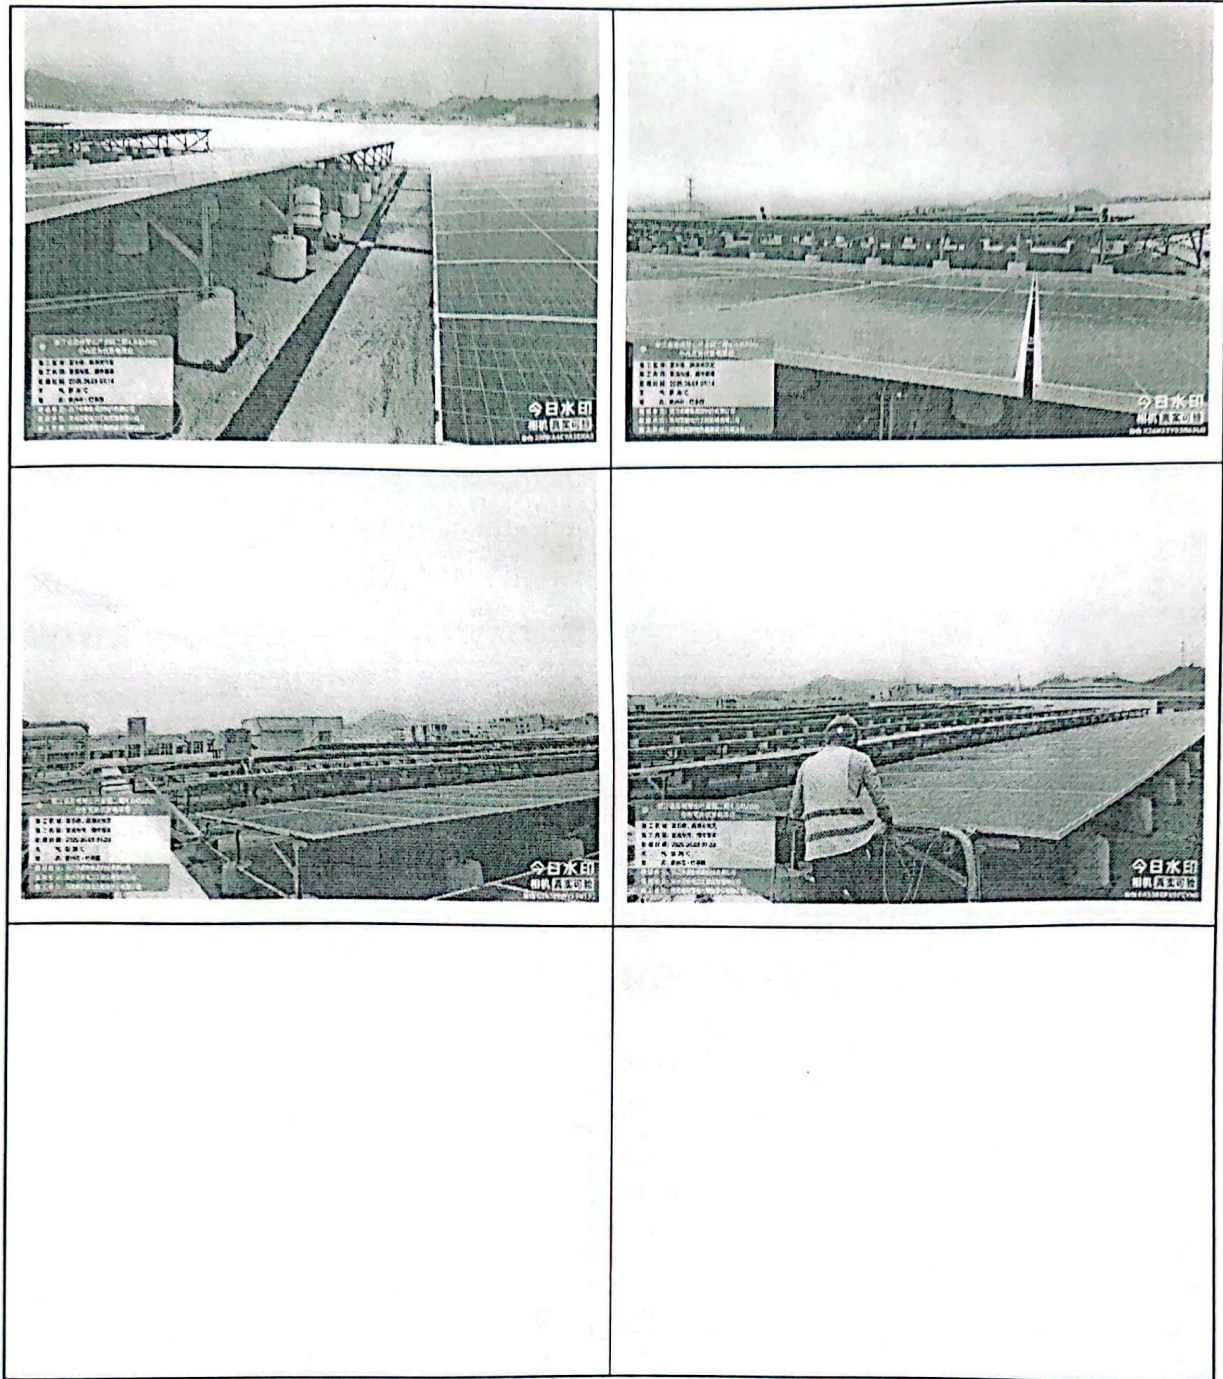

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.06.9 (星期一)		阴转雨	温度: 23-34℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、富乐德 1 车间直流布线、组串调整、终端制作。(组串调整不计入工程量) 2、盾源 2 车间整改消缺。						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、富乐德 1 车间组串调整、终端制作、逆变器接线。 2、盾源 1 车间整改消缺。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		槽式桥架					
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	53200	0	53200	100%
		PV1-F 1*6mm²	米	26000	0	26000	100%
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%

以现场实际测量为准

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	50	4350	98%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4050	95%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4050	95%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4200	96%
		防雷接地	kW	4446.83	50	4150	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		监控系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		并网柜	kW	4446.83	0	4000	95%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

一、工程施工安全：无隐患

二、工程施工质量：无

三、资料方面：无

四、现场施工现共计 6 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证



监理日报

合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

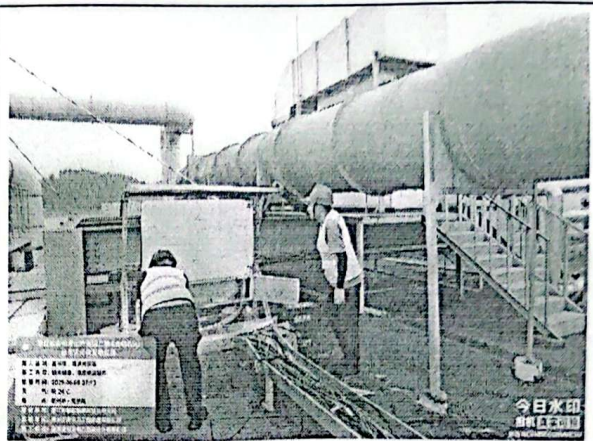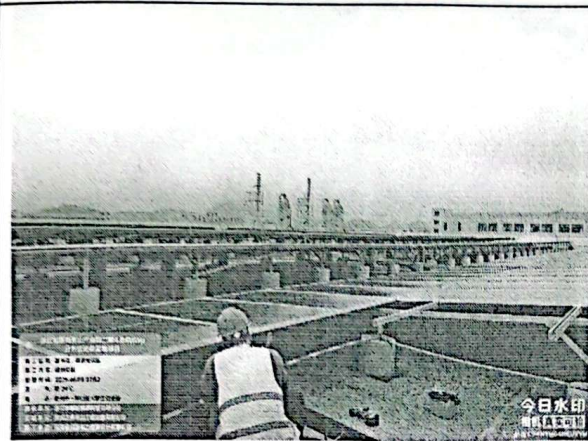

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.06.10 (星期二)		雨	温度: 23-30℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 0 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、因雨停工						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、富乐德 1 车间组串调整、终端制作、逆变器接线。 2、盾源 1 车间整改消缺。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4350	98%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4100	95%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4100	95%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4200	96%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4150	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		监控系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

一、工程施工安全：无隐患

二、工程施工质量：无

三、资料方面：无

四、现场施工现共计 0 人；叉车 0 人，吊装 0 人五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.06.11 (星期三)		阴转雨	温度: 23-29℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 3 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、富乐德 1 车间组串调整、接地安装 (组串调整不计入工程量)						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、富乐德 1 车间接地安装、整改消缺。 2、盾源 1 车间整改消缺。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	50	4350	98%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4100	95%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4100	95%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4200	96%
		防雷接地	kW	4446.83	50	4200	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		监控系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况


一、工程施工安全：无隐患
 二、工程施工质量：无
 三、资料方面：无
 四、现场施工现共计 3 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

监理日报

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

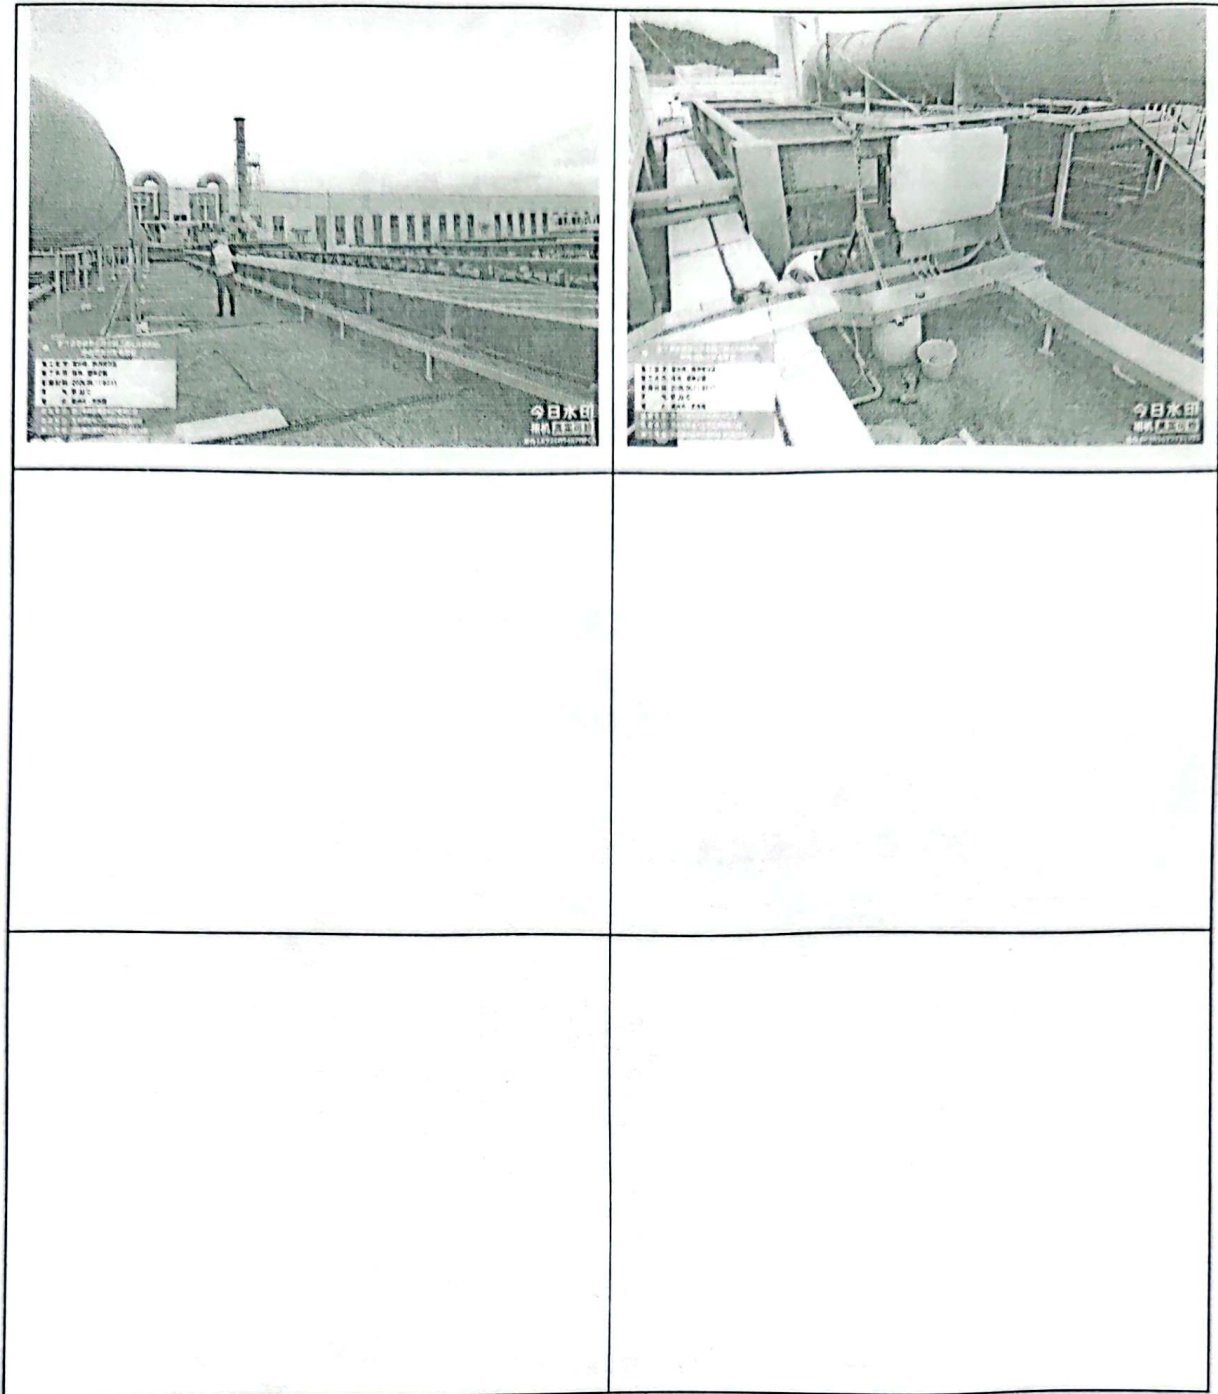

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.06.12 (星期四)		阴转雨	温度: 23-34℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 3 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、富乐德 1 车间整改消缺、接地安装						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、富乐德 1 车间整改消缺。 2、盾源 1 车间整改消缺。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4350	98%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4100	95%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4100	95%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4200	96%
		防雷接地	kW	4446.83	50	4200	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		监控系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%
		并网	kW	4446.83	0	0	0


监理情况

- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：无
- 三、资料方面：无
- 四、现场施工现共计 3 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。
- 五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

监理日报

2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

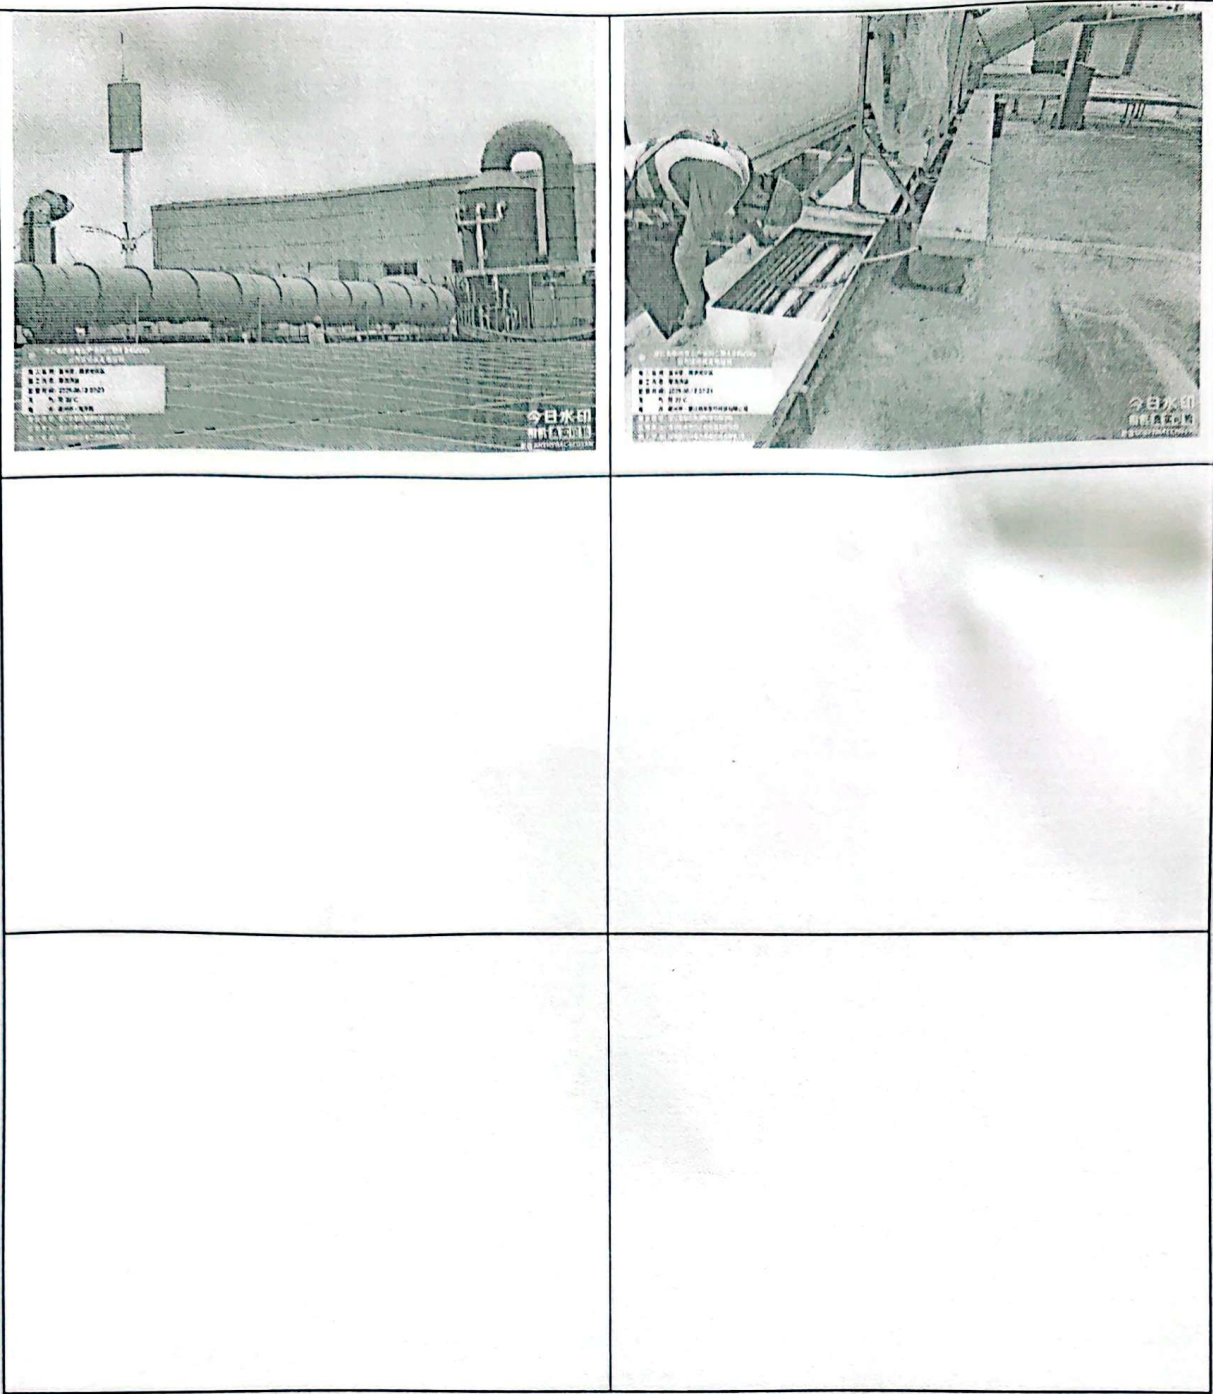

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025. 06. 13 (星期五)		阴转雨	温度: 23-34℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	清洗水管						
	施工进展情况	1、富乐德 1 车间整改消缺、接地安装、组串调整、逆变器接线						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	清洗水管						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、富乐德 1 车间整改消缺。 2、盾源 1 车间整改消缺。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		逆变器安装	kW	4446.83	50	4200	96%
		桥架安装	kW	4446.83	50	4200	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	50	4300	97%
		防雷接地	kW	4446.83	50	4200	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		监控系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

一、工程施工安全：无隐患

二、工程施工质量：无

三、资料方面：无

四、现场施工现共计 6 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

监理日报

2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

