

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.06.14 (星期六)		阴转雨	温度: 23-34℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 3人; 施工人员: 3人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	清洗水管						
	施工进展情况	1、富乐德 1 车间整改消缺						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3人; 施工人员: 6人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	材料到货	清洗水管						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、富乐德 1 车间整改消缺。 2、盾源 1 车间整改消缺。 3、清洗、通道板安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		逆变器安装	kW	4446.83	50	4250	96%
		桥架安装	kW	4446.83	50	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	50	4300	97%
		防雷接地	kW	4446.83	50	4250	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		监控系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

一、工程施工安全：无隐患
 二、工程施工质量：无
 三、资料方面：无
 四、现场施工现共计 3 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

监理日报

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片



监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司				项目经理	向威		
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司				项目经理	张翔		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司				项目总监	张献兵	记录员	陈大伟
填报日期	2025.06.15 (星期日)		雨	温度: 23-34℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 0 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、因雨休工						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、富乐德 1 车间整改消缺。 2、盾源 1 车间整改消缺。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4250	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		监控系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：无
- 三、资料方面：无
- 四、现场施工现共计 0 人；叉车 0 人，吊装 0 人；
- 五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。
- 2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.06.16 (星期一)		阴转雨	温度: 23-34℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 3 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、富乐德整改消缺 2、工序分项验收、检查						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、富乐德 1 车间整改消缺。 2、盾源 1 车间整改消缺。 3、监控安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		槽式桥架						
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量 为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	
工程建设施工进度情况								
序号	部位	工作内容	单位	总 工程量	当日 完成量	累计 完成量	完成 比率	
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%	
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%	
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%	
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%	
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%	
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4250	96%	
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%	
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%	
		防雷接地	kW	4446.83	50	4300	96%	
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	0	0	
		监控系统安装	kW	4446.83	0	0	0	
		并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%	
		并网	kW	4446.83	0	0	0	
监理情况								
一、工程施工安全：无隐患								
二、工程施工质量：工序分项验收、检查								
三、资料方面：无								
四、现场施工现共计 3 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证								

监理日报

合一，且在有效期内。
 五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。
 2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.06.17 (星期二)		晴	温度: 23-34℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 2 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、富乐德整改消缺 2、工序分项验收、检查 3、监控安装						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、富乐德 1 车间整改消缺。 2、盾源 1 车间整改消缺。 3、监控安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4300	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		监控系统安装	kW	4446.83	1000	1000	23
		并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：工序分项验收、检查
- 三、资料方面：无


监理日报

四、现场施工现共计6人；叉车0人，吊装0人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

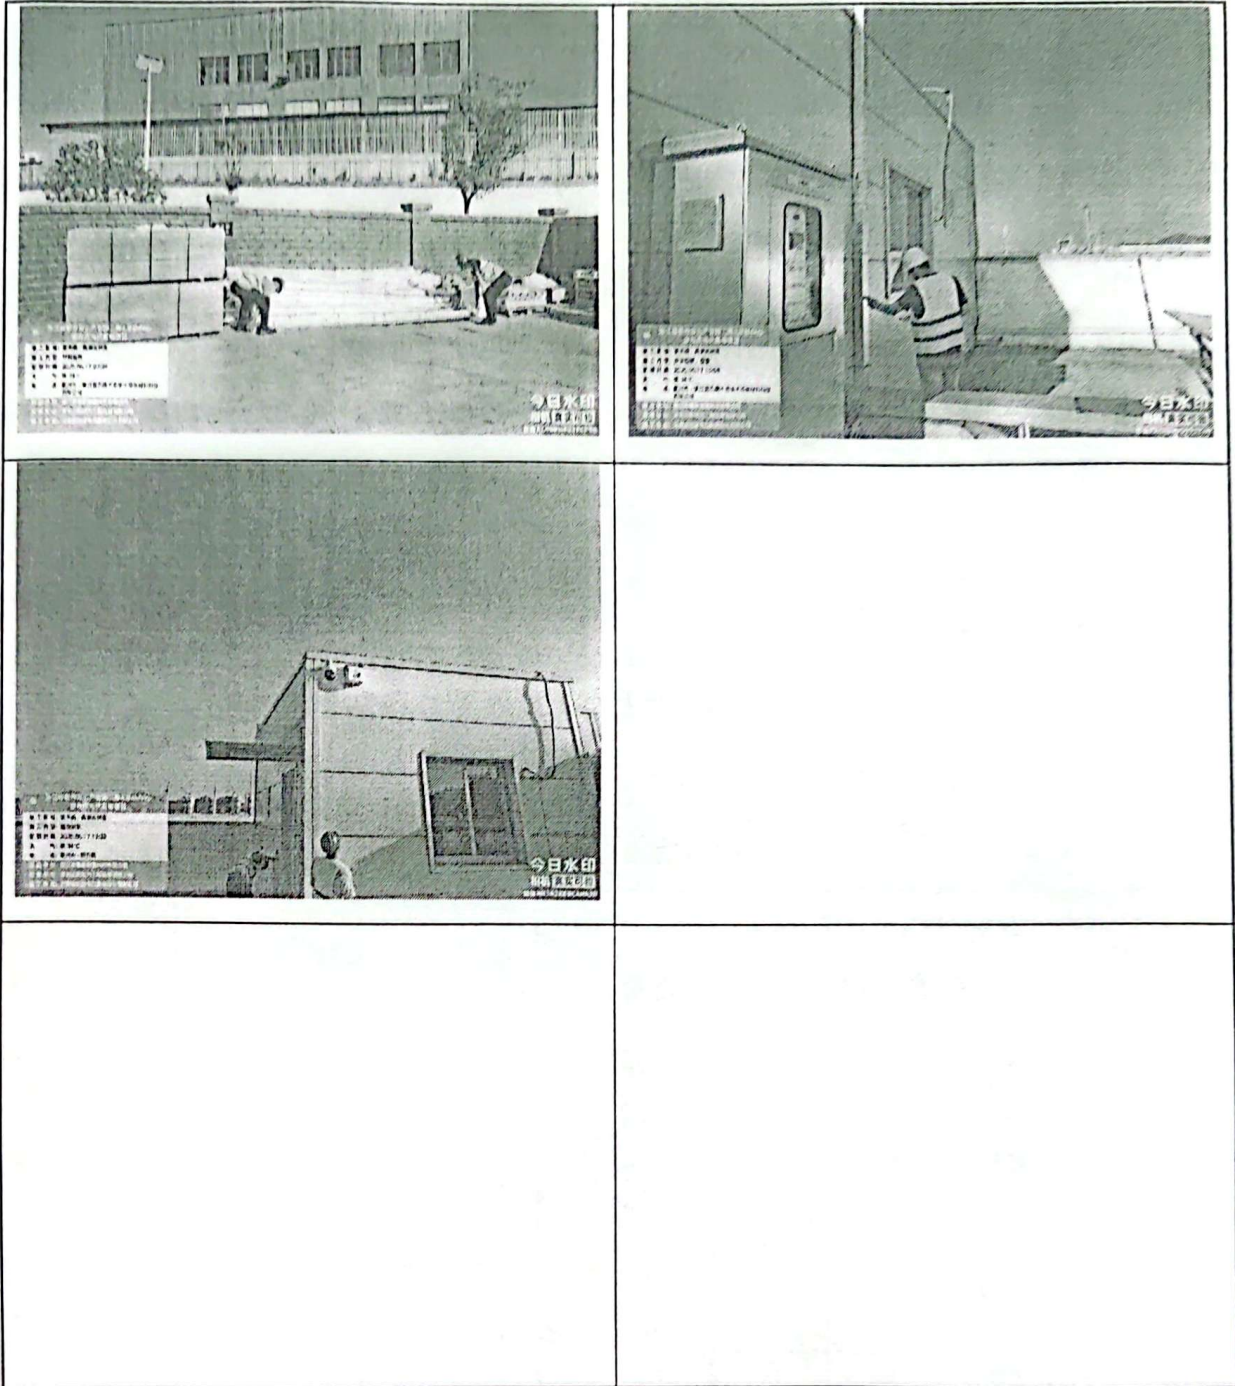

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司				项目经理	向威		
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司				项目经理	张翔		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司				项目总监	张献兵	记录员	陈大伟
填报日期	2025.06.18 (星期三)		晴转阴	温度: 23-36℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 2 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、富乐德整改消缺 2、工序分项验收、检查 3、监控安装						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、富乐德 1 车间整改消缺。 2、盾源 1 车间整改消缺。 3、监控安装。 4、尾工收尾。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	
工程建设施工进度情况								
序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成率	
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%	
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%	
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%	
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%	
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%	
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4250	96%	
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%	
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%	
		防雷接地	kW	4446.83	0	4300	96%	
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	0	0	
		监控系统安装	kW	4446.83	1000	2000	46%	
		并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%	
		并网	kW	4446.83	0	0	0	
监理情况								
一、工程施工安全：无隐患								
二、工程施工质量：工序分项验收、检查								



三、资料方面：无

四、现场施工现共计6人；叉车0人，吊装0人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

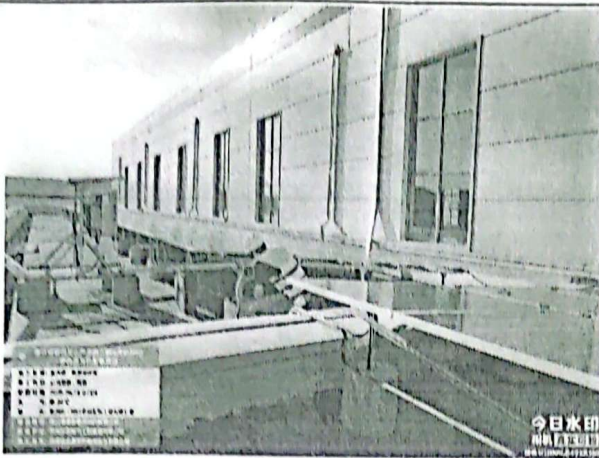

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.06.19 (星期四)		晴转阴	温度: 23-36℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 2 人; 施工人员: 11 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、富乐德整改消缺 2、工序分项验收、检查 3、盾源整改消缺 4、备注: 消缺项待整改合格后计入工程量						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 11 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、富乐德 1 车间整改消缺。 2、盾源 1 车间整改消缺。 3、监控安装。 4、尾工收尾。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		槽式桥架						
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量 为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	
工程建设施工进度情况								
序号	部位	工作内容	单位	总 工程量	当日 完成量	累计 完成量	完成 比率	
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%	
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%	
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%	
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%	
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%	
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4250	96%	
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%	
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%	
		防雷接地	kW	4446.83	0	4300	96%	
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	0	0	
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%	
		并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%	
		并网	kW	4446.83	0	0	0	
监理情况								
一、工程施工安全：无隐患								

二、工程施工质量：工序分项验收、检查




三、资料方面：无

四、现场施工现共计 11 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

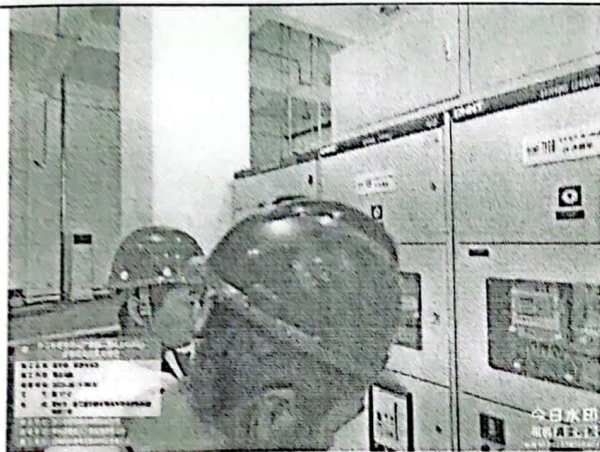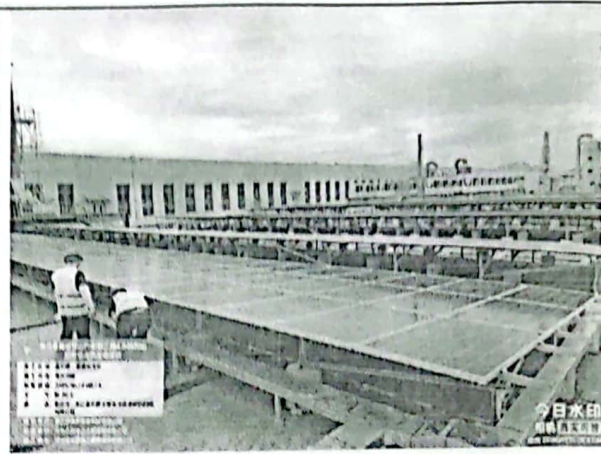

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.06.20 (星期五)		晴转阴	温度: 23-36℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 2 人; 施工人员: 11 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	清洗保温棉						
	施工进展情况	1、富乐德宿舍楼整改完成 95%; 2 车间整改完成 60%; 1 车间整改完成 10% 2、清洗、运维材料散料 3、备注: 消缺项待整改合格后计入工程量						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 11 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、富乐德整改消缺。 2、接地、清洗、运维系统安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4300	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	0	0
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%
		并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节
- 三、资料方面：会议纪要、周报

监理日报

四、现场施工现共计 11 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

