

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期4.84MWp分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.06.21 (星期六)		晴	温度: 25-35℃		风力: 1级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 2人; 施工人员: 11人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	机械车辆	吊车 0台, 叉车 0台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	清洗 1、富乐德2号楼完成约20%, 2、富乐德3号楼完成约20% 3、盾源1号楼完成约10% 运维 1、富乐德4号楼一道约80米 2、富乐德1号楼一道约80米						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3人; 施工人员: 11人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、整改消缺。 2、接地、清洗、运维系统安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
		40KW	台	1	0	1	100%	
3	逆变器	50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
		100x100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量

监理日报

		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	为准
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况


序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4300	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	500	500	13%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%
		并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

监理日报

- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节
- 三、资料方面：无
- 四、现场施工现共计 11 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。
- 五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。
2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

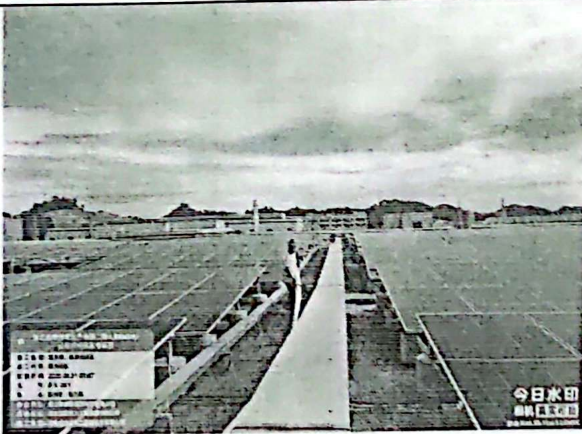

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司				项目经理	向威		
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司				项目经理	张翔		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司				项目总监	张献兵	记录员	陈大伟
填报日期	2025.06.22 (星期日)		阴转雨	温度: 22-30℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 2 人; 施工人员: 11 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	清洗 1、富乐德 2 号楼完成约 30%, 2、富乐德 3 号楼完成约 30% 3、盾源 1 号楼完成约 30% 整改 1、富乐德 4 号楼约 10% 2、富乐德 1 号楼约 30% 3、富乐德 2、3 号楼约 30% 4、富乐德宿舍楼约 95% 5、盾源 1 号楼约 20%						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 11 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、整改消缺。 2、清洗系统安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	

监理日报

		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4300	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	500	1000	20%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%


监理日报

	并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%
	并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节
- 三、资料方面：无
- 四、现场施工现共计 11 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。
- 五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。
2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

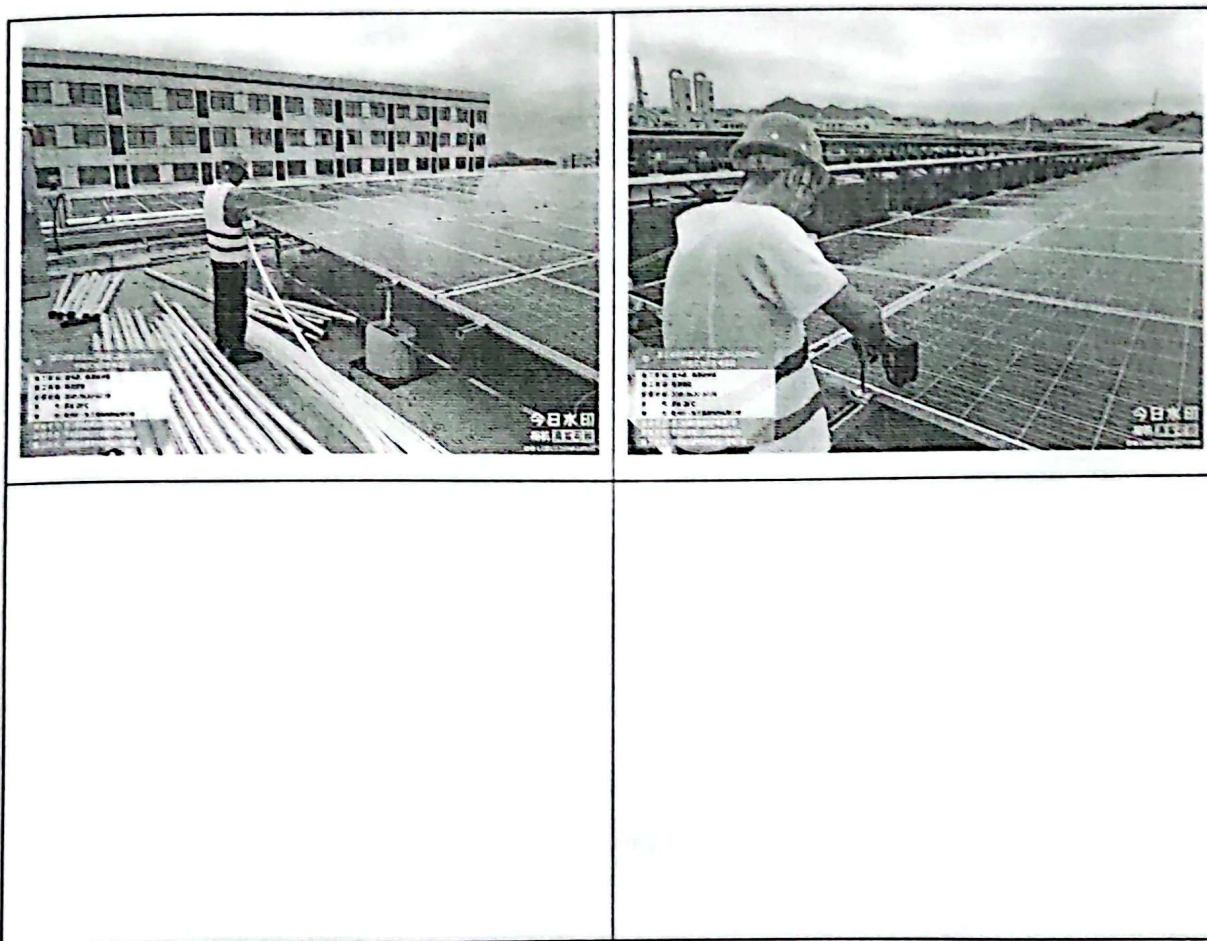

监理日报

项目名称		浙江省衢州常山产业园二期4.84MWp分布式光伏发电项目						
建设单位		浙江申曜新能源科技有限公司		项目经理		向威		
承包单位		河南省启源电力勘测设计有限公司		项目经理		张翔		
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司		项目总监		张献兵	记录员 陈大伟	
填报日期		2025.06.23 (星期一)		阴转雨		温度: 22-30℃ 风力: 1级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 2人; 施工人员: 11人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	机械车辆	吊车 0台、叉车 0台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	清洗 1、富乐德2号楼完成约30% 2、富乐德3号楼完成约30% 3、盾源1号楼完成约30% 整改 1、富乐德4号楼约10% 2、富乐德1号楼约30% 3、富乐德2、3号楼约30% 4、富乐德宿舍楼约95% 5、盾源1号楼约20%						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3人; 施工人员: 11人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、整改消缺。 2、清洗系统安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	

监理日报

		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4300	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	500	1000	20%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%


监理日报

	并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%
	并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节
- 三、资料方面：无
- 四、现场施工现共计 11 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。
- 五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。
2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

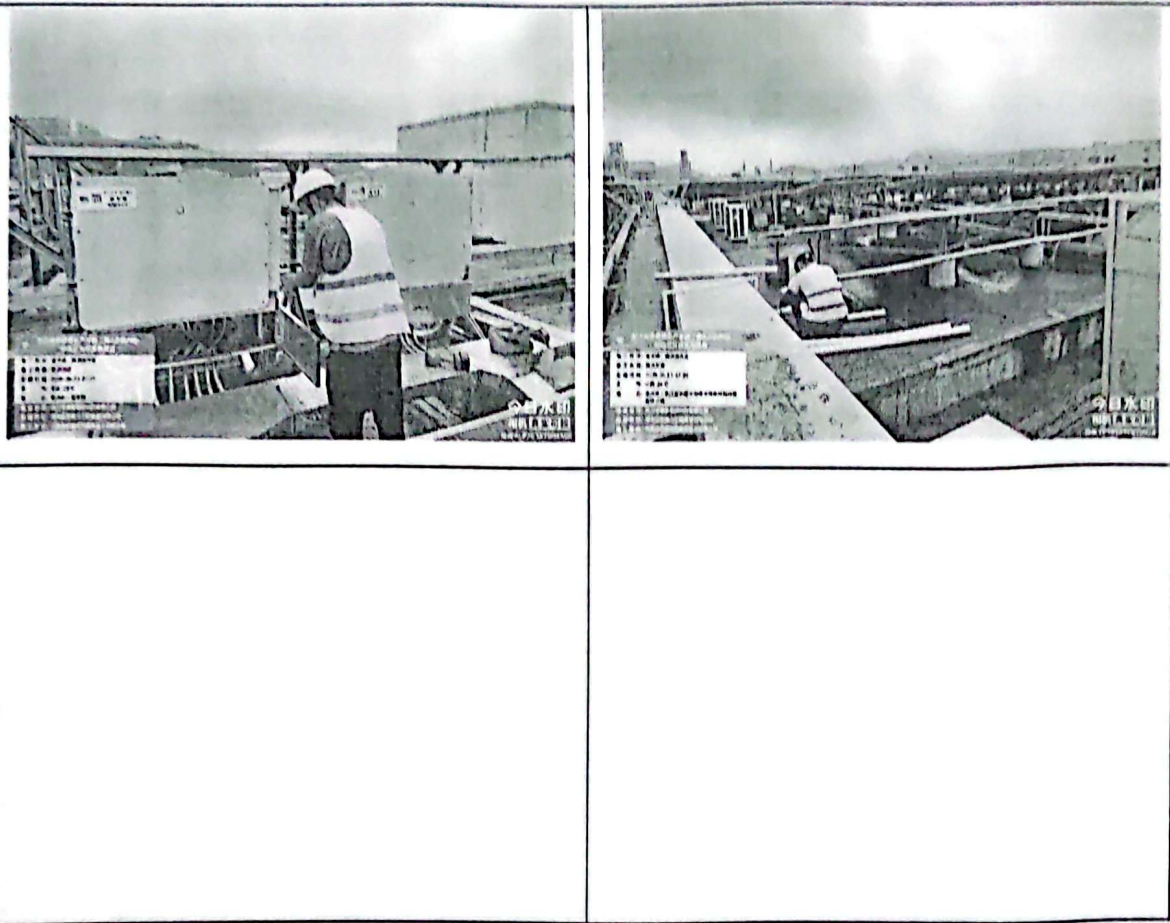

监理日报

项目名称		浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目						
建设单位		浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理		向威	
承包单位		河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理		张翔	
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监		张献兵	记录员 陈大伟
填报日期		2025.06.24 (星期二)		阴转雨	温度: 22-30℃		风力: 1 级	
当日 进度	人员安排	管理人员: 2 人; 施工人员: 11 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	清洗 1、富乐德 2 号楼完成约 30%, 2、富乐德 3 号楼完成约 30% 3、盾源 1 号楼完成约 30% 整改 1、富乐德 4 号楼约 10% 2、富乐德 1 号楼约 30% 3、富乐德 2、3 号楼约 30% 4、富乐德宿舍楼约 95% 5、盾源 1 号楼约 20%						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 11 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、整改消缺。 2、清洗系统安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	

监理日报

		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4300	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	500	1500	30%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%


监理日报

	并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%
	并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节
- 三、资料方面：无
- 四、现场施工现共计 11 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。
- 五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。
2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

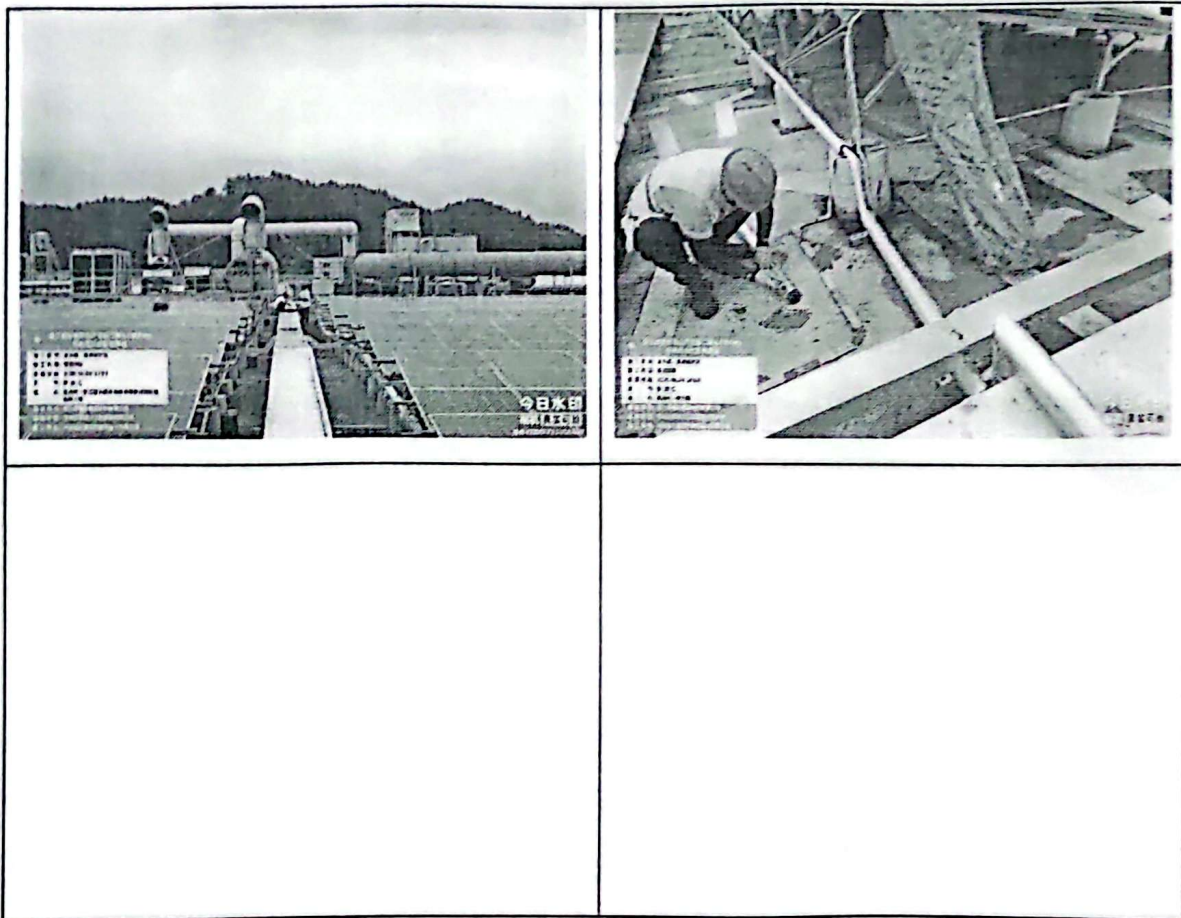

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目						
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威		
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟
填报日期	2025.06.25 (星期三)		阴转雨	温度: 22-30℃		风力: 1 级	

当日 进度	人员安排	管理人员: 2 人; 施工人员: 10 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人					
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台					
	材料到货	无					
	施工进展情况	清洗 1、富乐德 2 号楼完成约 30%, 2、富乐德 3 号楼完成约 30% 3、盾源 1 号楼完成约 30% 整改 1、富乐德 4 号楼约 10% 2、富乐德 1 号楼约 30% 3、富乐德 2、3 号楼约 30% 4、富乐德宿舍楼约 95% 5、盾源 1 号楼约 20% 备注: 今日第三方检测公司电站整体检。					
	安全工作	现场巡视					
明日 计划	人员安排	管理人员: 3 人; 施工人员: 11 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人					
	材料到货	无					
	安全工作	现场巡视					
	施工内容	1、整改消缺。 2、清洗系统安装。					

主要材料到货情况

序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	

监理日报

		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4300	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	500	1500	30%


监理日报

	监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%
	并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%
	并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节
- 三、资料方面：无
- 四、现场施工现共计 11 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。
- 五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。
2、近期梅雨季季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

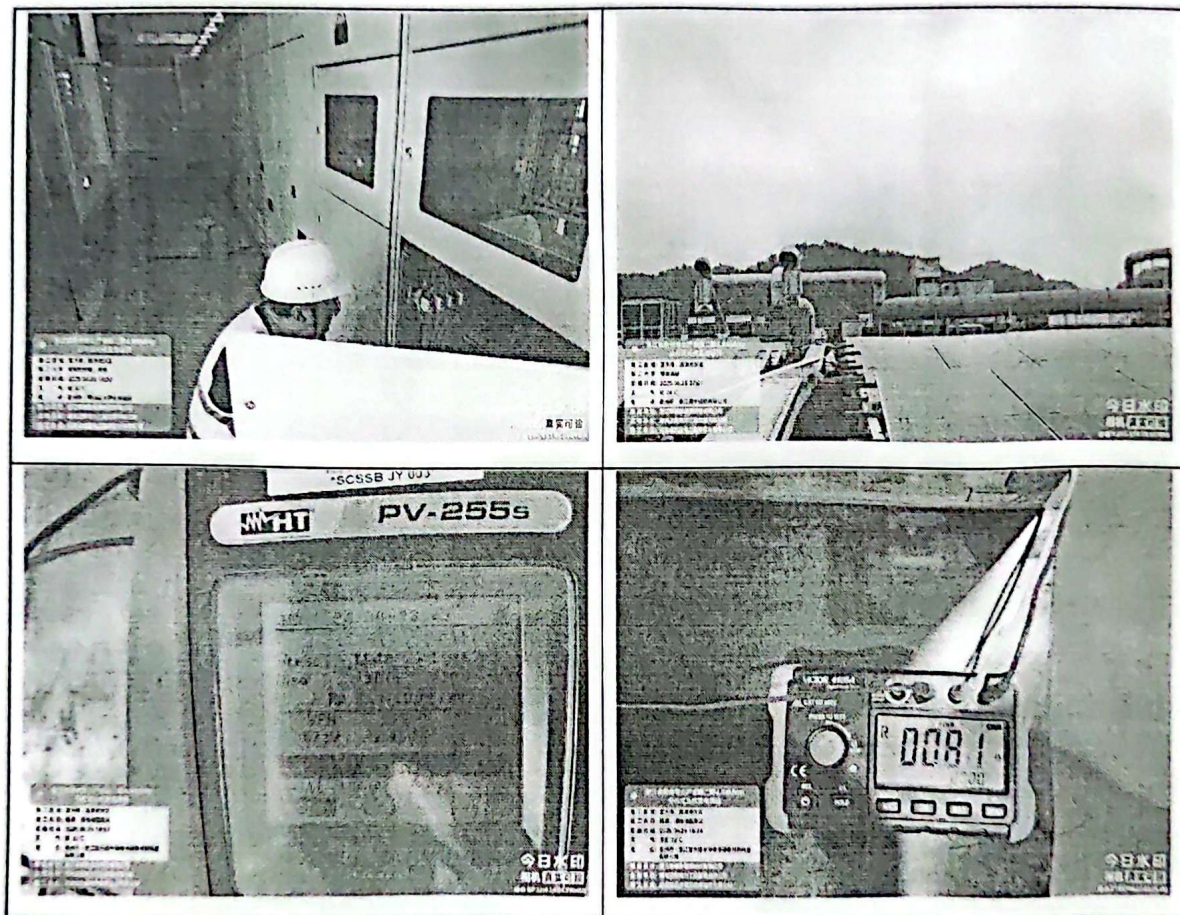

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期4.84MWp分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.06.26 (星期四)		晴转阴	温度: 23-37℃		风力: 1级		
当日进度	人员安排	管理人员: 2人; 施工人员: 10人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	机械车辆	吊车0台、叉车0台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	清洗 1、富乐德1号楼完成约60%。 3、盾源1号楼完成约60%。 备注: 1、现统计清洗为屋面管道。						
	安全工作	现场巡视						
明日计划	人员安排	管理人员: 3人; 施工人员: 11人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、整改消缺。 2、清洗系统安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		100×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4300	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	500	2000	45%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%
		并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节
- 三、资料方面：无

监理日报

四、现场施工现共计 10 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片



监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江中曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.06.27 (星期五)		晴	温度: 23-37℃		风力: 1级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 2人; 施工人员: 10人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	机械车辆	吊车 0台、叉车 0台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	清洗 1、富乐德1号楼完成约80%。 3、盾源1号楼完成约80%。 备注: 1、现统计清洗为屋面管道。						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 3人; 施工人员: 11人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、整改消缺。 2、清洗系统安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4300	96%
		清洗系统安装	kW	4446.83	500	2500	55%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%
		并网柜	kW	4446.83	0	4200	96%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节
- 三、资料方面：无

监理日报

四、现场施工现共计 10 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

