

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.07.06（星期日）		晴	温度：26-39℃		风力：1级		
当日 进度	人员安排		管理人员：2人；施工人员：6人；监理：1人；叉车：0人；吊车人员：0人					
	机械车辆		吊车 0 台、叉车 0 台					
	材料到货		无					
	施工进展情况		尾工 1、清洗系统下墙管道施工。 2、爬梯施工。 3、工序验收、项目预验收，整改消缺 备注：尾工及消缺项完成一定数量后统一计入工程量。					
	安全工作		现场巡视					
明日 计划	人员安排		管理人员：2人；施工人员：6人；监理：1人；叉车：0人；吊车人员：0人					
	材料到货		无					
	安全工作		现场巡视					
	施工内容		1、整改消缺、项目预验收 2、清洗、监控系统安装。					
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量 为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	
工程建设施工进度情况								
序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率	
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%	
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%	
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%	
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%	
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%	
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4300	97%	
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%	
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4300	97%	
		防雷接地	kW	4446.83	0	4300	96%	
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	3200	75%	
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%	
		并网柜	kW	4446.83	0	4300	97%	
		并网	kW	4446.83	0	0	0	
监理情况								
一、工程施工安全：无隐患								
二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节								

监理日报



三、资料方面：无

四、现场施工现共计 6 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。

附一：施工过程及监督检查图片

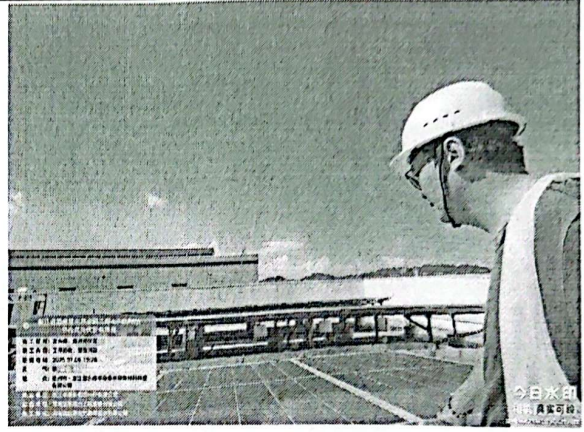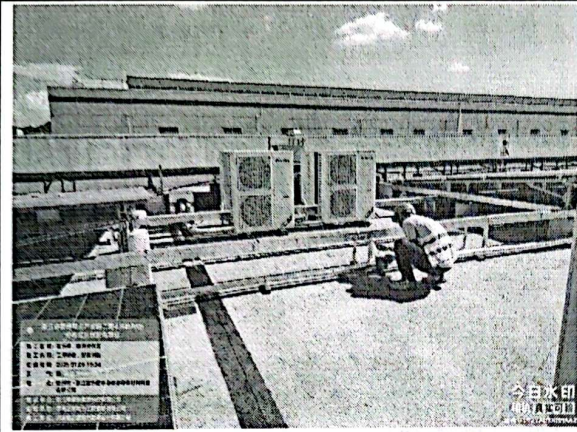

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025. 07. 07（星期一）		晴	温度：26-39℃		风力：1 级		
当日 进度	人员安排		管理人员：2 人；施工人员：6 人；监理：1 人；叉车：0 人；吊车人员：0 人					
	机械车辆		吊车 0 台、叉车 0 台					
	材料到货		无					
	施工进展情况		1、项目预验收完成 2、整改消缺。 备注：桥架、清洗、监控单独立项，未计入预验收报告					
	安全工作		现场巡视					
明日 计划	人员安排		管理人员：2 人；施工人员：6 人；监理：1 人；叉车：0 人；吊车人员：0 人					
	材料到货		无					
	安全工作		现场巡视					
	施工内容		1、整改消缺 2、清洗、监控系统安装。					
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		槽式桥架						
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	100	4400	99%
		逆变器安装	kW	4446.83	100	4400	99%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	100	4400	99%
		防雷接地	kW	4446.83	100	4400	99%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	3200	75%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%
		并网柜	kW	4446.83	100	4400	99%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况


- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节
- 三、资料方面：监理初检、预验收报告
- 四、现场施工现共计 6 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证

监理日报

合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

附一：施工过程及监督检查图片

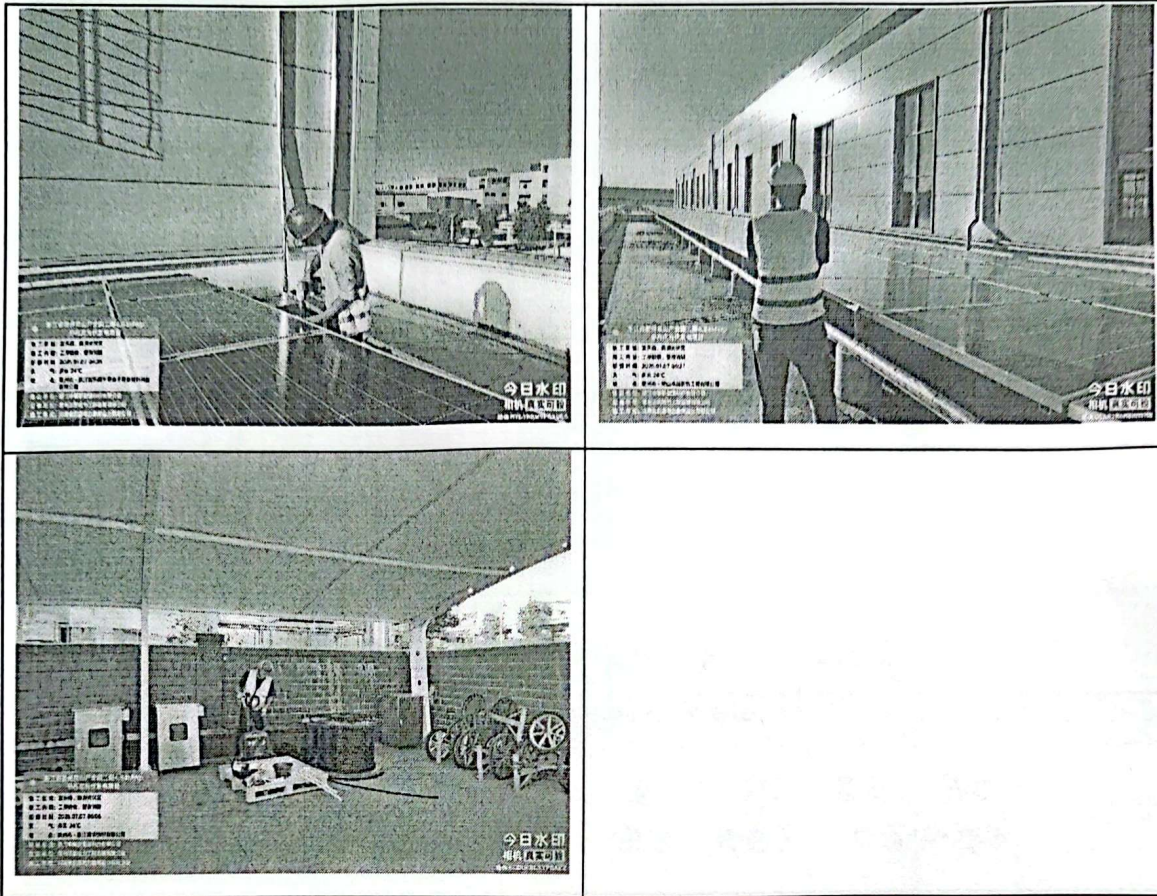

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.07.08 (星期二)		晴	温度: 26-39℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 2人; 施工人员: 7人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、清洗系统安装 2、整改消缺。						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 2人; 施工人员: 6人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、整改消缺 2、清洗、监控系统安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4400	99%
		清洗系统安装	kW	4446.83	100	3300	76%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%
		并网柜	kW	4446.83	0	4400	99%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

一、工程施工安全：无隐患

二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节


三、资料方面：无

四、现场施工现共计 7 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

监理日报

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

附一：施工过程及监督检查图片

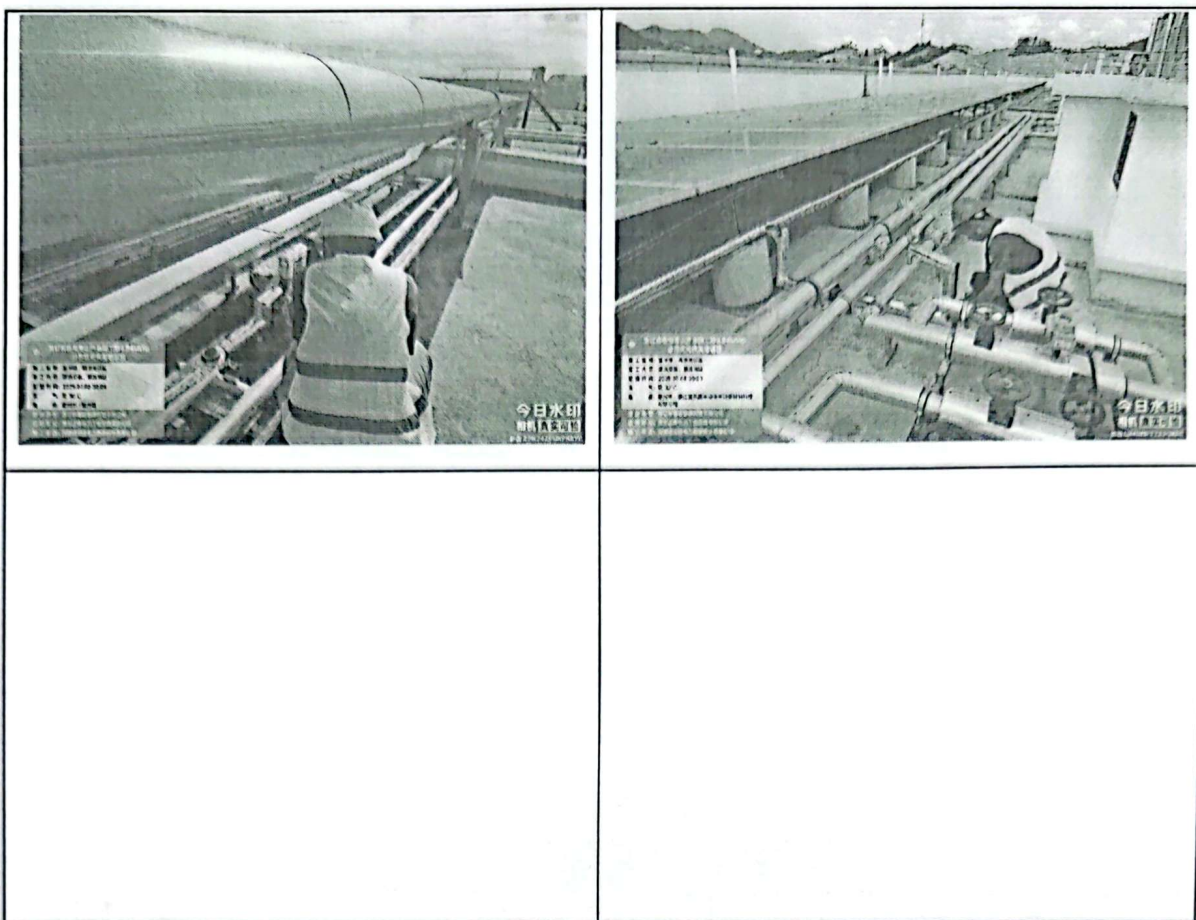

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025. 07. 09 (星期三)		晴	温度: 26-39℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 2 人; 施工人员: 7 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、清洗系统安装 2、整改消缺。						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 2 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、整改消缺 2、清洗、监控系统安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4400	99%
		清洗系统安装	kW	4446.83	100	3400	77%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%
		并网柜	kW	4446.83	0	4400	99%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

一、工程施工安全：无隐患

二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节


三、资料方面：无

四、现场施工现共计 7 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

监理日报

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

附一：施工过程及监督检查图片

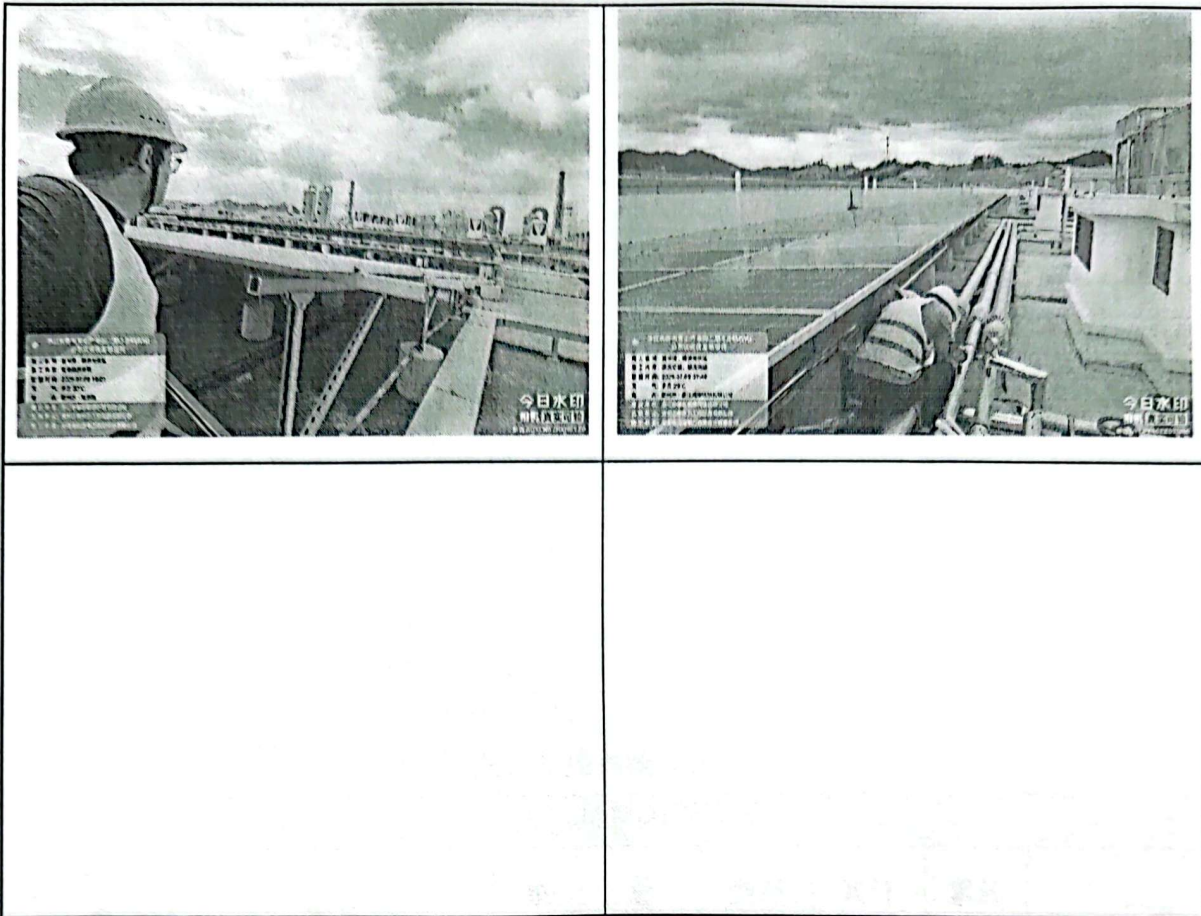

监理日报

项目名称		浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目						
建设单位		浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理		向威	
承包单位		河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理		张翔	
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监		张献兵	记录员 陈大伟
填报日期		2025. 07. 10（星期四）		晴	温度：26-39℃		风力：1 级	
当日 进度	人员安排		管理人员：2 人；施工人员：7 人；监理：1 人；叉车：0 人；吊车人员：0 人					
	机械车辆		吊车 0 台、叉车 0 台					
	材料到货		无					
	施工进展情况		1、清洗系统安装。 2、整改消缺。					
	安全工作		现场巡视					
明日 计划	人员安排		管理人员：2 人；施工人员：6 人；监理：1 人；叉车：0 人；吊车人员：0 人					
	材料到货		无					
	安全工作		现场巡视					
	施工内容		1、整改消缺。 2、清洗、监控系统安装。					
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4400	99%
		清洗系统安装	kW	4446.83	100	3500	78%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%
		并网柜	kW	4446.83	0	4400	99%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

一、工程施工安全：无隐患

二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节


三、资料方面：无

四、现场施工现共计 7 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

监理日报

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

附一：施工过程及监督检查图片

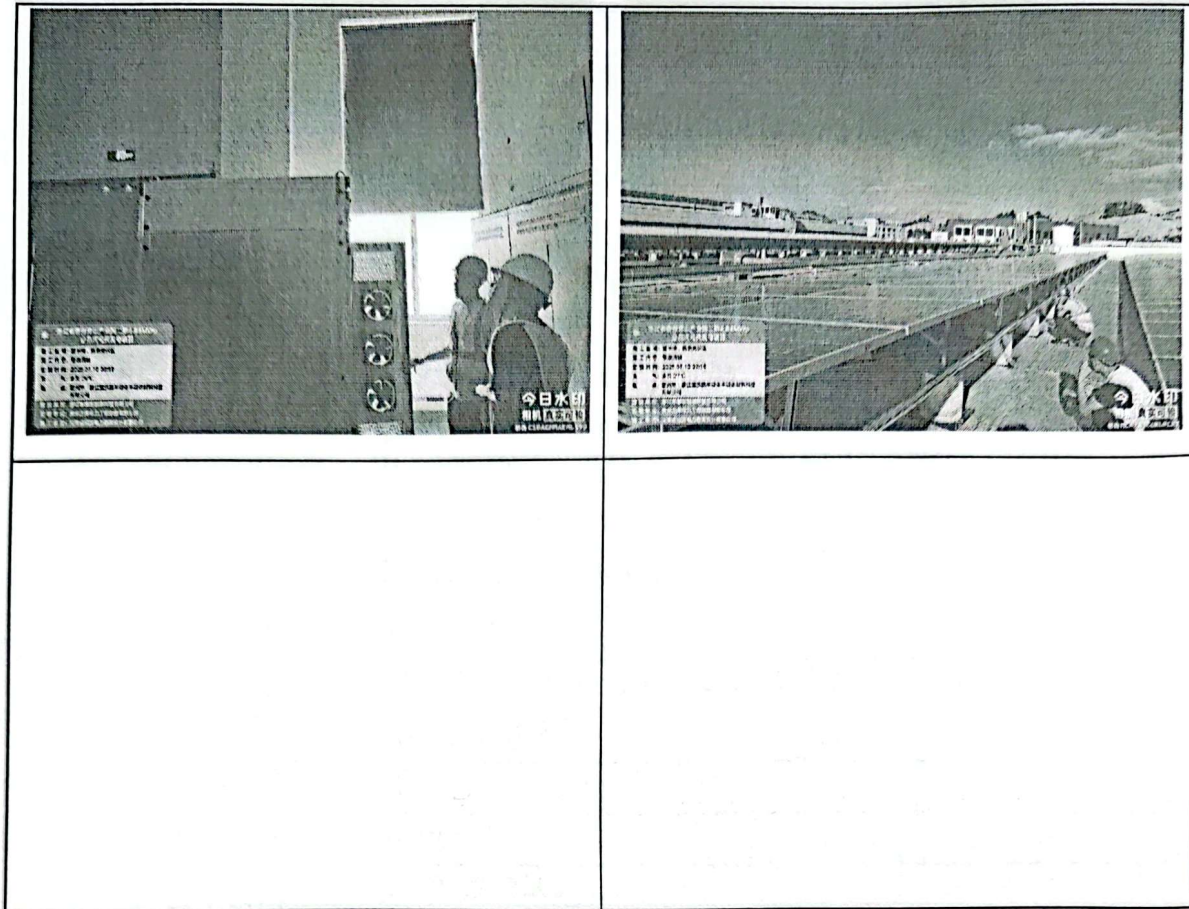

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.07.11 (星期五)		晴	温度: 28-39℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 2 人; 施工人员: 7 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、盾源、富乐德清洗安装 2、盾源、富乐德整改消缺 3、安全文明施工整顿 4、资料报审、批复 5、监控、清洗系统取点勘察						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 2 人; 施工人员: 6 人; 监理: 1 人; 叉车: 0 人; 吊车人员: 0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、整改消缺。 2、清洗、监控系统安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4400	99%
		清洗系统安装	kW	4446.83	100	3600	79%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%
		并网柜	kW	4446.83	0	4400	99%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

一、工程施工安全：无隐患

二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节


监理日报

三、资料方面：无

四、现场施工现共计 7 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

附一：施工过程及监督检查图片

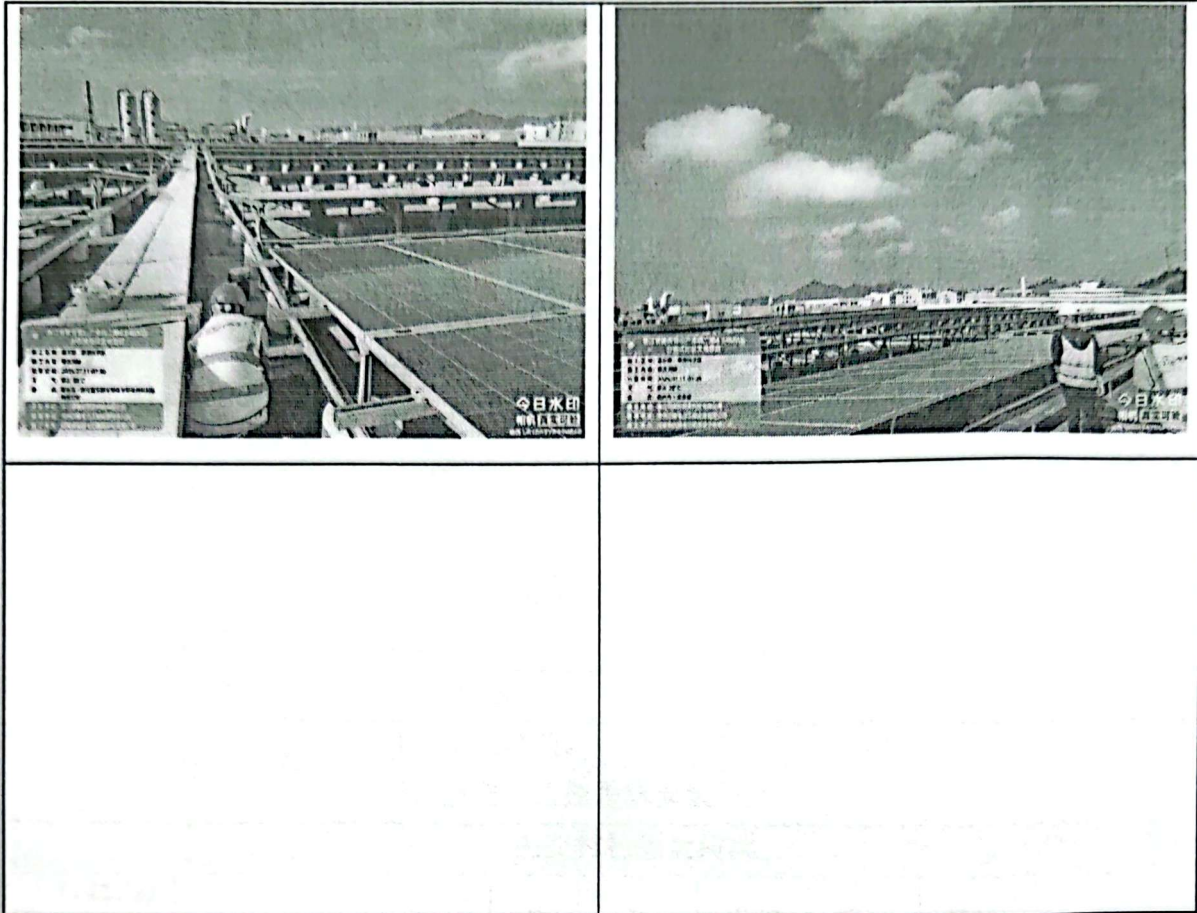

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025.07.12 (星期六)		晴	温度: 26-37℃		风力: 1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员: 2人; 施工人员: 7人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	机械车辆	吊车 0台、叉车 0台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、盾源、富乐德清洗安装 2、盾源、富乐德整改消缺 3、安全文明施工整顿 4、资料报审、批复 5、监控、清洗系统取点勘察						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员: 2人; 施工人员: 7人; 监理: 1人; 叉车: 0人; 吊车人员: 0人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、整改消缺。 2、清洗、监控系统安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4400	99%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	3700	79%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%
		并网柜	kW	4446.83	0	4400	99%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

一、工程施工安全：无隐患

二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节


监理日报

三、资料方面：无

四、现场施工现共计 7 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

附一：施工过程及监督检查图片

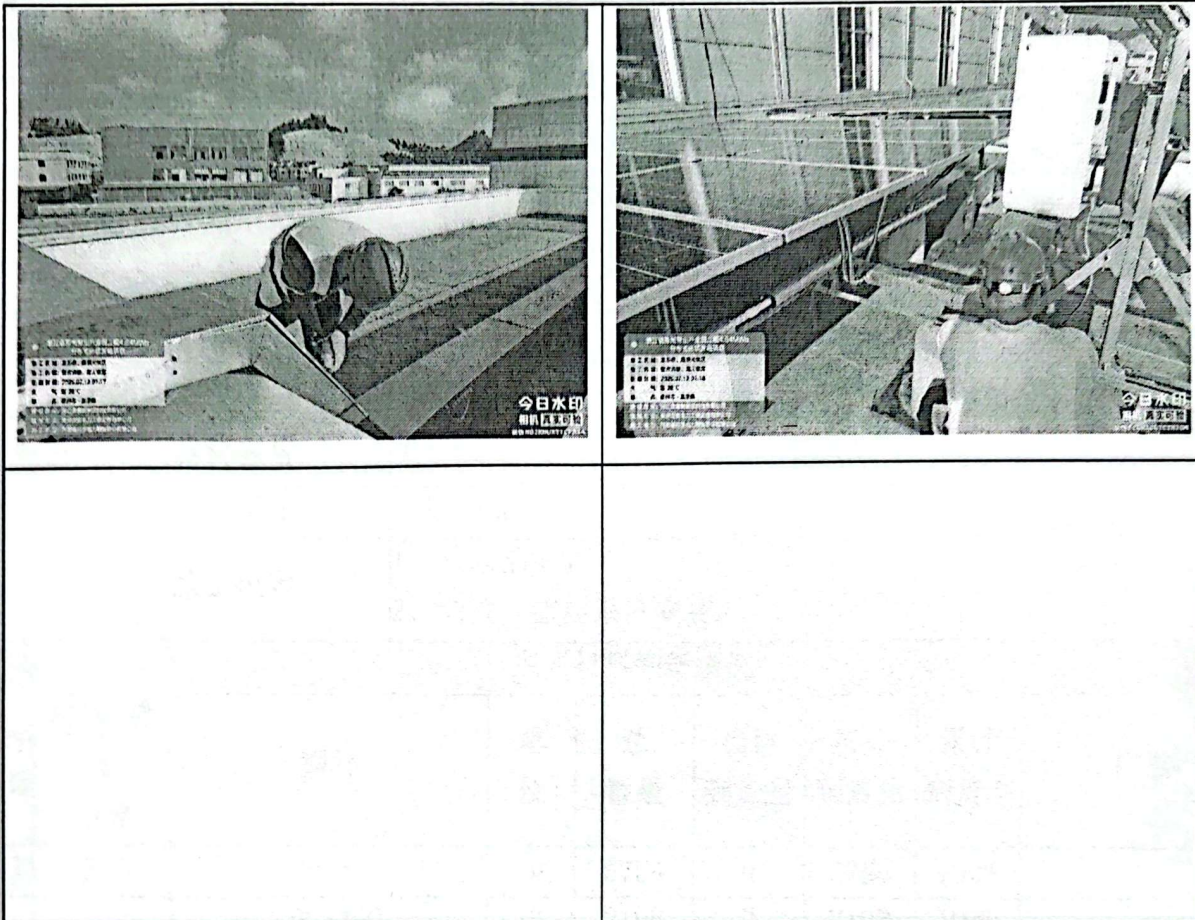

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025. 07. 13（星期日）		晴	温度：26-37℃		风力：1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员：2 人；施工人员：7 人；监理：1 人；叉车：0 人；吊车人员：0 人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、资料报审、批复 2、因雨停工						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员：2 人；施工人员：7 人；监理：1 人；叉车：0 人；吊车人员：0 人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、整改消缺。 2、清洗、监控系统安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm ²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm ²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4400	99%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	3700	79%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%
		并网柜	kW	4446.83	0	4400	99%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

一、工程施工安全：无隐患

二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节

三、资料方面：无

四、现场施工现共计 0 人；叉车 0 人，吊装 0 人。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

监理日报

项目名称	浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目							
建设单位	浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理	向威			
承包单位	河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理	张翔			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	陈大伟	
填报日期	2025. 07. 14（星期一）		晴	温度：26-37℃		风力：1 级		
当日 进度	人员安排	管理人员：2人；施工人员：3人；监理：1人；叉车：0人；吊车人员：0人						
	机械车辆	吊车 0 台、叉车 0 台						
	材料到货	无						
	施工进展情况	1、富乐德清洗安装 2、富乐德整改消缺 3、安全文明施工整顿 4、资料报审、批复 5、监控、清洗系统取点勘察						
	安全工作	现场巡视						
明日 计划	人员安排	管理人员：2人；施工人员：7人；监理：1人；叉车：0人；吊车人员：0人						
	材料到货	无						
	安全工作	现场巡视						
	施工内容	1、整改消缺。 2、清洗、监控系统安装。						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4400	99%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	3700	79%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%
		并网柜	kW	4446.83	0	4400	99%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

一、工程施工安全：无隐患

二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节


监理日报

三、资料方面：无

四、现场施工现共计 3 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

附一：施工过程及监督检查图片

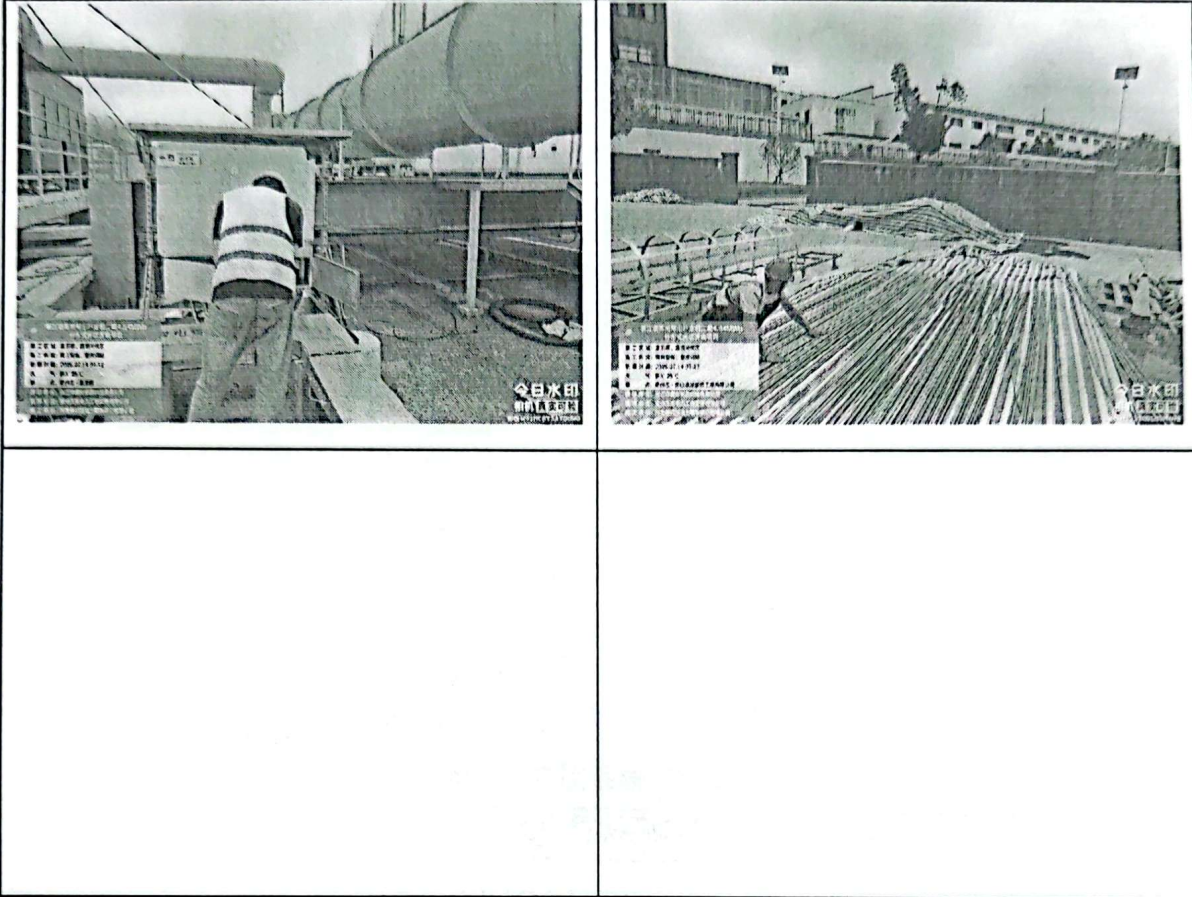

监理日报

		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4400	99%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	3700	79%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%
		并网柜	kW	4446.83	0	4400	99%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节


监理日报

三、资料方面：无

四、现场施工现共计 3 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，竣工图未最后定版，定版后做最后的数据更新。

附一：施工过程及监督检查图片

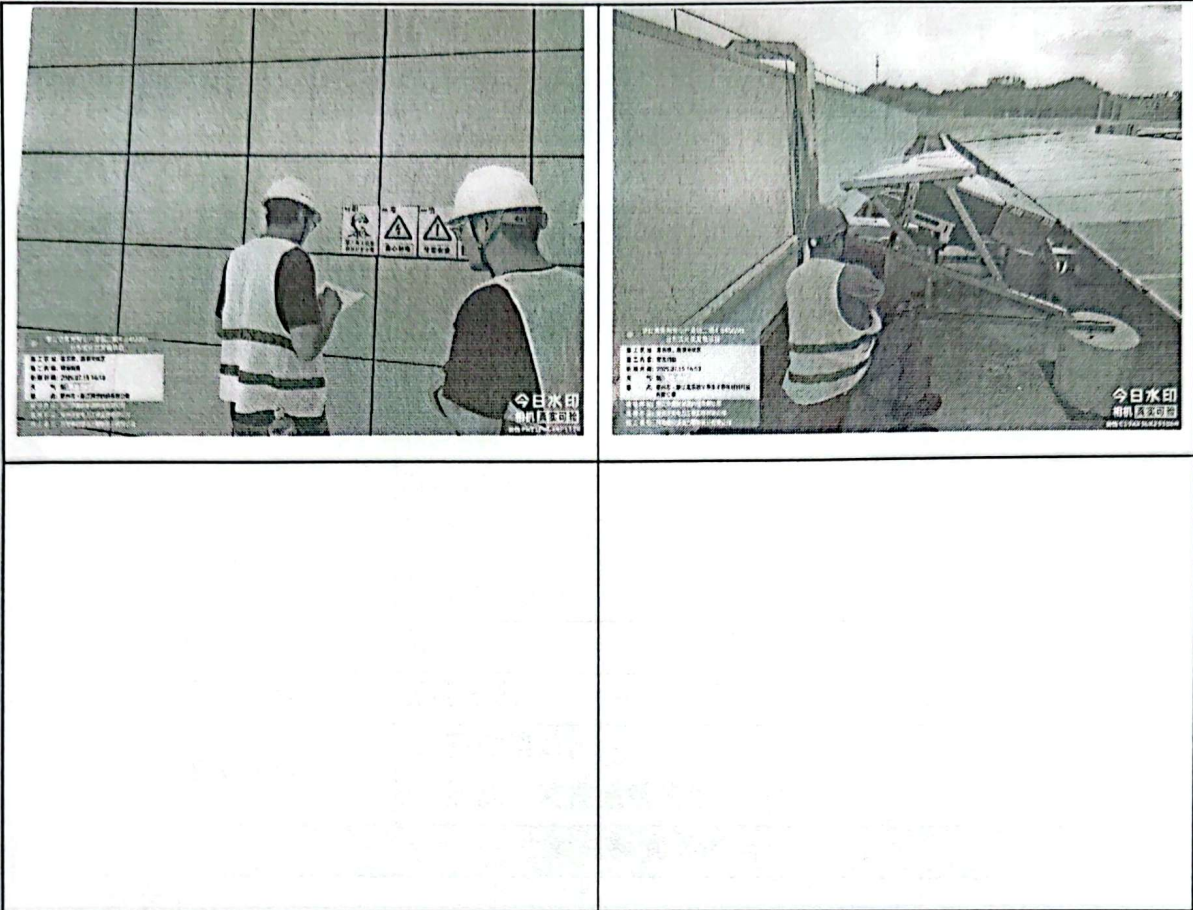

监理日报

项目名称		浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目						
建设单位		浙江申曜新能源科技有限公司			项目经理		向威	
承包单位		河南省启源电力勘测设计有限公司			项目经理		张翔	
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监		张献兵	记录员 陈大伟
填报日期		2025.07.16（星期三）		晴	温度：26-37℃		风力：1 级	
当日 进度	人员安排		管理人员：2 人；施工人员：3 人；监理：1 人；叉车：0 人；吊车人员：0 人					
	机械车辆		吊车 0 台、叉车 0 台					
	材料到货		无					
	施工进展情况		1、富乐德尾工收尾 2、富乐德整改消缺 3、安全文明施工整顿 4、资料报审、批复 5、项目交接、资料归档					
	安全工作		现场巡视					
明日 计划	人员安排		管理人员：2 人；施工人员：7 人；监理：1 人；叉车：0 人；吊车人员：0 人					
	材料到货		无					
	安全工作		现场巡视					
	施工内容		1、整改消缺。 2、清洗、监控系统安装。					
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	组件	595WP	块	5754	0	5754	100%	
2	配重块	400x300	块	2198	0	2198	100%	
		400x400	块	2795	0	2795	100%	
		400x350	块	2138	0	2138	100%	
3	逆变器	40KW	台	1	0	1	100%	
		50KW	台	5	0	5	100%	
		100KW	台	4	0	4	100%	
		150KW	台	21	0	21	100%	
4	桥架	100×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	以现场实际测量为准
		150×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	

监理日报

		200×100mm 热镀锌直流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		400×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		800×100mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
		300×200mm 热镀锌交流槽式桥架	kW	4446.83	0	4446.83	100%	
5	直流电缆	PV1-F 1*4mm²	米	53200	0	53200	100%	
		PV1-F 1*6mm²	米	26000	0	26000	100%	
6	支架		kW	4446.83	0	4446.83	100%	
7	交流电缆	ZC-YJV-0.6/1-3×35+1×16	米	720	0	720	100%	以现场实际测量为准
		ZC-YJV-0.6/1-3×70+1×35	米	455	0	455	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×120+1×70	米	1855	0	1855	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×150+1×70	米	360	0	360	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×185+1×95	米	1140	0	1140	100%	
		ZC-YJV-0.6/1-3×240+1×120	米	260	0	260	100%	
8	并网柜	GGD	台	9	0	9	100%	

工程建设施工进度情况

序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计完成量	完成比率
		400x300 配重块	块	2198	0	2198	100%
		400x400 配重块	块	2795	0	2795	100%
		400x350 配重块	块	2138	0	2138	100%
		支架	kW	4446.83	0	4446.83	100%
		组件安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		直流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		逆变器安装	kW	4446.83	0	4400	99%
		桥架安装	kW	4446.83	0	4250	96%
		交流电缆敷设	kW	4446.83	0	4400	99%
		防雷接地	kW	4446.83	0	4400	99%
		清洗系统安装	kW	4446.83	0	3700	79%
		监控系统安装	kW	4446.83	0	2000	46%
		并网柜	kW	4446.83	0	4400	99%
		并网	kW	4446.83	0	0	0

监理情况

- 一、工程施工安全：无隐患
- 二、工程施工质量：现场进入工程整体整改消缺环节

监理日报

三、资料方面：监理工作总结

四、现场施工现共计 3 人；叉车 0 人，吊装 0 人；监理班前会复核，现场施工人员证书人证合一，且在有效期内。

五、备注：1、安装容量及图纸频繁变更，竣工图未最后定版，定版后做最后的数据更新。

2、今日监理各类交接工作、资料归档，按合同要求监理明日起撤场。
