

监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日期	2025年04月03日	星期四	天气情况	多云	温度 13~23℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目. 康庄子项目. 师窑子项目。				
出勤人数	施工人员：58人 管理人员：5人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度情况	<p>西店子子项目：打桩完成：0根 总量：1560根 完成：995 占 比：63.7%，支架安装：0MW 总量：6.54MW 累计完成量：2.005MW 占总量30%，围栏安装：0米 总量：1906米 累计：1138米 占 总量：59.7%，设备基础：0座 总量：4座 累计完成：2座 占 总比：50% 组件安装：0块 总量：9594块 累计：1035块 占 比：10.8%，接地沟：完成：360米，总量：2000米，完成量： 1440，占总量：72%。</p> <p>霍北子项目：打桩完成：0根 总量：1381根 完成：1176 占 比：85% 支架安装：0.276MW 总量：5.87MW 累计完成量：0.554MW 占总量：9.5%，围栏安装：0米 总量：1358米 累计：1334米 占总量：98.2%，设备基础：1座 总量：4座 累计完成：3座 占总比：75%，组件安装：166块，总量：8372块，完成量：1615 块，占总量：19.2%，环网接地沟：40米，总量1300米 累计完 成：620米，完成总量的47.6%。</p> <p>康庄子项目：设备基础完成：0座，总量：5座 累计完成：4座， 占总量的80%。</p> <p>师窑子项目；设备基础完成：0座，总量：5座，累计完成：1座， 占总比例：80%</p>			
	施工质量情况	/			

	安全生产情况	安全生产情况可控		
	材料、设备进出场情况	/		
	监理发出指令情况	/		
	监理工作情况	1、巡视现场施工人员安全防护用品佩戴情况、2. 设备基础施工钢筋搭接检查、3. 外线电缆沟开挖检查、4. 霍北区：支架安装组件安装、5. 康庄区：升压箱变基础砌砖、6. 康庄区：环网接地施工、7. 项目部：第三次监理例会。		
	设计变更、核定单情况	/		
	现场需解决的问题	/		
	其他	无		
填 报 人	尤佳新	审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日期	2025年 04月 03日	星期四	天气情况	多云	温度 13~23℃
----	---------------	-----	------	----	--------------



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村西电子

施工内容: **设备基础施工**

拍摄时间: 2025.04.03 星期四
天气: 晴 19℃
地点: 邯郸市复兴区·贾沟村委会

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
ID: 69117UKRL78UB17LD



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村西电子

施工内容: **电缆沟开挖**

拍摄时间: 2025.04.03 星期四
天气: 晴 19℃
地点: 邯郸市复兴区·贾沟村委会

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
ID: 69117UKRL78UB17LD



常州正衡电力工程监理有限公司


施工区域: 贾沟村项目部

施工内容: **支架安装**

拍摄时间: 2025.04.03 星期四
天气: 晴 20℃
地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
ID: 69117UKRL78UB17LD

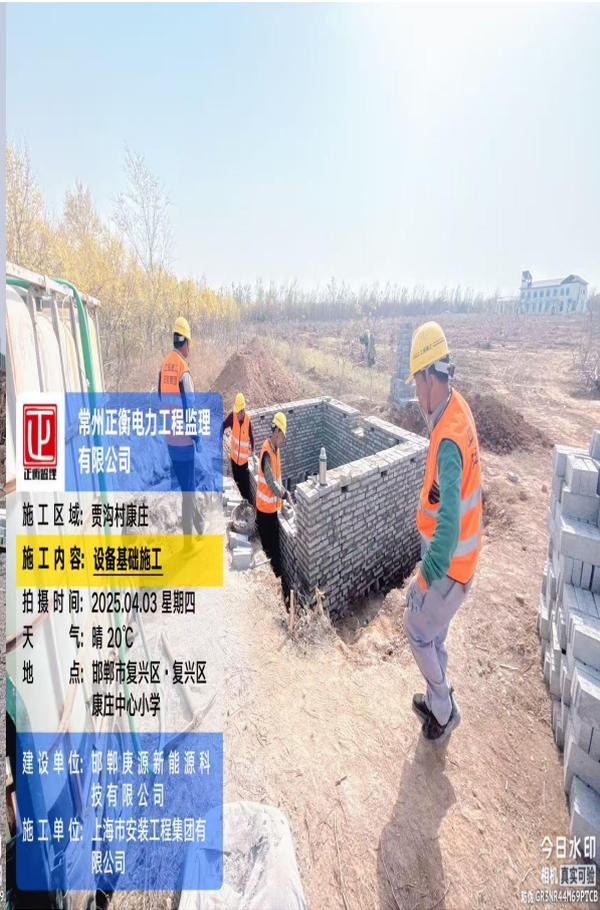

常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村康庄

施工内容: **设备基础施工**

拍摄时间: 2025.04.03 星期四
天气: 晴 20℃
地点: 邯郸市复兴区·复兴区康庄中心小学

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
ID: 69117UKRL78UB17LD



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 支架施工

拍摄时间: 2025.04.03 星期四

天气: 晴 20℃

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
编号: AYR1H1K4TX3ECT



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 设备基础施工

拍摄时间: 2025.04.03 星期四

天气: 晴 20℃

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
编号: B8TUEUW0GK9AU



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村项目部

施工内容: 监理例会

拍摄时间: 2025.04.03 星期四

天气: 晴 16℃

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
编号: EY1A2CNP03MND



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村康庄

施工内容: 环网接地施工

拍摄时间: 2025.04.03 星期四

天气: 晴 20℃

地点: 邯郸市复兴区·复兴区康庄中心小学

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
编号: P0MUB55H0G96W6



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村西电子

施工内容: 设备基础施工

拍摄时间: 2025.04.03 星期四

天气: 晴 19℃

地点: 邯郸市复兴区·贾沟村委会

建设单位: 邯郸庚源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 组件安装

拍摄时间: 2025.04.03 星期四

天气: 晴 20℃

地点: 邯郸市复兴区·贾沟村委会

建设单位: 邯郸庚源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

编写人

审核人
