

监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目


日期	2025年04月07日	星期一	天气情况	晴	温度 15~28℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目. 康庄子项目. 师窑子项目。				
出勤人数	施工人员：68人 管理人员：5人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度情况	西店子子项目：打桩完成：100根 总量：1560根 完成：1213 占 总比：77.7%，支架安装：0MW 总量：6.54MW 累计完成量：2.005MW 占总量30%，设备基础：0座 总量：4座 累计完成：4座 占 总比：100% 组件安装：0块 总量：9594块 累计：1035块 占 总比：10.8%，接地沟：完成：0米，总量：2000米，完成量： 1240，占总量：62%，电缆敷设（并网仓）297米，总量297米 已完成：100%。 霍北子项目：打桩完成：0根 总量：1381根 完成：1176 占总 比：85% 支架安装：0.664MW 总量：5.87MW 累计完成量：3.431MW 占总量：58.4%，设备基础：0座 总量：4座 累计完成：4座 占总比：100%，组件安装：553块，总量：8372块，完成量： 3684块，占总量：44%。康庄子项目：设备基础完成：0座，总 量：5座 累计完成：5座，占总量的100%，打桩完成：0根 总量： 1250根 已完成：110根，进度：8.8%。 师窑子项目；设备基础完成：2座，总量：5座，累计完成：5座， 占总比例：100%，电缆敷设（并网仓）253米 已完成：100%。			
	施工质量情况	/			
	安全生产情况	施工现场安全可控。			

	材料、设备 进出场情况	/		
	监理发出指 令情况	/		
	监理工作情 况	1、巡视现场施工人员安全防护用品佩戴情况、2、一二次设备进 场吊装、3、霍北区设备基础砌砖、4、霍北区支架组件安装、5、 康庄区环网接地施工、6、西店子区机械打桩。		
	设计变更、 核定单情况	/		
	现场需解决 的问题	/		
	其他	无		
填 报 人	尤佳新		审 核 人	

监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025年 04月 07日	一	天气情况	晴	温度 15~28℃
-----	---------------	---	------	---	--------------

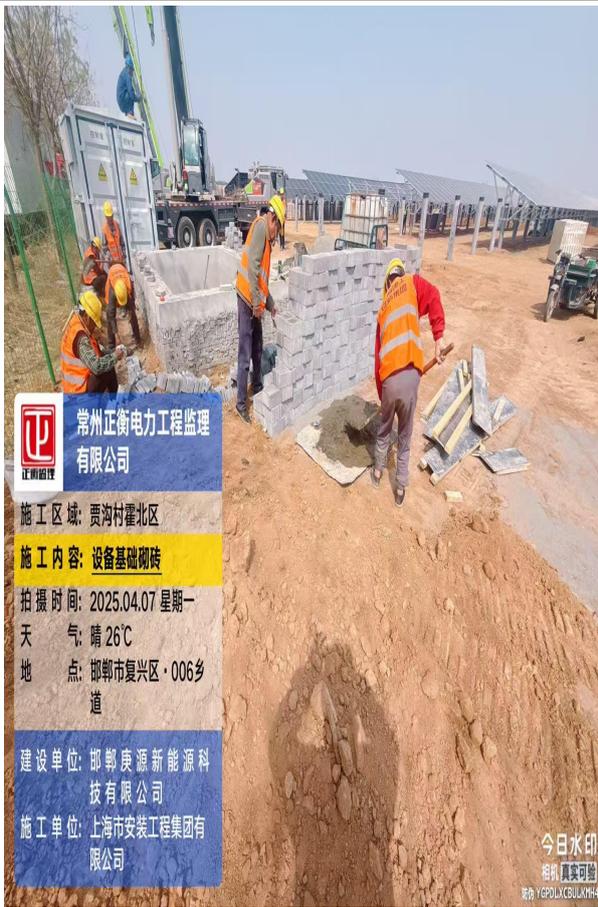

 常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 设备基础砌砖

拍摄时间: 2025.04.07 星期一

天气: 晴 26℃

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸康源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印
相机 真实可信
编号 YGPDUXCBULKPH4



 常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 组件安装

拍摄时间: 2025.04.07 星期一

天气: 晴 26℃

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸康源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印
相机 真实可信
编号 RXPYTBUA7C69AL



 常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 一二次设备吊装

拍摄时间: 2025.04.07 星期一


天气: 晴 26℃

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸康源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印
相机 真实可信
编号 ZH41LU18BKH36

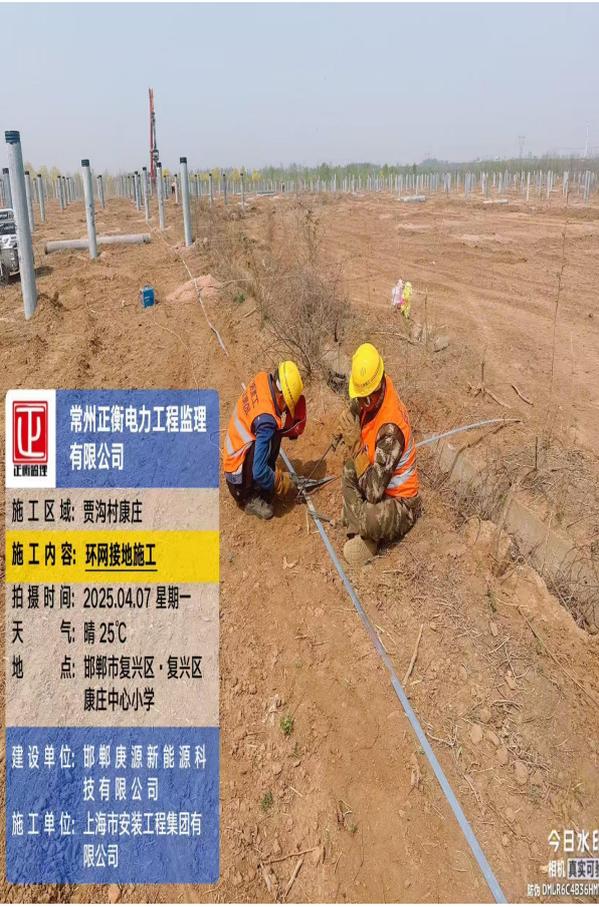

 常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 贾沟村康庄

施工内容: 环网接地施工

拍摄时间: 2025.04.07 星期一


天气: 晴 25℃

地点: 邯郸市复兴区·复兴区
康庄中心小学

建设单位: 邯郸康源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印
相机 真实可信
编号 DMUR6C4B36HMY3

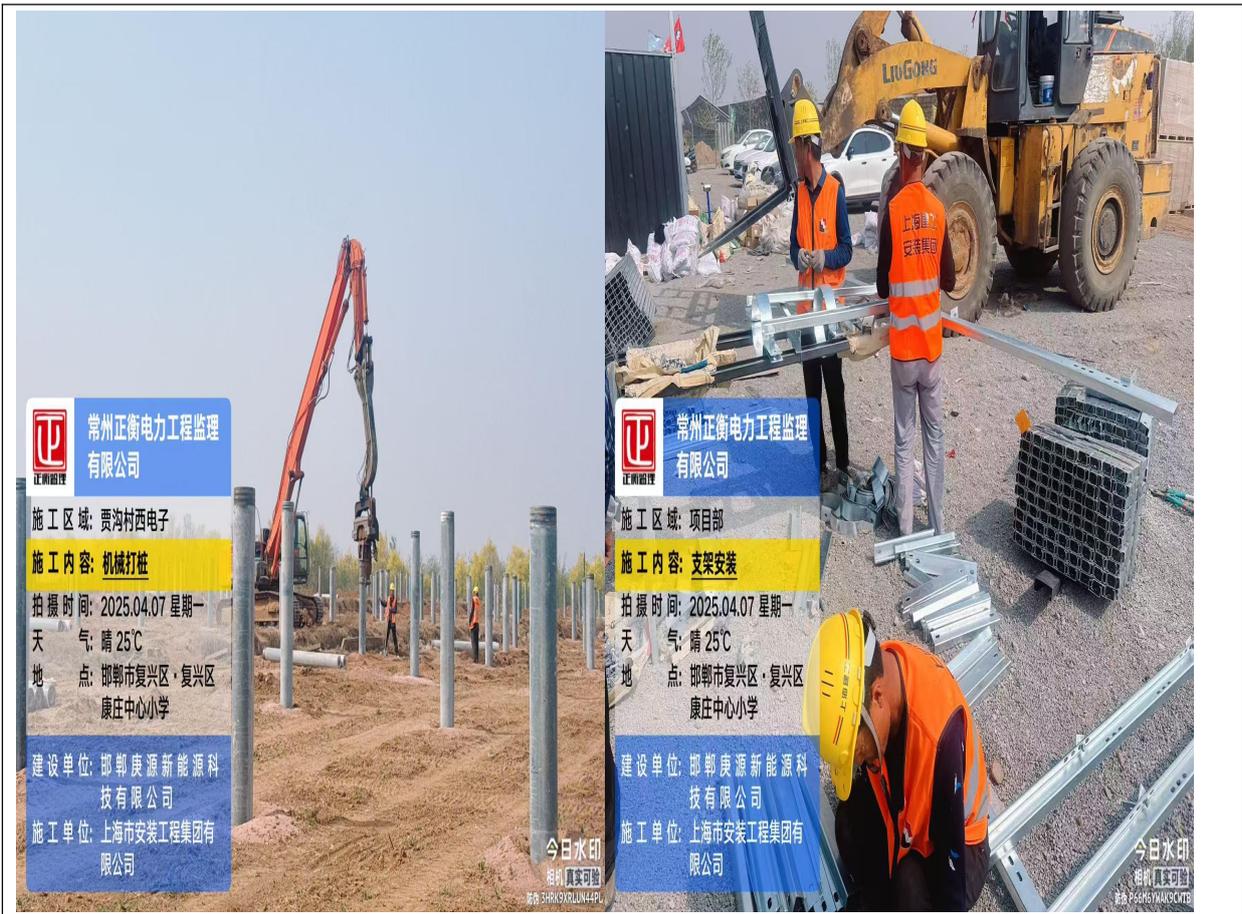

编写人		审核人	
-----	--	-----	--
