

监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025 年 04 月 10 日	星期四	天气情况	多云	温度 16~28℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目. 康庄子项目. 师窑子项目。				
出勤人数	施工人员：68 人 管理人员：5 人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度情况	西店子子项目：打桩完成：104 根 总量：1560 根 完成:1392 占总比:82.5%，支架安装:0MW 总量:6.54MW 累计完成量:2.005MW 占总量 30%，设备基础 ：0 座 总量：4 座 累计完成：4 座 占总比：100% 组件安装：0 块 总量：9594 块 累计：1035 块 占总比：10.8%，接地沟：完成：0 米，总量：2000 米，完成量：1240，占总量：62%，电缆敷设（并网仓）297 米，总量 297 米 已完成：100%。 霍北子项目：打桩完成；0 根 总量：1381 根 完成：1176 占总比:85% 支架安装:0.553MW 总量:5.87MW 累计完成量:5.201MW 占总量：88.6%，设备基础 ：0 座 总量：4 座 累计完成：4 座 占总比：100%，组件安装：390 块，总量：8372 块，完成量：4493 块，占总量：53.6%。 康庄子项目；设备基础完成；0 座,总量：5 座 累计完成:5 座, 占总量的 100%，打桩完成：40 根 总量：1250 根 已完成：150 根，进度：12% 高压电缆敷设 总量 288 米，完成 100 米 总量的 34.7%。 师窑子项目;设备基础完成：5 座，总量：5 座，累计完成：5 座， 占总比例：100%，电缆敷设（并网仓）253 米 已完成：100% 打桩完成 0 根，总量：101，累计完成 1319 根 完成 7.6%。			

	施工质量 情 况	/		
	安全生产 情 况	施工现场安全可控。		
	材料、设备 进出场情况	/		
	监理发出指 令情况	/		
	监理工作情 况	1、巡视现场施工人员安全防护用品佩戴情况、、2、霍北区支架 组件安装、3、直流电缆放线、4、环网接地施工、5、		
	设计变更、 核定单情况	/		
	现场需解决 的问题	/		
	其他	无		
填 报 人	尤佳新		审 核 人	

监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025 年 04 月 10 日	星期四	天气情况	多云 1	温度 16~28℃
-----	------------------	-----	------	------	--------------



常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 组件安装

拍摄时间: 2025.04.10 星期四

天气: 轻度雾霾 24℃

地点: 邯郸市复兴区·贾沟
村委会

建设单位: 邯郸庚源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印
相机 真实可信
编号: 1THOU9LYYOU96A



常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 支架安装

拍摄时间: 2025.04.10 星期四

天气: 轻度雾霾 24℃

地点: 邯郸市复兴区·贾沟
村委会

建设单位: 邯郸庚源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印
相机 真实可信
编号: A6J3K9RB4KKW1C



常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 贾沟村康庄区

施工内容: 定位引孔

拍摄时间: 2025.04.10 星期四

天气: 晴 24℃

地点: 邯郸市复兴区·复兴区
康庄中心小学

建设单位: 邯郸庚源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印
相机 真实可信
编号: G9MT4URRCINVD0



常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 贾沟村密区

施工内容: 环网接地施工

拍摄时间: 2025.04.10 星期四

天气: 轻度雾霾 24℃

地点: 邯郸市复兴区·康庄乡
贾沟村卫生室

建设单位: 邯郸庚源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印
相机 真实可信
编号: 2XAS3PDASH1B1E



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 直流电缆放线

拍摄时间: 2025.04.10 星期四


天气: 轻度雾霾 24℃

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪 81M7ANT2A1TC63

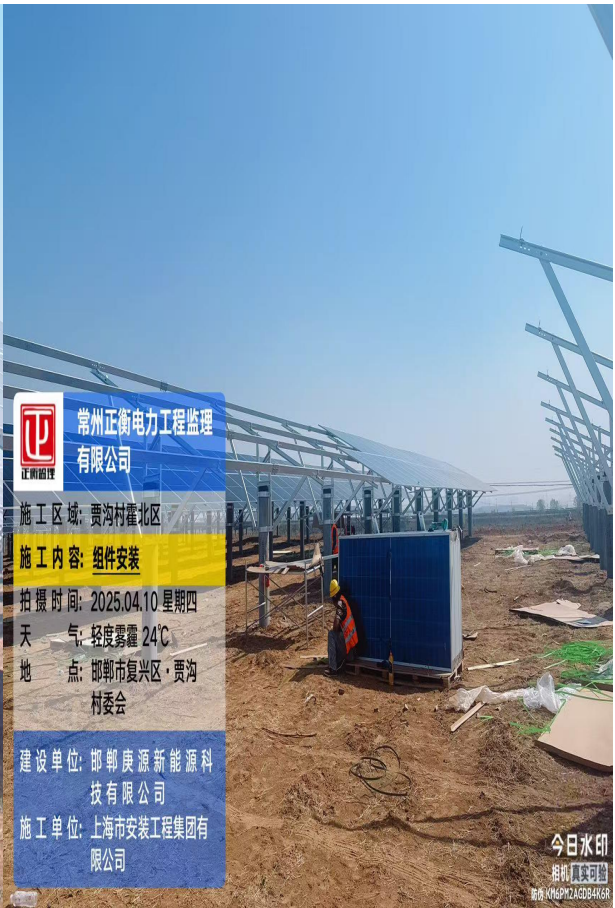

常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 组件安装

拍摄时间: 2025.04.10 星期四

天气: 轻度雾霾 24℃

地点: 邯郸市复兴区·贾沟村委会

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪 V96PM2AGD84868

编写人

审核人
