

监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日期	2025年04月13日	星期日	天气情况	晴强风	温度 12~23℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目. 康庄子项目. 师窑子项目。				
出勤人数	施工人员：68人 管理人员：5人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度情况	<p>西店子子项目：打桩完成：41根 总量：1560根 完成:1432 占比：91.7%，支架安装：1.02MW 总量：6.54MW 累计完成量：5.02MW 占总量78%，设备基础：0座 总量：4座 累计完成：4座 占比：100% 组件安装：0块 总量：9594块 累计：1035块 占比：10.8%，接地沟：完成：0米，总量：2000米，完成量：1240，占总量：62%，电缆敷设（并网仓）297米，总量297米已完成：100%。</p> <p>霍北子项目：打桩完成：0根 总量：1381根 完成：1176 占比：85% 支架安装：0MW 总量：5.87MW 累计完成量：5.479MW 占总量：91.2%，设备基础：0座 总量：4座 累计完成：4座 占比：100%，组件安装：546块，总量：8372块，完成量：5429块，占总量：64.8%，逆变器安装2台共完成9台。</p> <p>康庄子项目：设备基础完成：0座，总量：5座 累计完成：5座，占总量的100%，打桩完成：0根 总量：1250根 已完成：223根，进度：12% 高压电缆敷设 总量288米，完成100米 总量的34.7%。</p> <p>师窑子项目；设备基础完成：0座，总量：5座，累计完成：5座，占总比例：100%，高压电缆敷设253米 已完成：100%打桩完成0根，总量：101，累计完成1319根 完成7.6%。</p>			

	施工质量情况	/		
	安全生产情况	施工现场安全可控。		
	材料、设备进出场情况	/		
	监理发出指令情况	/		
	监理工作情况	1、巡视现场施工人员安全防护用品佩戴情况、2、霍北区支架安装，直流电缆放线、3、西店子区支架安装，设备基础砌砖、4、康庄区环网接地施工检查、5、项目部支架组装。		
	设计变更、核定单情况	/		
	现场需解决的问题	/		
	其他	无		
填 报 人	尤佳新	审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日期	2025年 04月 13日	星期日	天气情况	晴强风	温度 12~23℃
----	---------------	-----	------	-----	--------------



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 直流电缆放线

拍摄时间: 2025.04.13 星期日

天气: 大风 22℃

地点: 邯郸市复兴区·贾沟村村委会

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可靠
ID: CC363L02E-0D5B8



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村康庄

施工内容: 环网接地施工

拍摄时间: 2025.04.13 星期日


天气: 大风 21℃

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可靠
ID: M3A8EN1U9J066

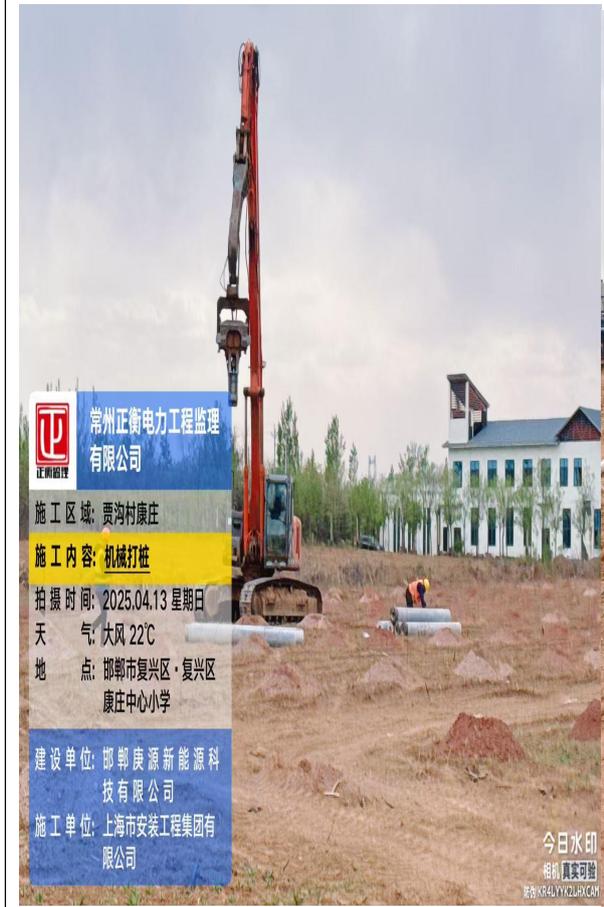

常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村康庄

施工内容: 机械打桩

拍摄时间: 2025.04.13 星期日

天气: 大风 22℃

地点: 邯郸市复兴区·复兴区康庄中心小学

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可靠
ID: X84LYK2URXCM



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村西店子区

施工内容: 电缆沟开挖

拍摄时间: 2025.04.13 星期日

天气: 大风 22℃

地点: 邯郸市复兴区·复兴区康庄中心小学

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可靠
ID: R9RTR1XR6C211



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村西店子区

施工内容: 通讯电缆放线

拍摄时间: 2025.04.13 星期日

天气: 大风 22℃

地点: 邯郸市复兴区·复兴区康庄中心小学

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
编号: YH48C9A9R1XCG6

常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 支架加固

拍摄时间: 2025.04.13 星期日

天气: 大风 22℃

地点: 邯郸市复兴区·贾沟村村委会

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
编号: U4R1ZKEA292H25

编写人		审核人	
-----	--	-----	--
