

监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目


日期	2025年04月14日	星期一	天气情况	晴	温度 15~24℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目. 康庄子项目. 师窑子项目。				
出勤人数	1、西店子：支架组装 18 人、支架安装 15 人、组件安装 21 人 2、霍北：组件安装 18 人、支架固定 5 人、逆变器安装 5 人、MC4 电缆头制作 4 人 3、康庄：打桩 4 人、接地扁铁 3 人 4、师窑：				
施工机械	无				
工作情况	施工进度情况	<p>西店子子项目：打桩完成：0 根 总量：1560 根 完成:1432 占 总 比：91.7%，支架安装：0.4MW 总量：6.54MW 累计完成量：5.42MW 占 总 量 82.8%，设备基础：0 座 总量：4 座 累计完成：4 座 占 总 比：100% 组件安装：884 块 总量：9594 块 累计：1451 块 占 总 比：15.1%，接地沟：完成：0 米，总量：2000 米，完成量：1240，占 总 量：62%，电缆敷设（并网仓）297 米，总量 297 米 已 完 成：100%。</p> <p>霍北子项目：打桩完成：0 根 总量：1381 根 完成：1176 占 总 比：85% 支架安装：0MW 总量：5.87MW 累计完成量：5.479MW 占 总 量：91.2%，设备基础：0 座 总量：4 座 累计完成：4 座 占 总 比：100%，组件安装：728 块，总量：8372 块，完成量：6157 块，占 总 量：73.58%，逆变器安装 2 台共完成 9 台。</p> <p>康庄子项目：设备基础完成：0 座，总量：5 座 累计完成：5 座，占 总 量 的 100%，打桩完成：100 根 总量：1250 根 已 完 成：403 根，进 度：12% 高 压 电 缆 敷 设 总 量 288 米，完 成 100 米 总 量 的 34.7% 支 架 安 装 完 成 0.816MW，总 量 7MW，累 计 完 成 量 1.16 %。</p>			

	师窑子项目;设备基础完成: 0 座, 总量: 5 座, 累计完成: 5 座, 占总比例: 100%, 高压电缆敷设 253 米 已完成: 100%打桩完成 0 根, 总量: 101, 累计完成 1319 根 完成 7.6%。		
施工质量情况	/		
安全生产情况	施工现场安全可控。		
材料、设备进出场情况	/		
监理发出指令情况	/		
监理工作情况	1、巡视现场施工人员安全防护用品佩戴情况、2、霍北区直流电缆放线、逆变器 MC4 电缆头制作、3、师窑区设备基础砌砖、4 康庄区支架安装。		
设计变更、核定单情况	/		
现场需解决的问题	/		
其他	无		
填 报 人	尤佳新	审 核 人	

监理工程日报影像

工程名称: 河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 14 日	星期一	天气情况	晴	温度 15~24℃
----	------------------	-----	------	---	--------------

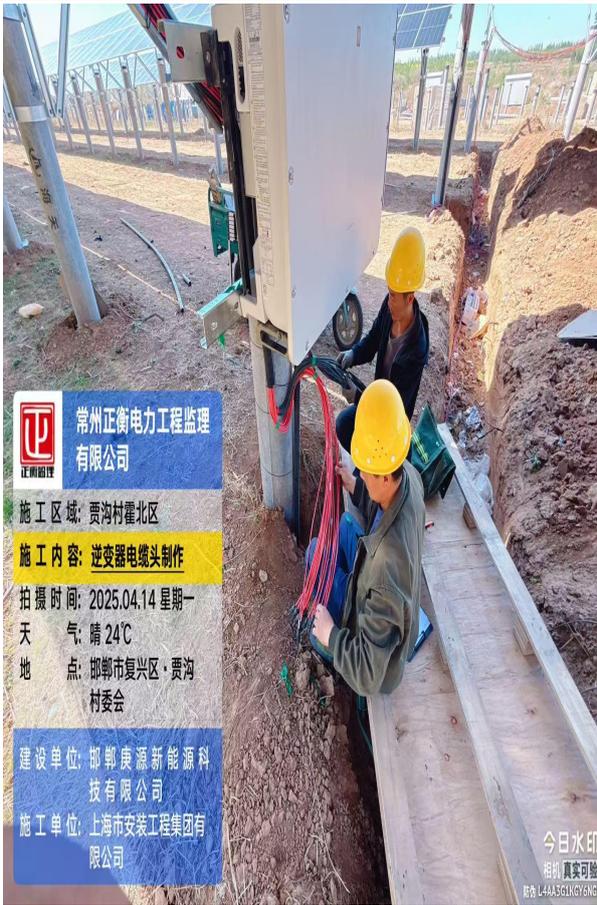

常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 逆变器电缆头制作

拍摄时间: 2025.04.14 星期一
天气: 晴 24℃
地点: 邯郸市复兴区·贾沟村村委会

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
型号: L44A3G1X6YNCR



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 直流电缆放线

拍摄时间: 2025.04.14 星期一
天气: 晴 24℃
地点: 邯郸市复兴区·贾沟村村委会

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
型号: L44A3G1X6YNCR



常州正衡电力工程监理有限公司


施工区域: 贾沟村师窑区支架安装

施工内容: 设备基础砌砖

拍摄时间: 2025.04.14 星期一
天气: 晴 25℃
地点: 邯郸市复兴区·贾沟村村委会

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
型号: AMUC23P3E2MEGH

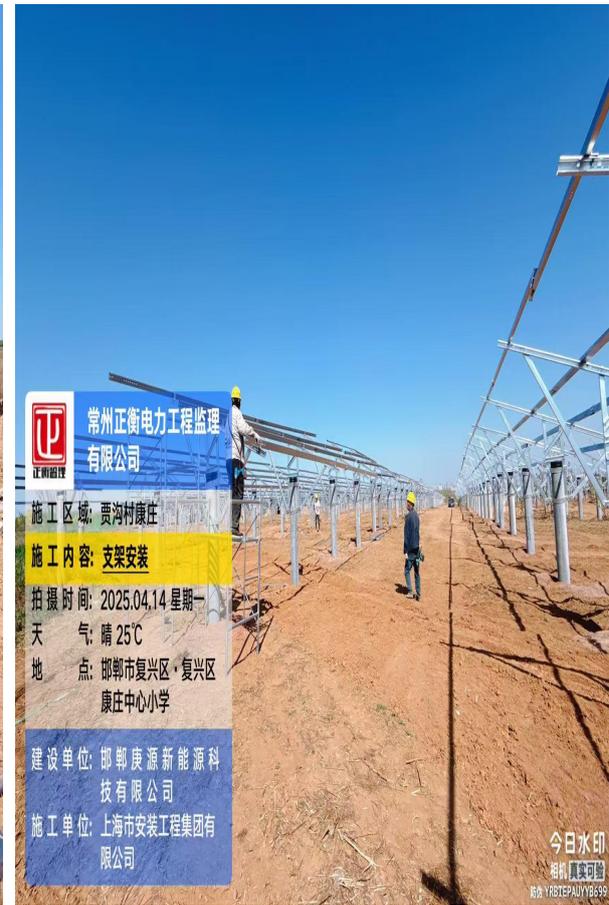

常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村康庄

施工内容: 支架安装

拍摄时间: 2025.04.14 星期一
天气: 晴 25℃
地点: 邯郸市复兴区·复兴区康庄中心小学

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
型号: Y28TEPALUY8699



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村窑区支架安装

施工内容: 组件安装

拍摄时间: 2025.04.14 星期一

天气: 晴 25℃

地点: 邯郸市复兴区·贾沟村村委会

建设单位: 邯郸庚源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村西店子

施工内容: 组件安装

拍摄时间: 2025.04.14 星期一

天气: 晴 25℃

地点: 邯郸市复兴区·复兴区康庄中心小学

建设单位: 邯郸庚源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村康庄

施工内容: 支架安装

拍摄时间: 2025.04.14 星期一

天气: 晴 25℃

地点: 邯郸市复兴区·复兴区康庄中心小学

建设单位: 邯郸庚源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

编写人		审核人	
-----	--	-----	--

