

监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 22 日	星期二	天气情况	多云	温度 16~26℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目. 康庄子项目. 师窑子项目。				
出勤人数	1、西店子：支架安装 15 人、组件安装 15 人 2、霍北：直流电缆敷设 9 人、支架固定 5 人、MC4 电缆头制作 4 人 3、康庄：支架安装 15 人、组件安装 21 人、打桩 4 人、接地扁铁 3 人 4、师窑：引孔 2 人				
施工机械	施工人员 116 人。引孔机 3 台，打桩机 1 台，装载机 3 台，拉管机 2 台，吊机 25T 2 台，挖掘机 220 型 3 台，挖掘机 75 型 2 台。				
工作情况	施工进度情况	西店子子项目：打桩完成：0 根 总量：1560 根 完成:1432 占占比：91.7%，支架安装：0MW 总量：6.54MW 累计完成量：5.42MW 占总量 82.8%，设备基础：0 座 总量：4 座 累计完成：4 座 占占比：100% 组件安装：156 块 总量：9594 块累计：77483 块 占占比：81.5%，电缆敷设（并网仓）297 米，总量 297 米已完成：100%，逆变器安装 1 台共计安装 10 台。 霍北子项目：打桩完成：0 根 总量：1381 根 完成：1176 占占比:85% 支架安装：0MW 总量：5.87MW 累计完成量：5.479MW 占总量：91.2%，设备基础：0 座 总量：4 座 累计完成：4 座 占占比：100%，组件安装：0 块，总量：8372 块，完成量：7717 块，占总量：92%，逆变器安装 3 台共完成 12 台。 康庄子项目：组件安装完成 624 块 总量 9360 块 累计完成 4498 块 占总量的 47.7% 设备基础完成：0 座, 总量：5 座 累计完成:5 座, 占总量的 100%，打桩完成：110 根 总量：1250 根 已完成：1153 根，进度：92% 高压电缆敷设 总量 288 米，完成 100 米 总量的 34.7% 支架安装完成 0.28MW，总量 7MW，累计完成量 78%。 师窑子项目;支架安装完成 0MW 总量 8MW 累计完成 0.6MW 占			

		总量的 10.9% 设备基础完成：0 座，总量：5 座，累计完成：5 座， 占总比例：100%， 高压电缆敷设 253 米 已完成：100 % 打桩完成 0 根，总量：101， 累计完成 541 根 完成 41%。		
	施工质量 情 况	/		
	安全生产 情 况	施工现场安全可控。		
	材料、设备 进出场情况	/		
	监理发出指 令情况	/		
	监理工作情 况	1、巡视现场施工人员安全防护用品佩戴情况、2、师窑区设备基础抹灰，电缆沟开挖检查、3、康庄区支架组件安装、4、西店子区一二次设备进线柜电缆头压接，支架组件安装，直流电缆放线，逆变器交流电缆头压接安装，MC4 插头制作安装。		
	设计变更、 核定单情况	/		
	现场需解决 的问题	/		
	其他	无		
填 报 人	尤佳新		审 核 人	

监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025 年 04 月 22 日	星期二	天气情况	多云	温度 16~26℃
-----	------------------	-----	------	----	--------------



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村师客

施工内容: 出线柜电缆头压接

拍摄时间: 2025.04.23 星期三


天气: 晴 31℃

地点: 邯郸市复兴区·贾沟村村委会

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪 M40PP31GKUTRHU

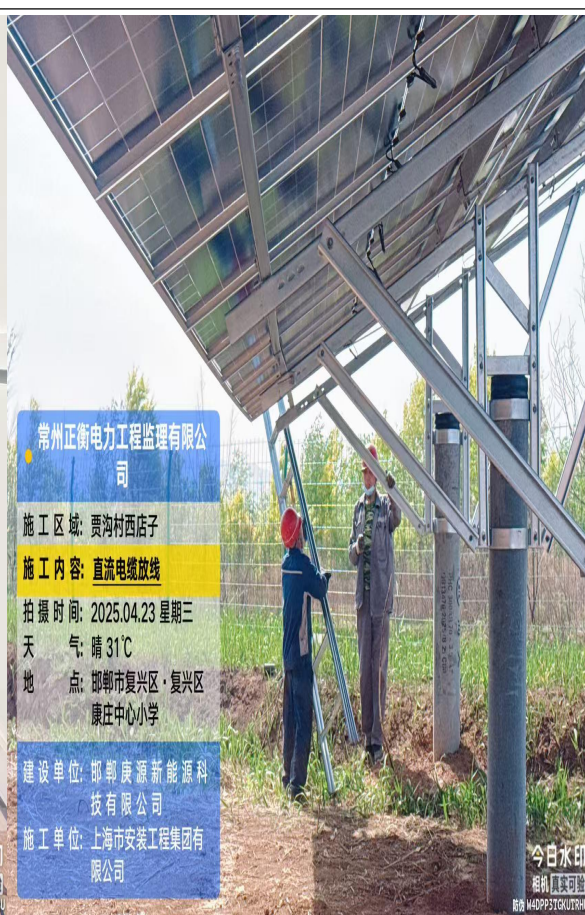

常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村西店子

施工内容: 直流电缆放线

拍摄时间: 2025.04.23 星期三

天气: 晴 31℃

地点: 邯郸市复兴区·复兴区康庄中心小学

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪 M40PP31GKUTRHU



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村康庄

施工内容: 逆变器交流电缆头制作安装

拍摄时间: 2025.04.23 星期三

天气: 晴 31℃

地点: 邯郸市复兴区·复兴区康庄中心小学

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪 M40PP31GKUTRHU



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村项目部

施工内容: 支架组装

拍摄时间: 2025.04.23 星期三

天气: 晴 30℃

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪 M40PP31GKUTRHU



编写人

审核人

