

# 监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目


日期	2025年04月24日	星期四	天气情况	多云	温度 16~26℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目. 康庄子项目. 师窑子项目。				
出勤人数	1、西店子：支架安装 15 人、组件安装 15 人 2、霍北：直流电缆敷设 9 人、支架固定 5 人、MC4 电缆头制作 4 人 3、康庄：支架安装 15 人、组件安装 21 人、打桩 4 人、接地扁铁 3 人 4、师窑：引孔 2 人				
施工机械	施工人员 116 人。引孔机 3 台，打桩机 1 台，装载机 3 台，拉管机 2 台，吊机 25T 2 台，挖掘机 220 型 3 台，挖掘机 75 型 2 台。				
工作情况	施工进度情况	<p>西店子子项目：打桩完成：0 根 总量：1560 根 完成:1432 占对比：91.7%，支架安装：0MW 总量：6.54MW 累计完成量：5.42MW 占总量 82.8%，设备基础：0 座 总量：4 座 累计完成：4 座 占对比：100% 组件安装：234 块 总量：9594 块累计：7726 块 占对比：81.5%，电缆敷设（并网仓）297 米，总量 297 米已完成：100%，逆变器安装 2 台共计安装 15 台。</p> <p>霍北子项目：打桩完成：0 根 总量：1381 根 完成：1176 占对比:85% 支架安装：0MW 总量：5.87MW 累计完成量：5.479MW 占总量：91.2%，设备基础：0 座 总量：4 座 累计完成：4 座 占对比：100%，组件安装：0 块，总量：8372 块，完成量：7717 块，占总量：92%，逆变器安装 3 台共完成 12 台。</p> <p>康庄子项目；组件安装完成 624 块 总量 9360 块 累计完成 5902 块 占总量的 56.1% 设备基础已全部完成 100%，打桩已全部完成：1250 根，进度：100% 高压电缆敷设 总量 288 米，完成 100 米 总量的 34.7% 支架安装完成 1.12MW，总量 7MW，累计完成量 78%逆变器安装 3 台共计安装 11 台。</p> <p>师窑子项目；支架安装完成 1.2MW 总量 8MW 累计完成 2.4MW 占总量的 41% 设备基础已全部完成 100%，高压电缆敷设 253</p>			


		米 已完成：100% 打桩完成 150 根，总量：1319，累计完成 794 根 完成 60%组件安装 0 块 总量 7202 块 累计完成 10.5 % 逆变器安装 0 台共计 7 台。		
	施工质量情况	/		
	安全生产情况	施工现场安全可控。		
	材料、设备进出场情况	/		
	监理发出指令情况	/		
	监理工作情况	1、巡视现场施工人员安全防护用品佩戴情况、2、霍北区组件小黄线安装、3、西店子区支架组件安装 一二次设备送出线路电缆断接、4、康庄设备基础抹灰 逆变器安装 支架加固 电缆沟开挖 设备电缆头压接		
	设计变更、核定单情况	/		
	现场需解决的问题	/		
	其他	无		
填 报 人	尤佳新		审 核 人	

## 监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 24 日	星期四	天气情况	多云	温度 16~26℃
----	------------------	-----	------	----	--------------

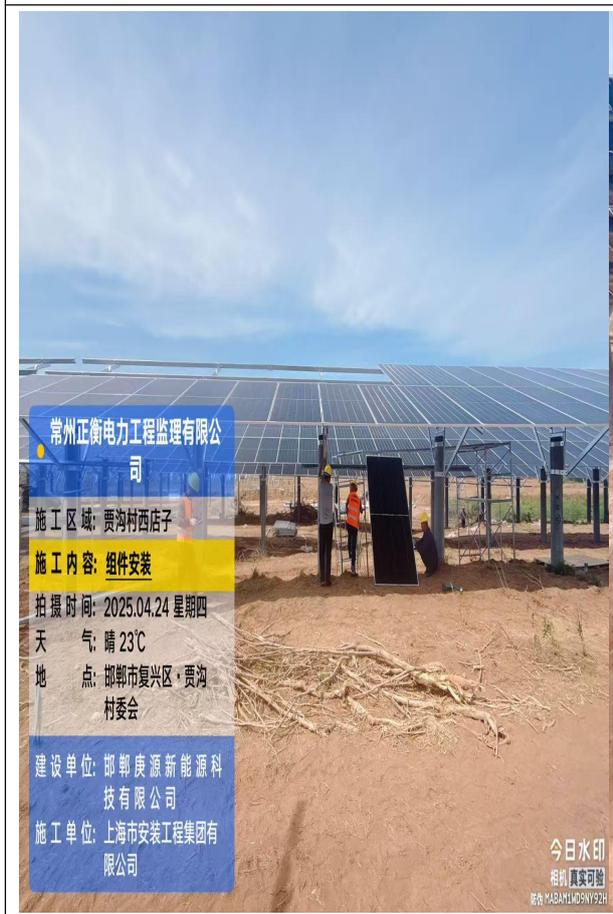

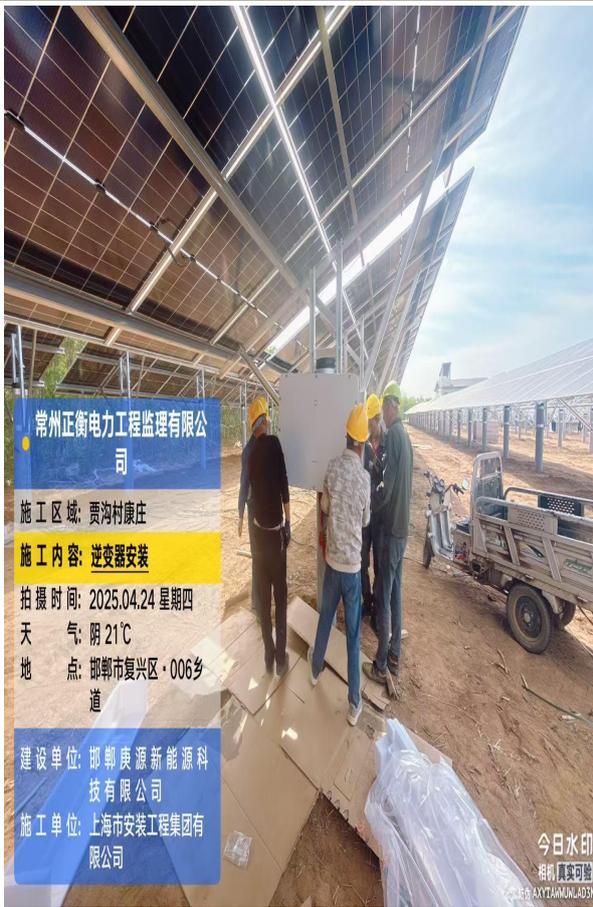

常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村康庄

施工内容: **逆变器安装**

拍摄时间: 2025.04.24 星期四

天气: 阴 21℃

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印  
相机 真实可信  
ID: 6844294429442944



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村康庄

施工内容: **支架加固**

拍摄时间: 2025.04.24 星期四


天气: 阴 21℃

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印  
相机 真实可信  
ID: 5383KXJG6H9LKY26

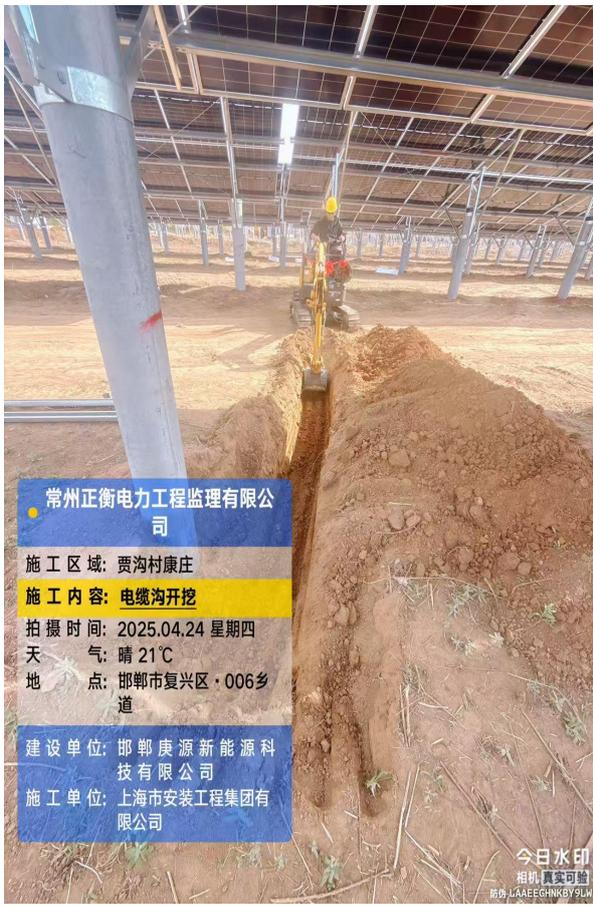

常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村康庄

施工内容: **电缆沟开挖**

拍摄时间: 2025.04.24 星期四

天气: 晴 21℃

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印  
相机 真实可信  
ID: 144EECHNK8Y9LW



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村康庄

施工内容: **设备电缆头压接**

拍摄时间: 2025.04.24 星期四

天气: 晴 21℃

地点: 邯郸市复兴区·复兴区康庄中心小学

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印  
相机 真实可信  
ID: C1MXXPK0E1Z0M1

编写人

审核人

