

# 监 理 日 志

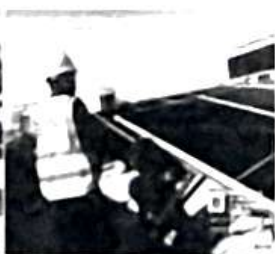
工程名称:工程名称:德必福宠物食品(滁州)有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2025 年 05 月 02 日

天气: 晴

温度: 19-33℃

星期: 五

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>施工现场巡视: 检查施工安全。组件吊装旁站, 并网柜就位旁站,</p> <p>进度情况: 1#2#楼组件吊装, 2 号楼组件安装, 1 号楼组件安装及整改、桥架安装。配电室桥架安装, 并网柜基础下方开槽, 并网个就位, 下楼桥架安装。</p> <p>质量情况:</p> <p>发现问题: 2 楼接地网施工工艺不规范及黄绿漆色带刷漆不规范。1、2 号楼组件安装局部出现波浪状, 不符合要求。采取措施, 通知施工单位整改。并下发通知单一份。</p> <div data-bbox="212 757 528 1010">  </div> <div data-bbox="528 757 804 1010">  </div> <div data-bbox="804 757 1080 1010">  </div> <div data-bbox="1080 757 1422 1010">  </div> |                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p> <p>浙江华伏太阳能科技有限公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>施工内容及进度</p> <p>施工部位: 1) 1#2#楼组件吊装, 2 号楼组件安装, 1 号楼组件安装及整改、桥架安装。配电室桥架安装, 并网柜基础下方开槽, 并网个就位, 下楼桥架安装。</p> <p>施工人员: 14 人、信号工 1 人, 吊车司机 1 人, 叉车司机 1 人, 管理员 1 人。</p> <p>机械设备投入: 吊车 1 台, 叉车 1 台。</p> <p>材料进场情况: 通讯线和电源线进场。</p> |
| <p>本日现场监理人员</p>                        | <p>周飞</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>记录人: 周飞</p>                         | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孟飞</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |
